



*Красноярская региональная общественная организация
«Агентство общественных инициатив»*

Отчет о выполнении экспертизы результатов реализации проектов, получивших финансирование в рамках краевой грантовой программы «Социальное партнерство во имя развития» в 2012 году, оценки эффективности реализации краевой грантовой программы «Социальное партнерство во имя развития» за 2012 год.

Красноярск, 2012



Оглавление

Введение	2
1. Оценка соблюдения графика финансирования проектов	4
2. Оценка соблюдения графика выполнения работ (мероприятий) исполнителями.	6
3. Оценка достижения основных (существенных) результатов реализации проекта; соответствие результатов вложенным средствам, востребованность результатов	8
целевой группой воздействия.....	
4. Оценка обстоятельств, влияющих или способных повлиять на реализацию проекта и ставящих под угрозу выполнение проекта.	13
5. Оценка освещения хода реализации проектов и освещение материалов по тематике программы в СМИ.	15
6. Примеры оцененных проектов.....	18
7. Результат экспертизы результатов реализации общекраевых проектов.....	23
8. Оценка результата программы в целом.....	29
Приложения.....	33

Введение

Целью экспертизы результатов реализации проектов является определение фактических результатов реализованных проектов, их соотношение с заявленными целями и определение тенденций и динамики изменений уровня жизни населения (отдельного местного сообщества) в результате реализации социальных проектов. Кроме этого, экспертиза результатов реализации проектов направлена на оценку уровня информированности населения Красноярского края о программе «Социальное партнерство во имя развития», степени заинтересованности в развитии Программы различными территориями края, определение изменений в качестве взаимодействия граждан, общественных объединений, организаций и органов власти.

Данный отчет подготовлен на основании анализа информации, полученной путем проведения экспертизы результатов реализации проектов на сайте Программы www.kras-grant.ru и посредством анализа результатов реализации проектов на местах. Данные виды работ проводились в период с 18 июля до 15 декабря 2012 года.

Аналізу на сайте Программы подверглись 208 проектов, информация о которых была размещена в личных кабинетах грантополучателей.

Проведение данного вида анализа включает в себя: наблюдение за ходом реализации проектов; проверку своевременности и полноты выполнения работ (мероприятий) согласно организационному плану проекта; проверку своевременности и полноты заполнения грантополучателем в личном кабинете формы отчета о проведенном мероприятии, включая фотоотчет; проверку соотношения заявленных и полученных результатов проекта.

Аналізу результатов реализации проектов на местах подверглись 106 проектов, данные анкетного опроса получены от 115 проектов.

Проведение анализа результатов реализации проектов на местах проводилось на предмет соблюдения грантополучателями обязательств, принятых по реализации проекта.

Проведение данного вида работ включает в себя: ознакомление с документацией проекта, в том числе бухгалтерской; интервью с основными исполнителями (персоналом) проекта; интервью с представителями целевой группы воздействия; присутствие на одном из ключевых мероприятий проекта (в случае если проект находится в стадии реализации); интервью с партнерами проекта; анализ освещения проекта в СМИ.

Проведен анализ краевых СМИ на предмет публикаций о проектах, реализующихся в рамках программы «Социальное партнерство во имя развития».

Анализ результатов реализации проектов на местах осуществлялся методами: анкетирования, работы с фокус-группами, интервьюирования участников, наблюдения, работы с документами, непосредственного участия

в мероприятиях проектов, собеседования, анализа информации, находящейся на сайте программы.

Проанализированы анкеты по 115 проектам по следующим категориям интервьюируемых лиц:

- целевая аудитория проекта и прямые заинтересованные лица;
- партнеры проекта;
- исполнители проекта.

Список проектов, участвовавших в мониторинге, представлен в приложении А данного отчета.

Также при подготовке аналитического отчета использовались отчеты экспертов, выезжавших на мониторинг, в которых содержится анализ информации, полученной при личных встречах с командой исполнителей, представителями целевой группы и заинтересованных сторон, а также органов местного самоуправления территорий.

В отчете используются понятия:

- Программа - краевая грантовая программа "Социальное партнёрство во имя развития";
- заявители – организации, подающие заявку на грант;
- проектная команда (проектная группа) – группа людей, непосредственно осуществляющих реализацию проекта во главе с руководителем (синоним – исполнители);
- организация-заявитель – организация, подающая заявку на грантовый конкурс, является получателем средств;
- организация-исполнитель – организация, непосредственно реализующая деятельность по проекту.

В ходе анализа результатов реализации проектов на местах по программе «Социальное партнерство во имя развития» всего было рассмотрено 106 проектов, на сумму 12609 тыс. руб., средняя сумма гранта составила 122,4 тыс. рублей.

1. Оценка соблюдения графика финансирования проектов.

В ходе анализа результатов реализации проектов на местах экспертами было установлено 10 фактов задержки финансирования проектов. Фактически таких проектов больше, однако, если задержка финансирования не приводила к критическим изменениям организационного плана проекта, то она не обозначалась исполнителем и могла быть не зафиксирована экспертом.

Однако следует отметить, что суммы фактического финансирования проектов отличались от сумм, содержащихся в заявках.

Так по данным мониторинга запрашиваемая сумма всех победивших заявок составила 27758 тыс. руб., а одобренная сумма составила 22500 тыс. руб. По 16 проектам данных нет. Среднее отклонение по финансированию 25647 рублей. То есть, настолько меньше в среднем получил каждый проект. Максимальная сумма недофинансирования составила 190825 руб. (проект «Создание социального предприятия по оказанию адресной помощи одиноким пожилым людям – «Агентство добрых дел»). Всего 103 проекта (50% одобренных заявок) получили сумму меньше, чем запрашивали.

При проведении анкетного опроса по оценкам исполнителей в ходе реализации проекта, 36% респондентов отметили, что по сравнению с заявкой и в процессе реализации менялись статьи бюджета. Ответы показаны на рисунке 1.

Как правило, значительная часть изменений статей бюджета связана с изменением заявки и организационного плана на момент заключения договора. Это в свою очередь повлекло и изменение содержания проекта.

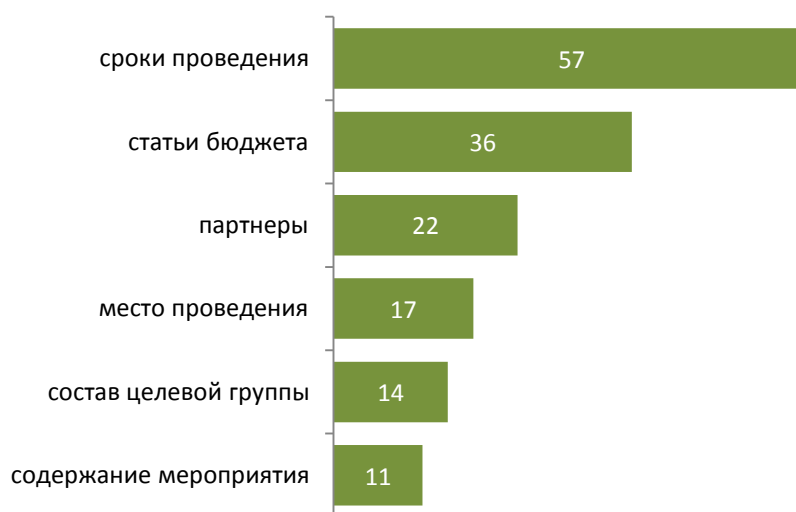


Рисунок 1 - Что пришлось изменить в ходе реализации проекта(%)

По данным анкетного опроса большинство исполнителей (70%) смогли бы начать работы по проекту до поступления средств, рисунок 2.

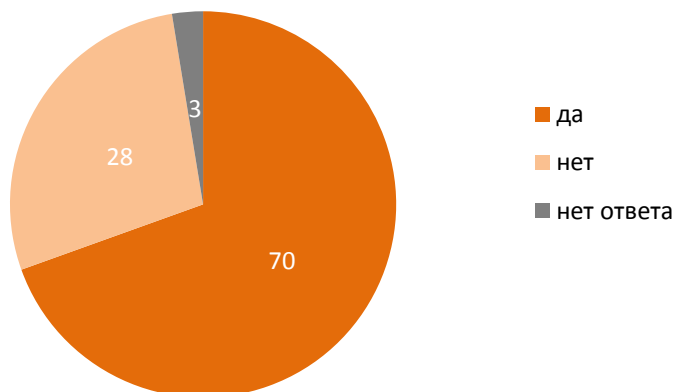


Рисунок 2 - Можно ли было начинать работу до поступления средств (%).

В 2011 году таких проектов было лишь 31%, а 69% - не могли начать работу без грантовых средств.

Ниже приведены примеры проектов с комментариями экспертов.

Анализ показывает, что в большинстве случаев задержка финансирования связана с несвоевременностью заключения договора с грантополучателем. В связи с рекомендациями экспертов и сокращением бюджета проекта, грантополучатели вынуждены вносить изменения в план реализации проекта, что может затягиваться на длительное время и приводит, как в отсрочке подписания договора, так и к задержке финансирования.

В случае, когда руководитель проекта и организация-заявитель-разные люди, происходит нарушение коммуникации и команда проекта поздно получает информацию о победе в конкурсе и необходимости подписания договора или других организационных моментах, влияющих на своевременность финансирования проекта.

2. Оценка соблюдения графика выполнения работ (мероприятий) исполнителями.

Одной из оценок соблюдения графика является своевременность предоставления отчета о мероприятиях проекта на сайте Программы. По данным анализа информации, предоставленной грантополучателями на сайте Программы, выявлено, что 53 проекта из 106 посещенных экспертами по качеству предоставленных на сайте Программы отчетов, имеют балл 3 и ниже. Это свидетельствует не только о несвоевременности предоставления отчетов на сайт, но и о реальных изменениях в организационных планах проектов (таб. приложение А).

По данным анкетного опроса и анализа проектов на местах (как видно на рисунке 1) в 57% ответов наблюдались изменения графика реализации мероприятий исполнителями.

В отчетах экспертов фиксируются факты изменений, основными причинами, повлиявшими на изменения графика реализации проекта, названы следующие:

- несвоевременность финансирования;
- погодно-климатические условия;
- совпадение дат массовых мероприятий на территории и мероприятий проекта;
- изменение рабочего графика руководителя, либо ключевого члена команды проекта;
- низкая явка целевой аудитории.

Экспертами отмечен перенос, либо переформатирование мероприятий в летние месяцы, так как возникает сложность работы с целевой аудиторией именно в это время. У многих категорий населения возникает дополнительная занятость, которую вынуждены учитывать исполнители проектов при планировании на будущее. Сейчас такой факт свидетельствует о низком качестве планирования мероприятий проекта.

Заявители очень плохо идентифицируют и прогнозируют риски своих проектов на стадии планирования и подачи заявки, тем более не продумывают свою реакцию на эти риски и часто не готовы к возникающим неучтенным трудностям.

Содержание мероприятий пришлось изменить практически в каждом десятом проекте (11% ответов). Отчеты экспертов по данному вопросу этот факт подтверждают.

Однако в остальной части проектов, по мнению экспертов, заметно выросла исполнительская дисциплина. Заявители намного тщательнее стали подходить к планированию содержания своих проектов.

Так же следует отметить, что немалое количество проектов, которые несвоевременно получили финансирование, выполняли запланированные



*Красноярская региональная общественная организация
«Агентство общественных инициатив»*

мероприятия в соответствии в графиком реализации, при этом использовался собственный (внутренний) ресурс.

Всеми экспертами отмечено, что перенос отдельных мероприятий проекта в большинстве случаев скорее негативно сказывается на его результате.

3. Оценка достижения основных (существенных) результатов реализации проекта; соответствие результатов вложенным средствам, востребованность результатов целевой группой воздействия.

В ходе анализа результатов реализации проектов на местах каждый эксперт, оценивая результат (потенциальный либо текущий, если проект был еще не завершен) давал оценку каждому проекту по десятибалльной шкале. Оценено экспертами 103 проекта. Средний балл оценок экспертов (достижение проектами заявленной цели) по десятибалльной шкале по все проектам составил 7,48. Средний итоговый рейтинг по данной выборке проектов на сайте составил 5,71. Связано это в первую очередь с тем, что команды несвоевременно отчитываются по мероприятиям проекта на сайте Программы, а иногда не выставляют отчетов вовсе. Однако в большинстве случаев результат самых лучших проектов на сайте и по оценкам экспертов совпадает. Кроме того, оценка экспертами выставлялась на момент проведения мониторинга, когда часть мероприятий по проекту еще не были завершены.

Необходимо отметить основные расхождения.

Немало проектов, которые имеют низкий или нулевой рейтинг на сайте, получают очень высокий балл от эксперта с рекомендациями к тиражированию.

Таких примеров (с баллом эксперта от 7 и выше, итоговый рейтинг от 0 до 3) насчитывается 10. Результаты в таблице 1

Таблица 1 - Проекты с максимальным расхождением рейтинга и оценок экспертов

	Номер проекта	Название проекта	Территория	Оценка эксперта от 7 - 10	Итоговая оценка по рейтингу от 0-3
1	ПА-12-055	Сибирские корабли	Канский р-н	7	3
2	1211-009	Общество и мы ЕДИНЫ!	Абанский р-н	7	1
3	СВ-12-028	Ликбез XXI века	Манский р-н	7	3
4	1261-028	Экологическая экспедиция	Канский р-н	8	3
5	1211-105	Мелодия здоровья	Железногорск	8	0
6	РЯ-12-031	Сохранная грамота	Минусинский р-н	9	1
7	1251-021	Наш дом Кедровый	п. Кедровый	10	2
8	1234-004	GREENEXTRIM – Зеленогорская планета экстрима	Зеленогорск	8	0
9	БГ-12-	Почитай - ка	Краснотуранский	8	0

	070				
10	1261-107	Точно в Цель	Ермаковский р-н	5	10
11	1241-102	Ирбис	Шушенский р-н	9	0

При этом отмечено, что проекты «Мелодия здоровья», «Наш дом – Кедровый», «GREENEXTRIM – Зеленогорская планета экстрима» рекомендованы к тиражированию.

Количество проектов по оценкам от 7 баллов как в рейтинге на сайте, так и по данным экспертов насчитывается 32, результаты представлены в приложении Б.

Все проекты из данного списка высокоэффективны и показали высокую результативность, часть из них уже входят в число героев.

Всего по баллам экспертов от 6 и выше насчитывается 78 проектов (74% выборки). Большинство экспертов отмечают, что результат проекта соответствует затратам. Краткие комментарии экспертов представлены в общей таблице (приложение А).

По данным анкетного опроса исполнителей проектов в 28% проектов были незапланированные положительные результаты. Рисунок 3.




Рисунок 3 - Были ли незапланированные положительные результаты?(%)

По отношению в 2011 году прослеживается положительная динамика, так как незапланированные результаты присутствовали только в 17% проектов.

У исполнителей заниженные ожидания, особенно осторожно результаты прописываются в заявках, так как исполнители опасаются собственных амбиций, стараются не завышать требования к проекту, будучи недостаточно уверенными в своих силах и в объеме утвержденного грантовым советом финансирования.

В качестве значимого для себя результата организации исполнители проектов в равной степени выделяют улучшение материальной базы,

привлечение власти к проблемам представляемого сообщества и поиск партнеров, рисунок 4.



Рисунок 4 – Польза от реализации проекта(%)

В прошлом году ответ «улучшение материальной базы» отмечался в 72% проектов.

На рисунке 4 представлены ответы представителей целевой аудитории, в которых отмечен значимый для них результат.



Рисунок 5 - Результат для целевой аудитории(%)

По данным анкет целевой аудитории мероприятия всех проектов были интересны.




Рисунок 6 – Был ли проект интересным(%)

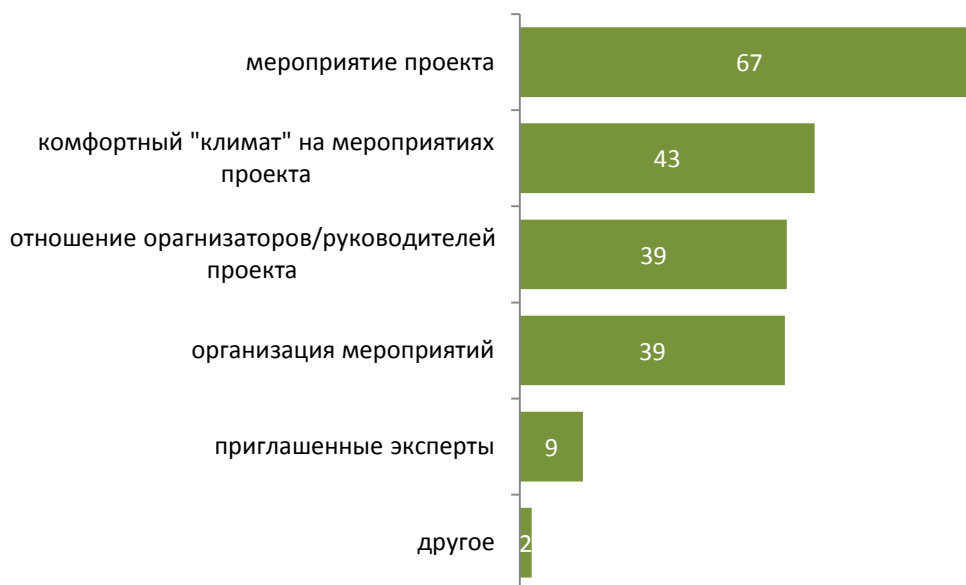


Рисунок 7 - Что вам особенно понравилось(%)

В то же время, на начальном этапе большинство команд недооценивает потребность целевой аудитории в проекте. Таким образом, на этапе реализации, им приходится затрачивать значительные организационные усилия, для привлечения целевой аудитории.

Во многих отчетах экспертов отмечается, что некоторые мероприятия в летний период являются формальными и малозначимыми. Трудно привлечь целевую аудиторию.

Также необходимо отметить, что ожидания целевой аудитории, как правило, оправдываются, закрепляется положительный имидж у организации-исполнителя проекта на территории.

По данным координаторов грантовой программы в районах Красноярского края наибольшую пользу от проектов, реализованных в территориях, получили дети (83%) и молодежь (78%). Самый низкий процент благополучателей приходится на категорию группы риска (22%). Это может быть связано, как со спецификой деятельности организаций-исполнителей проектов (школы, центры детского творчества, молодежные центры), так и с возможностями для развития проектных идей, которые дает участие в той или иной номинации. Проекты в номинациях «Защищенное детство», «Красноярская идентичность», «Спортивная семья - спортивный край», «Я люблю русский язык» в большей степени выполняются на школьных или молодежных площадках и для реализации в них привлекаются в большей степени молодые люди.



Рисунок 8 - Какая категория населения получила наибольшую выгоду от реализации проекта?(%)

4. Оценка обстоятельств, влияющих или способных повлиять на реализацию проекта и ставящих под угрозу выполнение проекта.

По итогам выездной экспертизы экспертами были названы факторы, негативно влияющие на реализацию как отдельно взятого проекта, так и всей программы. В общем виде они представляют собой следующие:

1. недостаточная проработка проекта на этапе планирования. Не учитываются риски (отсутствие партнеров, погодные условия, запоздание финансирования и др.), не достаточно изучается интерес к теме проекта со стороны целевой группы, при планировании бюджета не учитывается доступность в регионе нужного ресурса, определенной продукции;
2. несвоевременное получение средств на выполнение проекта, затянутость при оформлении договоров;
3. отсутствие команды, все решения принимает руководитель без согласования с коллегами;
4. несогласованность действий в команде проекта;
5. недостаточный опыт руководителя и команды проекта в реализации социально-значимых проектов;
6. смена, болезнь руководителя проекта;
7. перенос сроков выполнения отдельных мероприятий;
8. отсутствие партнеров или не согласованные заранее с партнёрами условия проведения мероприятий проекта;
9. трудности в работе с сайтом программы: не имеют возможности работать с сайтом, несвоевременно узнают о победе в конкурсе, не могут своевременно размещать отчеты, не знают требований к отчетам;
10. планирование значимых мероприятий на летние месяцы. мероприятия, запланированные на летний период, часто переносятся или выполняются не в полном объеме. Еще встречаются случаи, когда на это время планируются события, непосредственно не влияющие на результативность проекта (рабочие встречи, ремонт помещений, покупка оборудования), чтобы соблюсти сроки реализации не менее 6-ти месяцев, без которых проект вполне мог быть качественно реализован;
11. много вопросов у грантополучателей из сельской местности по оформлению документов о работе и безвозмездном оказании услуг волонтеров; об использовании и отражении в денежном выражении собственного ресурса;
12. слабое участие координатора в судьбе проектов на его территории. Отстранённость координатора из администрации района или города от своевременности заключения договора грантодателя с грантополучателем, особенно в случаях, когда средства перечисляются на счет подразделения (отдел, управление) администрации.

Стоит отметить, что очень многие проекты – это проекты одного человека. Процессы командообразования во многих проектах очень слабые. Команды не формируются. Судьба проекта зачастую зависит от мотивов действий и состояния здоровья руководителя. Другие члены команды могут даже не владеть основной проектной идеей, будучи исключительно исполнителями. Этот факт подтверждается результатами анкетного опроса, более 90% анкет исполнителей были заполнены именно руководителями проектных команд, рисунок 7.



Рисунок 9- Ваша роль в проекте(%)

5. Оценка освещения хода реализации проектов и освещение материалов по тематике программы в СМИ.

В рамках экспертизы результатов реализации проектов на местах, изучалось распространение информации о проектах, реализованных на средства грантовой программы «Социальное партнёрство во имя развития» в местных СМИ.

По данным опроса координаторов грантовой программы в районах края у большинства проектов (94%) не было проблем с привлечением СМИ.




Рисунок 10 - Есть ли у проектных команд на вашей территории проблемы с привлечением СМИ?(%)

Результаты мониторинга печатных и электронных СМИ представлены в Приложении В.

Ниже представлены данные анкетного опроса исполнителей о работе со СМИ. Результаты анкетного опроса полностью подтверждаются экспертами.

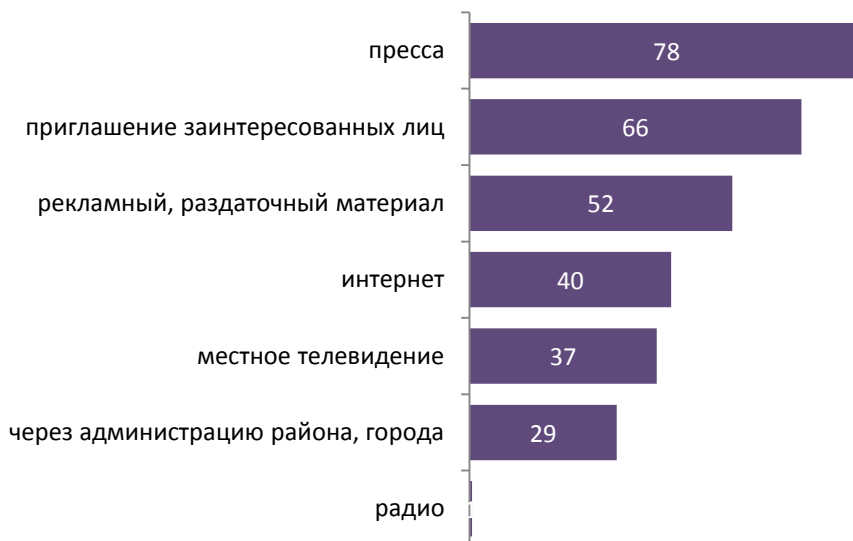


Рисунок 11 - Способ распространения информации о проекте

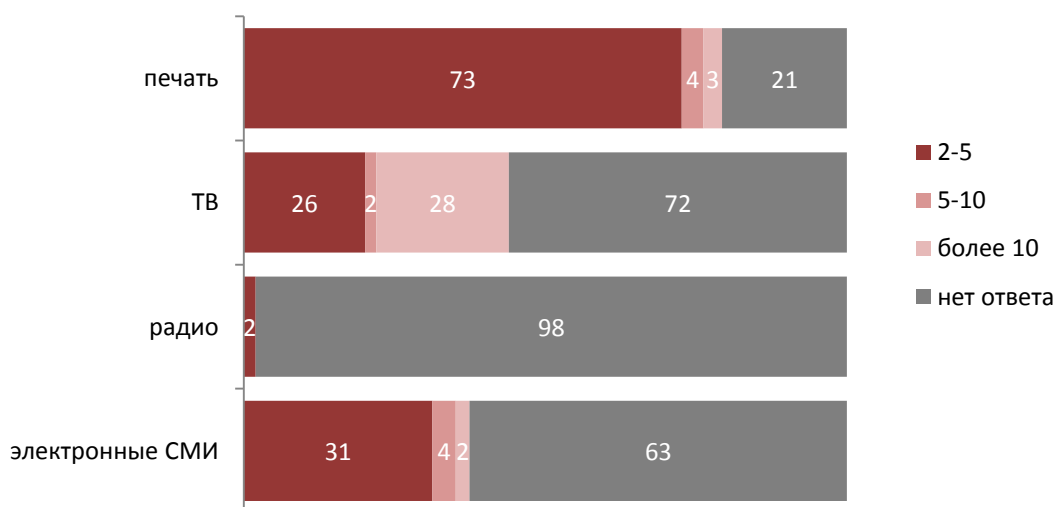


Рисунок 12 – Количество размещений в СМИ

Наибольшее количество размещений приходится на печатные издания. Именно печатные издания остаются основным средством массовой информации в районах края.

Количество публикаций по большинству проектов от 2 до 5.

Несмотря на то, что подавляющее большинство выявленных публикаций представляют собой публикации в электронных СМИ, в том числе на сайтах Администраций муниципалитетов, чаще всего такие публикации в интернете носили характер анонсов предстоящих мероприятий, не всегда из них можно понять, что речь идет о конкретном проекте, а тем

более о программе «Социальное партнерство во имя развития». Особенно это касается публикаций в социальных сетях.

Из комментариев экспертов:

1. Чаще всего журналисты не связывают информационные поводы, которые освещают, с конкретными проектами, а тем более грантовой программой. Исключения составляют случаи, когда проектная команда сама пишет пресс-релиз и приглашает СМИ, а также, когда исполнителями проекта являются журналисты.

Так, в п. Кедровый, журналисты ежемесячно знакомятся с планом общественных мероприятий в администрации поселка. План наполняется большинством мероприятий из проектов «Социального партнерства», однако часто они путают, к какому именно проекту относится мероприятие и кто является грантодателем (в поселке реализуются также проекты, поддержанные Фондом защиты детей, собственным ФМС и др.)

2. Практически все проектные команды активно используют собственные сайты и сайты администраций районов, поселков, с которых можно делать перепост информации.
3. В небольших городах и поселках СМИ с большим интересом посещают мероприятия в рамках проектов, поскольку количество информационных поводов меньше, чем в больших городах, а также местные администрации ориентируют их на посещение больших мероприятий по проектам, особенно тех, где бывают сами.
4. Количество информационных материалов, размещенных в партнерских СМИ, значительно увеличивается, если проект реализует команда журналистов. Примером является проект «Благотворительный марафон «Солнечный круг» (МБУ "Студия регионального телевидения", Большой Улуй). Кроме того, что информация о проекте размещена на различных информационных порталах края, команда подготовила ролик о проекте на конкурс медиа форума «Енисей.РФ».
5. Значительно больше информации о проектах стало появляться в сети интернет, информационные агентства наиболее мобильны и используют различную информацию, которую могут уточнить у организаторов, не всегда выезжая на место проведения мероприятия.
6. 52% опрошенных СМИ понимают, что освещаемые мероприятия проходят в рамках краевой грантовой программы «Социальное партнерство во имя развития».
7. 95% проектов освещают реализацию проектов на сайтах своих учреждений и организаций.

6.Примеры оцененных проектов

В общей таблице приложения А и таблице приложения Б даны комментарии экспертов относительно большинства проектов, подвергшихся выездной экспертизе. В столбце «Комментарии эксперта» также отмечается качество проекта и приводится рекомендация к тиражированию. В большинстве случаев экспертами не выявлено возникновение новых технологий. Проектов рекомендованных к тиражированию также немного – 19 проектов, результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Проекты, рекомендованные к тиражированию

№п/п	Номер проекта	Название проекта	Территория	Оценка эксперта от 1 - 10	Итоговая оценка по рейтингу от 1 - 10
1.	1231-163	Тропинка к здоровью	п. Кедровый	10	7
2.	1211-105	Мелодии здоровья	Железногорск	8	4
3.	1261-094	Вахта памяти	Зеленогорск	8	8
4.	1241-092	Новая высота	Зеленогорск	8	7
5.	1251-021	Наш дом Кедровый	п. Кедровый	10	2
6.	1234-004	GREENEXTRIM – зеленогорская планета экстрима	Зеленогорск	8	0
7.	ПА-12-072	Мы память бережно храним	Богучанский район	8	5
8.	1261-107	Точно в Цель	Ермаковский р-н	5	10
9.	1241-102	Ирбис	Шушенский район		
10.	1211-028	Плечом к плечу	Минусинск	9	7
11.	БГ-12-019	Слово предоставляется детям	Козульский	8	7

12.	1212-012	Кто, если не я!	Красноярск	10	9
13.	1261-097	Моя родная Нарва	Манский р-н	8	7
14.	ДС-12-032	Дети индиго	Иланский	9	7
15.	1261-086	История, рассказанная блюдцем	Иланский р-н	8	4
16.	1261-076	Культпоход - Сибирское открытие Владимира Зазубрина	Канск	10	8
17.	1231-080	Площадка совместного семейного творчества "Горница-искусница, горница - кудесница"	Пировский р-н	10	9
18.	1211-100	Рука помощи	п. Кедровый	10	6

Ниже представлены проекты, добившиеся, по мнению экспертов, наиболее высоких результатов и неуспешные проекты.

Наиболее успешные проекты.

«Мы память бережно храним» Особо хочется отметить проект с точки зрения значимости и резонанса для своей территории. Руководитель проекта Лия Алексеевна Васильева действительно пользуется заслуженным авторитетом в своем поселке. Работает в тесном контакте с Главой Невонской администрации Лидией Егоровной Зуйкиной. Несмотря на преклонный возраст, ей удалось сплотить вокруг себя волонтеров – старшеклассников (Куприянову Полину, Москаленко Юлию и многих других), которые искренне и с полной самоотдачей работали с ветеранами. Сняли замечательный фильм. В перспективе Л.А. Васильева нацелена работать с т.н. «трудной» молодежью, окончившей школу.

«Точно в цель» (Ермаковский район). Учреждение – исполнитель: Нижнесуэтульская средняя школа. Руководитель проекта Логинов Андрей Васильевич.

В Ермаковском районе накоплен положительный опыт участия в конкурсах социально значимых проектов. Это во многом является заслугой

куратора из администрации района Жанны Александровны Верфель и специалистов отдела. Жанна Александровна не только информирует потенциальных заявителей об условиях конкурса, но и помогает оформить идею в проект, знает о положении дел в каждой команде. Заинтересованно относится к проектной деятельности бюджетных учреждений и общественных организаций района заместитель главы администрации Ермаковского района по социальным и общественно-политическим вопросам Юрий Кузьмич Губарев. Такие лагеря могут действовать в любой школе. Нужна только высокопрофессиональная команда проекта.

«Ирбис» (Шушенский район). Исполнитель проекта – «Региональное экологическое общественное движение “Равновесие”». Руководитель проекта Таран Ольга Гурьевна. Организация эффективно использует свой потенциал не только в проектной деятельности, но и в повседневной работе. Благодаря этому она имеет большой авторитет в районе и за его пределами. Руководитель проекта и организации привлекаются к мероприятиям, связанным с экспертной оценкой предполагаемых к принятию решений органами местного самоуправления социальных программ и решений, входят в состав различных комиссий. Проект может быть тиражирован на других территориях. Нужна только соответствующая команда заинтересованных исполнителей. Проект может быть тиражирован для советов ветеранов на других территориях.

«Плечом к плечу» (г. Минусинск). Организация - исполнитель «Минусинская местная общественная организация “Детско-юношеский туристический клуб “Пилигрим”». Руководитель проекта Дементьев Олег Игоревич. Подобного рода проекты очень востребованы в среде подростков и юношей. При грамотной организации мероприятий они эффективны для города и позволяют проявить и поддержать новые социально значимые инициативы молодёжи.

«Слово предоставляется детям» (Козульский район). Результаты проекта соответствуют заявленным в проектной заявке. Высокая эффективность. Значительный вклад из бюджета поселка. Получен незапланированный результат, а именно, участие целевой группы проекта в мероприятиях межмуниципального уровня (детские творческие работы, изготовленные в рамках проекта, были представлены на межрайонном фестивале детского декоративно-прикладного творчества «Чудотворец». Следует отметить наличие поддержки проекта со стороны органов власти, так в МЦП «Одаренные дети Козульского района на 2012-2015 годы» запланированы средства на ежегодную поддержку данного проекта.

«Кто, если не я» (Красноярск). Результаты, полученные на этапе реализации проекта, соответствуют заявленным в проектной заявке. Очень сильный проект. Родительский отцовский клуб, строительство летней дачи для семей с детьми-аутистами. Также получен незапланированный результат

- строительство двухэтажного домика-бани. С целью дальнейшей реализации проекта, после освоения полученного гранта, проектная команда заявила проект на конкурс Президентских грантов и в ноябре текущего года получила 700 тысяч рублей на реализацию социально значимого проекта «Социальная усадьба «Добрая».

«Моя родная Нарва» (Манский район) Может быть «Героем».

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Журавушка". Хороша идея включения отдыхающих в облагораживание территории, интересна идея карты достопримечательностей, фильм, природоохранные знаки.

«Дети Индиго» (г. Иланский) проект можно представить как технологию обучения волонтеров для работы с детьми, находящихся на реабилитации в больнице.

«История, рассказанная блюдцем» (Иланский р-он). Надо сказать, что выполнение проекта было связано с внедрением новых технологий в работу молодежного центра, а именно сублимационной методики нанесения фотографий на различные предметы (тарелки, кружки). Очень долго пришлось настраивать оборудование, докупать недостающие детали и даже ремонтировать на базе локомотивного депо ст. Иланская. Но девушки (именно девушки занимались этой работой - вышли достойно из ситуации и не сорвали ни одно проектное мероприятие.)

Кроме того, они приняли участие в Форуме молодежи Манского района, привезли свой проект, поделились опытом с представителями Дзержинского, Ингашенского, Енисейского молодежными центрами. Проект хороший, но отчеты на сайте вовремя не выставляли.

«Культпоход – сибирское открытие владимира Зазубрина» (Канск) Проект очень хорош, качественно хорошо отработан, большой охват территорий и целевой группы. Может претендовать на технологию, культпоход- открытие, знакомство с творчеством.

«Площадка совместного семейного творчества , горница искусница горница кудесница» (Пировский район). Проект очень добротен выполнен, хороший эффект для целевой аудитории, с переходом в технологию как способа работы с патронатными семьями, площадки для обучения творческим началам в молодых семьях.

«Рука помощи», (п. Кедровый). В рамках проекта создан информационно - консультационный центр для пожилых людей на базе библиотеки. Были организованы встречи с юристами, специалистами пенсионного фонда, социальной защиты и другими специалистами. Также были выявлены информационные потребности пенсионеров и на основе этих потребностей авторы проекта разработали программу обучения. Обучение проводили учащиеся старших классов общеобразовательных школ г Дивногорска. Пожилые люди получали услуги по поиску необходимой информации в сети интернет.



**Красноярская региональная общественная организация
«Агентство общественных инициатив»**

Можно говорить, что организованная в рамках проекта работа может быть одним из направлений деятельности любой библиотеки. Работа информационно - консультационного центра легко тиражируема на любую территорию Красноярского края.

«Вахта памяти», (г Зеленогорск). Организация – заявитель: МБДОД «Витязь», руководитель Фоменко Юрий Иванович. Проект нацелен на воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, любви к родине, воспитание позитивного отношения к воинской службе. В рамках проекта проходило обучение старшеклассников общеобразовательных школ строевой подготовке для несения караула у памятника погибшим во время Великой отечественной войны.

7. Результат экспертизы результатов реализации общекраевых проектов

Особую группу проектов составляют общекраевые, имеющие особые характеристики. По положениям грантовой программы статус общекраевого проект может получить при одном обязательном условии – охвате проектными действиями не менее 50% муниципальных образований края. Естественно, что выполнение этого условия должно быть первичным фактором анализа, касающегося кластера общекраевых проектов. Другой очевидной всем отличительной характеристикой общекраевых является возможный объем финансирования, значительно более высокий, чем для территориальных проектов. В 2012 году максимально возможная цифра финансирования общекраевых в 4,5 раза превышала верхний предельный размер территориального долгосрочного гранта - 900 тыс. рублей против 200 тыс. рублей.

В грантовой программе в 2012 году победителями и, следовательно, получателями грантового финансирования были объявлены 6 проектов, претендовавших на статус общекраевых и получивших его после прохождения входного экспертного отбора. Совокупный бюджет всех поддержанных общекраевых проектов 2012 года составил ровно 3 млн. рублей, соответственно, средняя сумма грантового финансирования на один проект равнялась 500 тыс. руб. при этом наименьшая сумма, выделенная общекраевому проекту-победителю, составила 199 950 рублей, а наибольшая – 781 тыс. рублей. В большинстве общекраевых проектов еще на стадии входного конкурсного отбора эксперты указывали на необходимость корректировки бюджета. Из всего числа общекраевых проектов 2012 года запрошенная в грантовой заявке денежная сумма полностью была выделена только двум проектам.

Из шести поддержанных общекраевых проектов у пяти заявителями являлись некоммерческие, общественные организации. Только в одном случае заявителем была бюджетная организация – учреждение сферы культуры – КГБУК Красноярский краевой краеведческий музей. Все эти организации базируются в краевом центре г. Красноярске.

Обязательной составляющей содержательно-результативной оценки реализации общекраевого проекта должна быть проверка фактического, а не только заявочного соответствия формального критерия-признака общекраевого проекта – географической масштабности проводимых мероприятий и эффектов воздействия с охватом не менее 50% муниципальных территорий.

Однако, как это уже отмечалось, и при проведении мониторинга реализации проектов в предыдущих грантовых циклах программы «Социальное партнерство во имя развития», и в 2012 году среди общекраевых тоже были проекты, у которых необходимое количество территорий отсутствовало даже номинально в проектной заявке, тем не менее

эти проекты в рамках грантовой программы получили финансовую поддержку и статус общекраевых.

На основе анализа статистических и качественных, эмпирических данных, касавшихся реализации общекраевых проектов 2012 года, были сделаны нижеследующие выводы.

Оценка соблюдения графика финансирования проектов.

Во всех прошедших мониторинг общекраевых проектах проблем с получением грантовых средств не было, как видно из отчетов экспертов, оценивавших реализацию проектов, а также из данных, содержащихся в анкетах исполнителей. Такое положение дел может свидетельствовать о хорошем административном опыте и ответственности руководителей общекраевых проектов в вопросах формальной работы с документами, в частности финансовыми. Это во многом объясняется тем, что и заявителем, и исполнителем, в каждом общекраевом проекте была какая-то одна организация, имеющая достаточный опыт работы, с различными формальными бумагами, документами. Эти организации используют, для ведения проектной бухгалтерии ресурс штатного бухгалтера организации, который имеет все необходимые бухгалтерские компетентности и подчиняется непосредственно руководителю организации, а за работу в проекте получает отдельное материальное вознаграждение. Такая организационно - административная ситуация существенно отличается от ситуации в территориальных проектах. Там, для ведения бухгалтерии по проектам, используются услуги бухгалтеров некоторых, так называемых, «зонтичных» НКО. Такие НКО в ряде территорий выступают в качестве грантозаявителей, в случае, когда проект реализует инициативная группа граждан или неформализованная организация, не имеющая расчетного счета в банке.

В случае достаточной административно-финансовой компетентности, обычно имеющейся у некоммерческой организации, работающей не первый год в практическом поле, как правило, не возникает проблем с заключением проектно-грантового договора и с последующим поступлением и расходованием грантовых денег.

Оценка соблюдения графика выполнения работ (мероприятий).

Практически во всех общекраевых проектах, подвергшихся экспертизе результатов реализации, можно отметить факты отклонения от плана и графика выполнения работ и проведения мероприятий. В разных проектах в большей или меньшей степени. Очевидно, что в масштабных по географии проектах, при наличии в них разнообразных кооперационных и партнерских связей, при организации каких-либо действий и проведении мероприятий на местах заметно возрастает вероятность смещения сроков и изменения форматов мероприятий по сравнению с первоначальным планом – именно это и наблюдается во многих общекраевых проектах. В интервью руководители проектов, в частности, при ответе на вопрос «Что пришлось

изменить в ходе реализации проекта?» указывали, в случае одного проекта, «место проведения», а «причиной изменений» обозначалось «неготовность принять в территории из-за отсутствия или недостаточности места проведения», а в случае другого проекта, отмечено, что «пришлось изменить» «сроки проведения». Причиной здесь указано то, что «по согласованию с территориями были выбраны даты, совпадающие с их местными мероприятиями, а также сложности сбора людей в летний период». Такие факты могут служить определенным подтверждением особой, специфической ситуации с планированием и реализацией общекраевых проектов и, вообще говоря, не должны в большинстве случаев рассматриваться как их минус или недостаток. С точки зрения перспектив развития гражданских инициатив, расширения масштабов социально-проектных дел в разных территориях края, можно принять как особую характеристическую черту общекраевых проектов некоторую долю в них реализационных отклонений от первоначальных заявочных планов. При этом, как свидетельствует уже имеющаяся практика, на общей целевой результативности общекраевых проектов такие отклонения реально в худшую сторону не сказываются, что подтверждается отчетами экспертов, проводивших мониторинг таких проектов. Учитывая масштабность общекраевых проектов, можно предложить принять для них, как разрешенное условие, возможность изменения в ходе проекта графика, мест проведения и содержания некоторых мероприятий. Особенно это важно, если учитывать, что само партнерское взаимодействие с территориями может приводить уже в ходе проекта к какой-то оптимизации, улучшению того, что первоначально планировалось, или к какому-то видоизменению по локальным причинам.

Оценка достижения основных (существенных) результатов реализации проекта; соответствие результатов вложенным средствам, востребованность результатов целевой группой воздействия.

Все поддержанные грантовой программой и реализовавшиеся в 2012 году общекраевые проекты по оценке экспертов, а также, по мнению самих исполнителей проектов, отраженному в их анкетах или озвученному в общении с экспертом, достигли основных, изначально планировавшихся результатов.

Одной из значимых аналитических позиций и оценочных категорий эффективности проекта для экспертов-оценщиков является приобретение оборудования, т.е., формирование долгосрочной ресурсной базы, которая может (или будет) использоваться в пост проектный период. В оценке целесообразности и обоснованности приобретения проектной командой того или иного вида оборудования как раз проявляется возможная последующая перспектива деятельности организации-исполнителя (проектной группы) на социально-проектном поле.

Для большинства социальных проектов, где исполнителем выступает какая-то официальная организация, а не просто проектная группа, руководителями проектов указывается, что приобретенное оборудование будет использоваться в «текущей деятельности организации». В случае крупнобюджетных проектов, какими являются обще краевые, приобретение в ходе социального проекта оборудования, которое будет использоваться в «текущей деятельности организации», вряд ли стоит рассматривать как достоинство и значимый социальный результат. Грамотный руководитель НКО, выступающий в роли руководителя социального проекта, не станет указывать, что приобретенное в проекте оборудование будет использоваться «в текущей деятельности» организации, поскольку в данном проектно-грантовом контексте это не улучшает его репутацию.

Среди ответов руководителей общекраевых проектов 2012 года на вопрос о будущем приобретенного на грант оборудования есть ответы – «в текущей деятельности» НКО. Но есть и такие проекты, где в ответах их руководителей указаны только позиции «в продолжение начатой деятельности» и «при реализации нового проекта», как например, проект «Спортивный край – это я и моя семья», разработанный и реализованный КРОО «Федерация мультиспорта и приключенческих гонок Красноярского края».

Целевой группой общекраевых проектов 2012 года были широкие категории населения, например, семьи в разных территориях, и особые социальные группы как, например, дети с ОВЗ или приемные семьи.

Оценивая, по полученным данным, полезность и значимость всех общекраевых проектов 2012 года, для конкретных целевых аудиторий, с учетом их разнообразия и направленности, можно сделать достаточно обоснованный вывод, что у каждого проекта были позитивные эффекты воздействия на определенную целевую группу. Благодаря этому люди, вошедшие в число участников этих проектов, получили определенные выгоды, блага, от участия в них, а также в ряде случаев увидели новые для себя перспективы будущего, связанные с той проектной идеей, которая им была предложена. Исполнители общекраевых проектов 2012 года чаще других в позиции полезности для целевой аудитории отмечали «новые навыки», «методическую поддержку», «информационную поддержку».

Неэффективных общекраевых проектов, фактически не принесших никому никакой реальной пользы, оценивавшими экспертами выявлено не было.

Оценка обстоятельств, влияющих или способных повлиять на реализацию проекта и ставящих под угрозу выполнение проекта.

Факторы и обстоятельства, влияющие или способные негативно повлиять на реализацию любого общекраевого проекта, во многом идентичны с факторами и обстоятельствами любого другого территориального проекта. Эти факторы могут быть отнесены как к

категории внешних, не зависящих прямо от организаторов проекта, так и внутренних, непосредственно касающихся тех, кто организует проект, зависящих от них. К группе внутренних факторов могут быть отнесены и факторы административно-организационной неопытности руководителя проекта, его управленческие просчеты. Также, несрабатанность проектной команды на предпроектном или реализационном этапе, отсутствие способов и механизмов поиска и привлечения социальных партнеров. К категории внешних можно отнести различные форс-мажорные обстоятельства. Например, отказ от участия в проекте партнеров, не прогнозированный командой. Пожалуй, единственным особым отличием общекраевых проектов является значительное количество одновременно возникших сложностей, связанных с географией проекта, и сложностью в оперативных действиях по изменению ситуации.

Оценка освещения хода реализации проектов и освещение материалов по тематике программы в СМИ.

Для обще краевого проекта представляется обязательно необходимым использование всех видов современных информационно-коммуникационных ресурсов и каналов, как для рекламы и пропаганды проекта. Важной составляющей в работе является информирование населения о проекте на всех стадиях реализации, особенно на этапе, когда может быть освещен и предъявлен широким массам позитивный результат и возможные, ожидаемые эффекты после окончания проекта.

В общекраевых проектах 2012 года информационная составляющая представлена разными ресурсными позициями и каналами распространения информации. На сайте грантовой программы размещали информацию проектные группы 5 проектов. Материалов «Социального калейдоскопа» не представлено. В отличие от территориальных в большинстве общекраевых проектов разнообразие видов информационных материалов и география публикаций, репортажей, сюжетов значительно больше. Для общекраевых является достаточно типичным использование телевидения для презентации своего проекта и привлечения внимания разных социальных групп к той актуальной проблематике, которая была положена в основу соответствующего проекта.

Анализ деятельности организаторов-исполнителей общекраевых проектов дал примеры несколько неожиданных, но показательных тенденций. Так в своей анкете руководитель общекраевого проекта «Открытые сердца» указал, что социальных партнеров у организаторов не было, при этом в грантовой заявке проекта один партнер (организация) был указан изначально, и кроме этого имеется анкета партнера, заполненная представителем еще одной организации. Данный факт может однозначно свидетельствовать о слабой погруженности организаторов проекта в контекст Грантовой программы, где одним из ключевых смыслов является инициация социального партнерства и порождение синергетических эффектов

социального развития в будущем за счет инициированного проектом социального партнерства. Фактически получается, что некоторые руководители общекраевых проектов, одновременно являющиеся руководителями каких-то некоммерческих структур, иногда рассматривают грантовые деньги как дополнительное финансирование на основную, уставную деятельность организации, при этом их проекты удачно проходят стадию входного экспертного отбора и получают грантовое финансирование на реализацию. На данные стороны фактического совпадения текущей деятельности некоммерческой организации и деятельности по проекту указано и в отчете эксперта, оценивавшего этот проект.

Если в результате общекраевого проекта грантовой программы не проявляется линия социального партнерства, дающая возможность дальнейшей синергии действий после проекта, то такой проект вряд ли можно признать успешным именно как проект в рамках программы «Социальное партнерство во имя развития». Одним из ключевых аспектов оценивания общекраевых проектов должен быть поиск ответа на вопрос: что после завершения проекта останется в территории? Что останется для нее как благо, польза, социальный опыт, каковы будут позитивные последствия, эффекты влияния на различные стороны жизни, на возможности, способы и перспективы решения актуальных социальных задач в территории? Если это трудно увидеть и понять после реализации общекраевого проекта, то он, скорее, может быть признан лишь реализованным в соответствии с планом, но не социально успешным.

Партнерский аспект в контексте абсолютно всех общекраевых проектов является одной из позиций неформальной идентификации и подтверждения самого «общекраевого» статуса при оценивании проектов.

По «партнерскому» параметру из всех общекраевых проектов 2012 года самым «общекраевым» можно признать проект «Между прошлым и будущим». (Культурно-образовательный маршрут передвижного краеведческого музея, посвященный Году Российской истории.), у которого в партнерах указаны «администрации 25 муниципальных образований».

Сутью подавляющего числа общекраевых социальных проектов, кроме основной тематической деятельности, должна быть инициация выращивания социальных партнеров-последователей в территориях, соответствующе устремленных, идейно и деятельностно ориентированных в ту же социально-целевую, тематическую зону, что и тематическое содержание проекта. В логике обязательного территориального выращивания партнеров на всех территориях реализации общекраевого проекта, пока не работала и не работает ни одна проектная группа, реализующая общекраевой проект.

8. Оценка результата программы в целом.

По результатам опроса координаторов краевой грантовой программы в районах края в большинстве территорий (56%) в 2012 году возросло количество заявок на конкурс «Социальное партнерство во имя развития».




Рисунок 13 - Изменилось ли количество заявок в программу "Социальное партнерство во имя развития"?(%)

Программа и проекты, которые реализуются в районах края, известны местной власти и населению. Так считают 98 % представителей органов местного самоуправления, опрошенных в районах края. Все опрошенные представители органов МСУ готовы поддерживать социальные проекты в своих территориях. Уже сейчас финансовую поддержку в реализации социальных проектов готовы оказать 50 % районных администраций.



Рисунок 14 - Есть ли возможность оказать финансовую поддержку проектным командам?(%)

62% опрошенных утверждают, что социальные проекты, которые реализуются у них в районе, разработаны с учетом социальных проблем территории и, соответственно их реализация позволяет решить эти проблемы.



Рисунок 15 - Оцените реальный вклад социальных проектов в решении социальных проблем вашей территории?(%)

По результатам итоговой экспертизы большинство проектов достигли запланированного результата.

Очень показательно, что сохраняется тенденция приобретения оборудования за счет грантов для расширения материально-технической базы организаций, и 42% заявителей приобретают его для осуществления текущей деятельности.

У краевых проектов не складывается сеть, нет наработанных активов в территориях. Большая часть работы падает на руководителя и головную организацию.

В основном участвуют в конкурсе только бывшие муниципальные организации.

Очень многие проекты – это проекты одного человека. Процессы командообразования во многих проектах очень слабые. Судьба проекта зачастую зависит от мотивов действий и состояния здоровья руководителя. Другие члены команды могут даже не владеть основной проектной идеей, будучи исключительно исполнителями. Этот факт подтверждается результатами анкетного опроса, более 90% анкет исполнителей были заполнены именно руководителями проектных команд. Причиной является боязнь заявителей закладывать зарплату проектной команде, тем самым снижается мотивация участия в проекте.

Выводы и рекомендации

1. Часты случаи, когда проектная команда долго не может заключить договор гранта. Это чаще всего, связано с ошибками в расчетах

- бюджета или исправлениями в плане работы. Таким образом, следует обратить внимание грантополучателей на более детальную проработку бюджета, особенно при заполнении сметы в договоре, более «плотную» работу руководителя проекта с бухгалтером.
2. Рекомендуются использовать одну оценочную шкалу, как при разработке проекта, так и при оценке проектов.
 3. Грантодателю надо информировать по электронной почте координаторов об объявлении конкурса и его итогах, а затем и заявителей, проекты которых поддержаны.
 4. Проводить обучающие семинары при заключении договора на получение гранта по вопросам: работа с сайтом программы, управления проектом, примеры бухгалтерских документов, в том числе оформление собственного вклада в проект.
 5. Критерии оценки выставленных на сайте «Социальное партнерство во имя развития» материалов представлять до начала реализации проекта.
 6. В проектах с ветеранскими организациями предусмотреть партнерство с молодежными или другими организациями, которые помогут им освоить работу с сайтом Программы.
 7. В семинар по управлению проектами для грантополучателей включить разделы: принятие управленческого решения в критической ситуации, оформление и предоставление отчетности на сайте Программы, бухгалтерская отчетность и документация.
 8. По мнениям грантозаявителей существует логический разрыв между оценкой заявок и принятием решений грантовым советом, когда имеются положительные оценки и комментарии всех трех экспертов, которые поддерживают проект, а грантовый совет - нет. Такие оценки и решения на их основе могут влиять на авторитет экспертов и программы в целом.

Так как немалое количество проектов получили хороший результат, и этот результат не отражен на сайте программы, ниже приводятся рекомендации по работе сайтом:

1. Необходимо каждому грантополучателю вручать памятку или рекомендации по оформлению отчетов о выполнении проекта для сайта программы: программа, требования или рекомендации по оформлению отчетов о проведенных мероприятиях. Пример полного оргплана проекта в Word.
9. Необходимы точные рекомендации, что должны содержать материалы отчета, кроме фотографий, списков (списки не должны содержать адреса и телефоны).
10. Предложить в качестве самооценки прикладывать к отчету сканы статей в СМИ, ссылки на сайты.

11. Если в рамках проекта создан фильм, в качестве отчета можно выставить скриншоты, ссылку на файлообменник, где может находиться сам фильм.
12. Если в рамках проекта разработан сайт – выкладывать бриф на создание сайта.
13. Грантополучатели обязательно должны иметь контактные телефоны и e-mail специалистов Агентства.

Процедуру выездной работы экспертов необходимо пересмотреть, сконцентрировавшись на дистанционной работе с грантополучателями, осуществляя лишь точечные выезды для посещения самых ярких или самых неуспешных проектов.

В качестве комментария от исполнителей:

“Хорошо бы уйти от многочисленных доработок и больших снижений бюджета проектов. Есть крепкие проекты, заявители которых хорошо обосновывают бюджет изначально и не запрашивают ничего лишнего. Но начинаются бесконечные доработки, ограничения, которые нередко выхолащивают проект или затрудняют его выполнение” (Л.Макарова – руководитель проекта).



*Красноярская региональная общественная организация
«Агентство общественных инициатив»*

ПРИЛОЖЕНИЯ



***Красноярская региональная общественная организация
«Агентство общественных инициатив»***



**Красноярская региональная общественная организация
«Агентство общественных инициатив»**

Приложение А Список проектов выездного мониторинга.

Номер проекта	Название проекта	Территория	Оценка эксперта от 1 - 10	Итоговая оценка по рейтингу от 1 - 10	Комментарий эксперта	Публикации в СМИ	Результативность от 1 - 5
ПА-12-018	Память в наших сердцах	Иланский район	10	9	Хороший добротный проект, отработанный на совесть, хороший резонанс районе. Инноваций нет.	8 статей в газете Иланские вести	5. Проект отлично выполнен. Герой. Все по плану, на сайте выставлены все отчеты в верной форме.
БГ-12-019	Слово предоставляется детям	Козульский	8	7	Высокая эффективность, вклад из бюджета поселка, проект стал участником межрегионального фестиваля. В целевой программе на 2012-2015 г. Заложены средства на реализацию этого проекта	ПУБЛИКАЦИИ: ГАЗЕТА «АВАНГАРД» 1 ПУБЛИКАЦИЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ	4. Проведена хорошая работа. Отчеты на сайт поступают хорошо.

БГ-12-067	КРОХА +	Боготольский	8	9	технологичный, но ранее отработанный в др. территориях	3 публикации в боготольских газетах	5. На сайте выложены замечательные и подробные отчеты. Все вовремя..
ДС-12-025	Бухта радости	Манский	8	7	проект хороший-шефская помощь по запросу, использовано анкетирование целевой группы на входе и выходе из проекта	2 ПУБЛИКАЦИИ В ГАЗЕТЕ "Манская жизнь"	4.Хороший проект. С сайтом проблем нет.
1211-076	С компьютером на ты	Манский р-н	8	7	интересный проект, присутствует индивидуальное, групповое обучение, практика-электронный сход граждан- инновация для села!	1 публикация в газете "Манская жизнь"	4.Хороший проект. С сайтом проблем нет.
АН-12-008	Астафьевский клуб	Балахтинский	8	7			4.Хороший проект. С сайтом проблем нет.

БГ-12-060	Домишко из книжки	Иланский	8	7	проект реализован в соответствии с планом, инновационных идей нет, идея проекта актуальна-привлечение детей к чтению		4.Хороший проект. К сожалению,не все отчеты были полными.
ПА-12-055	Сибирские корабли	Канский р-н	7	3	Проект хороший, отрабатывают качественно но материалы на сайт выставляют с задержкой		2.Не все отчеты есть на сайте. Некоторые были выставлены с опозданием. Отчеты не содержат подробной и нужной информации.
1241-003	День рождения в подарок	Боготольский район	7	8		2 публикации в районных СМИ	5.Все отчеты есть на сайте. Почти все содержат нужную информацию.
1242-006	Творческая студия "Клип-Клёп"	Железногорск	6	8			5.Все отчеты есть на сайте. Почти все содержат нужную

							информацию.
1231-088	Рейс особого назначения	Иланский р-н	9	8	Проект интересный, полезен как выездное мероприятие для села. Большой охват территорий и жителей	4 публикации в газете "Иланские вести"	5. Все отчеты есть на сайте. Не все содержат подробную информацию. В целом, все хорошо.
1251-016	Сотрудничество - путь к успеху	Ачинский	4	6	Слабый проект	2 ПУБЛИКАЦИИ В МЕСТНОЙ ГАЗЕТЕ, НА СВОЕМ САЙТЕ	4. Все отчеты есть на сайте, но мало таких, которые бы содержали полную информацию по мероприятию.
ДС-12-032	Дети индиго	Иланский	9	7	Проект можно представить как технологию, обучение волонтеров для работы с детьми, находящимися на реабилитации в больницах, центрах		4. Все отчеты есть. Иногда выкладывались не в срок. Не все отчеты содержат полную информацию.

ПА-12-104	Споёмте, друзья	Боготольский район	5	4	реализован в полном объеме, ничего интересного нет	1 публикация в местной газете	3. Все отчеты есть. Но они не содержат подробной и нужной информации.
1241-057	ИЗОБРЕТАЯ ДЕТСТВО	Канский район	8	9	Проект, на мой взгляд, близок к текущей деятельности учреждения, есть инновационные подходы к реализации, не всегда вовремя выставлялись материалы		5. Хороший проект. Отчеты выставляются в срок. Проблем нет.
1231-005	Счастлив тот, кто счастлив дома	Иланский р-н	6	6	проект отработан поверхностно, слабые отчеты, идея неплохая, но не видно эффекта через отчеты и анкеты.	Есть 1 публикация	4. Все отчеты есть. Но не все содержат подробную и нужную информацию.
1231-042	Сибирячек-Здоровячек	Боготольский р-н	5	7			4. Все отчеты есть. Не все содержат нужную и подробную информацию.

1261-089	Здравствуйте, часом братан и сестреница	Новоселовский р-н	10	5			3.Неполный орг.план, а также, не все отчеты содержат подробную информацию.
СВ-12-012	Аллея памяти – аллея связи поколений	Канск	6	5	на момент мониторинга проект шел с хорошей реализацией, но к сожалению произошел сбой в реализации, не выставлены на сайт последние материалы, проект не закончен.		3.Многие отчеты отсутствуют на сайте. Не все содержат нужную информацию.
1261-076	Культпоход - Сибирское открытие Владимира Зазубрина	Канск	10	8	проект очень хорош, качественно хорошо отработан, большой охват территорий и целевой группы. Может претендовать на технологию, культпоход-открытие, знакомство с творчеством.	11 публикаций	4.Отчеты выставлялись в срок. Но некоторые не содержат нужной информации.

**Красноярская региональная общественная организация
«Агентство общественных инициатив»**

1261-097	Моя родная Нарва	Манский р-н	8	7	Хороша идея включения отдыхающих в облагораживание территории, интересна идея карты достопримечательностей, фильм, природоохранные знаки	3 публикации в "Манской жизни"	4. Все отчеты есть. Но не все содержат подробную и нужную информацию.
1211-036	Надо жить!	Назарово	6	6	на старте		3. Есть все отчеты. Многие не содержат нужной и подробной информации.
1211-082	Университет третьего возраста	Дивногорск	10	7			4. Все отчеты есть. Но не все содержат подробную и нужную информацию.
1211-098	Авангард	Боготольский р-н	8	6	в дальнейшем может стать услугой-тренажерный зал	Местная газета - 2	4. Все отчеты есть. Но не все содержат подробную и нужную информацию.

1211-100	Рука помощи	п. Кедровый	10	6	очень качественно выполнен	сайт администрации, 4 публикации в газете "Кедровый"	4. Все отчеты есть. Но не все содержат подробную и нужную информацию.
БГ-12-071	Аптека для души	Манский	8	6	новый формат работы библиотеки-семейный клуб, очень интересный и полезный проект	1 публикация в "Манской жизни"	4. Все отчеты есть. Но не все содержат подробную и нужную информацию.
ПА-12-028	Село мое родное времен связующая нить	Балахтинский	10	7			4. Все отчеты есть. Но не все содержат подробную и нужную информацию.
1261-029	Национальные гостиные	Саянский р-н	6	6	все выполнено, ничего нового	2 публикации на сайте организации-заявителя	4. Все отчеты есть. Но не все содержат подробную и нужную информацию.

1261-036	Боевая история военной формы	Канск	10	6	проект хорошо выполнен, хорошая идея патриотического воспитания молодежи через реконструкцию событий		5. Все отчеты есть. Но не все содержат подробную и нужную информацию.
СВ-12-011	С песней по жизни!	Назарово	6	6	мероприятия хорошие, ничего нового, на старте	Отсутствуют	4. Все отчеты есть. Но не все содержат подробную и нужную информацию.
1211-009	Общество и мы ЕДИНЫ!	Абанский р-н	7	1	проект на старте	4 публикации	0. Отчеты отсутствуют.
1211-050	Добрых рук творенье	Назарово	5	6	проект на старте	Отсутствуют	4. Все отчеты есть. Но не все содержат подробную и нужную информацию.
1231-163	Тропинка к здоровью	п. Кедровый	10	7	хороший проект, использованы квесты для смешанных команд. Семейный клуб-можно тиражировать	1 публикация на сайте администрации, 2 в местной газете	4. Отсутствуют многие отчеты. Не все содержат нужную и подробную информацию.

1261-086	История, рассказанная блюдцем	Иланский р-н	8	4	проект хорош, классная идея, претендует на технологию. Не выставляют вовремя отчеты.	3 публикации, страничка в Контакте	2.Очень много отчетов отсутствует. Те, что есть, не содержат нужную и подробную информацию.
СВ-12-028	Ликбез XXI века	Манский р-н	7	3	механизм уже отработанный в Красноярске по обучению пенсионеров пользованию электронными системами, но для села новый и входящий в разряд востребованных услуг	Отсутствуют	2.Почти нет отчетов..
1211-074	Кликни власть	Балахтинский р-н	5	4			3.Все отчеты есть. Не содержат совершенно никакой нужной информации.
АН-12-032	Сквозь время и годы	Сухобузимский	6	8	хороший, обычный	Отсутствуют	4.Все отчеты есть. Почти все содержат подробную

							информацию.
БГ-12-025	Галерея талантов	Железногорск	8	7	мастерская куклы-хороший	Отсутствуют	4. Не все отчеты есть. Некоторые не содержат нужной информации.
ДС-12-057	Вальс начинается. Дайте, сударыня, руку!	Ачинский	8	8	студия танца, место знакомств для пожилых и зрелых людей	Отсутствуют	4. Все отчеты есть. Почти все содержат подробную информацию.
ДС-12-069	Живи, родник!	Сухобузимский	8	6	хороший проект на объединение сообщества	1 публикация в местной газете	4. Все отчеты есть. Но многие не содержат нужной и подробной информации.
1261-028	Экологическая экспедиция	Канский р-н	8	3	проект интересен и полезен для местной территории	Отсутствуют	2. Проекты не содержат нужной и подробной информации.

СВ-12-024	Мастераская творчества	Иланский р-н	5	4	очень слабый проект, подключала волонтеров для выполнения, нет связи с координатором, нет внутренней преемственности в проекте		3. Многие отчеты отсутствуют на сайте. Не все содержат нужную информацию.
РЯ-12-018	Говори правильно	Назарово	4	5	проект на старте	Отсутствуют	3. Несколько отчетов отсутствует. Не все содержат нужную и подробную информацию
1231-200	Я, 7-Я и моя семья	Саянский р-н	2	5	Не выполнено 3 мероприятия	Отсутствуют	3. Отчеты все есть. Многие не содержат нужную и подробную информацию.
АН-12-013	Душа Сибири	Сухобузимский	0	0	Договор не заключен	Отсутствуют	0. Отчеты и орг. план отсутствуют.
1251-031	Твори добро	Ачинский	0	0	договор не заключен, претензии у заявителя к Агентству-провоочки с договором	Отсутствуют	0. Орг. план и отчет отсутствуют.

ДС-12-026	Связанные одной сетью	Минусинский	10	5			3.Отсутствуют некоторые отчеты. Многие не содержат нужной информации.
ДС-12-058	Доброе сердце	Балахтинский	7	5			3.Все отчеты есть. Многие не содержат нужную и подробную информацию.
ПА-12-033	По праву памяти	Сухобузимский	6	3	Все мероприятия выполнены, ничего нового нет.	Отсутствуют	1.Почти нет отчетов.
ПА-12-091	Чтобы помнили	Минусинский р-н	6	3			2.Неполный орг.план. Отсутствует один отчет. Отчеты не содержат нужной информации.

1244-002	Создание фитозон психологического комфорта для детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья	Железногорск	7	7			4.Отсутствуют некоторые отчеты. В целом, отчеты содержат нужную информацию.
1231-032	Мы за здоровый образ жизни!	Балахтинский р-н	8	5			3.Многие отчеты отсутствуют на сайте. Не все содержат нужную информацию.
1211-083	Чтобы старость была в радость	Абанский р-н	8	6	молодежь для пенсионеров- курсы, творчество-досуг. Для территории актуален .но на момент мониторинга был неактивен.		3.Все отчеты есть. Но не все содержат подробную и нужную информацию.
1211 - 105	Мелодия здоровья	Железногорск	8	0	можно тиражировать	публикация на сайте заявителя, 1 в местной газете	0.Орг.план и отчет отсутствуют.

РЯ-12-031	Сохранная грамота	Минусинский р-н	9	1			0.Отсутствуют отчеты.
1231-080	Площадка совместного семейного творчества "Горница-искусница, горница - кудесница"	Пировский р-н	10	9	Проект очень добротен выполнен, хороший эффект для целевой аудитории, с переходом в технологию как способа работы с патронатными семьями, площадки для обучения творческим началам в молодых семьях		5.Отличный проект. Все отчеты есть, все вовремя, отчеты отлично выполнены.
1261-094	Вахта памяти	Зеленогорск	8	8	технологии нет, но можно тиражировать	публикация на сайте заявителя	5.Все отчеты есть. Содержат нужную информацию.
АН-12-017	Астафьев в памяти живой	Канский	8	7	проект добросовестно выполнен, инновации нет	Отсутствуют	4.Не все отчеты содержат нужную информацию.

*Красноярская региональная общественная организация
 «Агентство общественных инициатив»*

1261-046	Зелёная миля	Емельяновски й р-н	2	6	на момент оценки 13.09 20% мероприятий не проведены, запланированы массовые мероприятия на лето- люди не собрались, заявитель без согласования с Агентством перенес мероприятия на конец сентября.		4. Все отчеты есть. Не содержат подробную и нужную информацию.
----------	--------------	-----------------------	---	---	--	--	---

1211-056	Благотворительный марафон "Солнечный круг"	Большеулуйский р-н	8	6	газета сработала как профессиональная структура по сбору благотворительных пожертвований. Очень хороший, отработанный механизм сбора частных пожертвований	сайт KGS.RU, ролик на Яндекс.видео, статья на сайте АНО "Семья России", сайт Красноярской епархии РПЦ, группа в Контакте, Пресс-лайн, официальный сайт Большеулуйского района	4. Все отчеты есть. Многие не содержат нужную и подробную информацию.
1261-106	Человек. писатель. Земляк.	Нижнеингашский р-н	7	6	на старте	2 публикации	3. Многие отчеты не содержат нужную информацию.
1241-092	Новая высота	Зеленогорск	8	7	можно тиражировать,	на своем сайте	4. Не все отчеты

					скейтпарк , услуга		содержат нужную информацию.
ПА-12-074	И помнит мир спасенный	Емельяновски й р-н	6	6	устаревшая технология	2 публикации в местных газетах	3.Все отчеты есть .Многие не содержат нужную и подробную информацию.
1251-021	Наш дом Кедровый	п. Кедровый	10	2	тиражируемый, хорошая технология включения граждан в местное самоуправление	на сайте администрации, в местной газете	1.Почти все отчеты отсутствуют.
1231-090	Лазанька	Бородино	2	3	4 мероприятия не проведены на октябрь, примерно 30%	Отсутствуют	2.Отсутствуют некоторые отчеты. Многие не содержат нужную и подробную информацию.
1234-004	GREENEXTRIM – зеленогорская планета экстрима	Зеленогорск	8	0	зоны, для экстремальных видов спорта, можно тиражировать-услуга	на сайте заявителя	0.Орг.план и отчет отсутствуют.
ПА-12-075	Дружба	Нижнеингашс кий	7	6	на старте	1 публикация	3.Все отчеты есть. Многие не содержат нужную и

							подробную информацию.
1261-052	Поиск	Тасеевский р-н	10	6	претендует на технологию, воспитание патриотизма через поисковую деятельность волонтерских молодежных отрядов.		3. Все отчеты есть. Многие не содержат нужную и подробную информацию.
БГ-12-070	Почитай-ка	Краснотуранский	8	0			0. Орг. план и отчет отсутствуют.
1241-078	Летнее игровое многоборье в Дзержинском	Дзержинский р-н	9	9	проект подтянут к основной деятельности, но сделан хорошо, очень большая заинтересованности главы района в реализации, помощь и присутствие на многих мероприятиях. Очень исполнительный руководитель.		5. Отличный проект. Все отчеты есть, все вовремя, отчеты отлично выполнены.

СВ-12-025	Сибирское здоровье	Кежемский р-н	3	3	очень слабый проект, на момент мониторинга реализация была приостановлена, сменилось руководство, не выставлялась информация, сроки менялись. Надеюсь на формирование проектной культуры в район после семинара и участия 3 человек в семинаре в Красноярске.	1 публикация	1.Почти нет отчетов.
БГ-12-064	Лето не для скуки	Краснотуранский	8	8			4.Некоторые отчеты не содержат точную информацию.
1211-015	Познавай, путешествуя	Минусинский р-н	9	8			4.Очень много описательной информации, но иногда отсутствует точная информация.

1211-028	Плечом к плечу	Минусинск	9	7			4.Отсутствуют некоторые отчеты. А также, некоторые не содержат подробной информации.
1231-008	Мы за здоровый образ жизни	Богучанский р-н	8	4	Очень полезный проект .Прошли два спортивных праздника в отремонтированном зале и вновь созданной ледовой коробке	2 публикации в газете "Ангарская правда" и 2 репортажа на телеканале "Спектр".	2.Отсутствуют некоторые отчеты. Многие не содержат нужную и подробную информацию.
1261-093	Енисейск, дарящий вдохновенье	Енисейский р-н	1	7			4.Все отчеты есть. Почти все содержат подробную информацию.
1261-137	Избушка рыбака	Енисейский р-н	1	3			2.Отсутствуют некоторые отчеты. Многие отчеты не содержат нужную информацию.

СВ-12-027	Клуб "Надежда"	Енисейский р-н	1	6			2. Многие отчеты не содержат нужную информацию.
1211-017	АйТи-БУМ	Богучанский р-н	8	5	Услуга не нова, но на селе востребована. Прошла общественная презентация проекта.	2 публикации в газете "Ангарская правда".	3. Отсутствуют некоторые отчеты. Многие не содержат нужную и подробную информацию.
ДС-12-055	ВЕТРАН.РФ	Ермаковский	7	5			3. Многие отчеты не содержат нужную информацию. Некоторые повреждены.
БГ-12-053	Любознайка Летняя библиоплощадка	Шушенский р-н	1	0			0. Отчеты отсутствуют.

ПА-12-019	Площадь Памяти	Дзержинский район	8	8	Проект реализован в соответствии с планом, были не большие задержки в выставлении информации на сайт, небольшой охват целевой аудитории, не все партнеры работали в проекте , выполнили хорошо.		4.Отчеты содержат нужную информацию.
1211-012	Рука в руке	Шушенский р-н	8	7			4.Некоторые отчеты не содержат точную информацию.
1261-068	Енисейский календарь	Енисейский р-н	1	6			4.Не все отчеты содержат нужную информацию.

ПА-12-065	Не смолкнет слава, не померкнет подвиг	Богучанский р-н	8	5	Проект имел большой резонанс, презентация в клубе. Интересное воплощение "аллеи славы" в помещении школы.	2 публикации в газете "Ангарская правда". Регулярно на телеканале "Спектр"	3.Отсутствуют многие отчеты. Не все содержат нужную и подробную информацию.
ПА-12-072	Мы память бережно храним	Богучанский район	8	5	Проект имел большой резонанс. Очень активная группа волонтеров. Создан интересный фильм о ветеранах.	Отсутствуют	3.Все отчеты есть. Не содержат нужной и подробной информации.
1241-066	Енисейские Кулибины	Енисейск	1	5			3.Многие отчеты не содержат нужную и подробную информацию.
1241-102	Ирбис	Шушенский р- н	9	0			0.Орг.план и отчет отсутствуют.

РЯ-12-029	Национальная жемчужина - русский язык	Енисейск	0	5			3. Все отчеты есть. Но многие не содержат нужную и подробную информацию.
ДС-12-071	Тепло добрых сердец	Красноярск	0	8			4. Отчеты содержат нужную информацию.
1230-015	Спортивный край - это я и моя семья	Красноярск	0	8			4. Все отчеты есть. Содержат нужную и подробную информацию.
1212-012	Кто, если не я!	Красноярск	10	9	ПРЕТЕНДУЮТ НА ГЕРОЕВ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РОДИТЕЛЬСКИЙ ОТЦОВСКИЙ КЛУБ С ДЕТЬМИ АУТИСТАМИ, ОНИ СТРОИЛИ ЛЕТНЮЮ ДАЧУ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ ИНВАЛИДАМИ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПОЛУЧИЛИ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ	НА САЙТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЕСТЬ МАТЕРИАЛЫ О ПРОЕКТЕ	5. Отличный проект. Все отчеты есть, все вовремя, отчеты отлично выполнены.

1242-007	Казакам и Женсовету по праву создать детскую казачью заставу	Красноярск	8	5			3.Отчеты не содержат нужной информации.
1231-093	Школа волонтеров	Красноярск	0	9			5.Отличный проект. Все отчеты есть, все вовремя, отчеты отлично выполнены.
1211-096	Городской Семейный Клуб	Красноярск	8	8			4.Неплохие отчеты, часто отсутствует информация о кол-ве участников.
1231-069	Семейкин остров	Красноярск	9	7			4.Хорошие описательные отчеты, к сожалению, отсутствует часто информация о кол-ве участников.

1211-092	Энергия жизни	Красноярск	6	5	Не проведен ряд мероприятий, поскольку не явились участники. Не приобрели заявленное оборудование во время, поскольку не оказалось в Красноярске. Занятия проводятся 1-2 раза в 2 недели, есть спрос	ЖУРНАЛ «ПЕС И КОТ» С АНОНСОМ ПРОЕКТА	3. Многие отчеты не содержат нужную информацию.
1210-011	Социальный калейдоскоп	Красноярск	0	0			0. Орг. план и отчет отсутствуют.
1212-009	Детский адаптивный конный туризм	Красноярск	9	6			3. Не все отчеты содержат нужную информацию.
1231-104	Бесплатная роллер-школа	Красноярск	6	7			4. Неплохая работа. Почти все отчеты поступали вовремя. В некоторых отсутствует нужная информация.

ДС-12-004	Мы-вместе! (сотрудничество с Минусинским детским домом для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)	Красноярск	8	6			3. Все отчеты есть. Но многие не содержат нужной информации.
1261-107	Точно в Цель	Ермаковский р-н	5	10	Увлеченные своим делом педагоги проводят такую важную и необходимую работу по нравственному и патриотическому воспитанию детей и подростков, которую трудно переоценить. Они способствуют тому, чтобы дети, окончившие эту школу, были мотивированы на получение профессии, труд, а после получения профессии возвращались в свое родное село и продолжали жить и работать здесь		5. Не все отчеты содержат полную информацию о мероприятиях.



*Красноярская региональная общественная организация
«Агентство общественных инициатив»*

Приложение Б. Проекты с баллом 7 и выше по оценкам экспертов и по сайту.

№п/п	Номер проекта	Название проекта	Территория	Оценка эксперта от 1 - 10	Итоговая оценка по рейтингу от 1 - 10
------	---------------	------------------	------------	---------------------------	---------------------------------------

1.	ПА-12-018	Память в наших сердцах	Иланский район	10	9
2.	БГ-12-019	Слово предоставляется детям	Козульский	8	7
3.	БГ-12-067	КРОХА +	Боготольский	8	9

4.	ДС-12-025	Бухта радости	Манский	8	7
5.	1211-076	С компьютером на ты	Манский р-н	8	7
6.	АН-12-008	Астафьевский клуб	Балахтинский	8	7
7.	БГ-12-060	Домишко из книжки	Иланский	8	7

8.	1241-003	День рождения в подарок	Боготольский район	7	8
9.	1231-088	Рейс особого назначения	Иланский р-н	9	8
10.	ДС-12-032	Дети индиго	Иланский	9	7
11.	1241-057	ИЗОБРЕТАЯ ДЕТСТВО	Канский район	8	9

12.	1261-076	Культпоход - Сибирское открытие Владимира Зазубрина	Канск	10	8
13.	1261-097	Моя родная Нарва	Манский р-н	8	7
14.	1211-082	Университет третьего возраста	Дивногорск	10	7
15.	ПА-12-028	Село мое родное - времен связующая нить	Балахтинский	10	7

16.	1231-163	Тропинка к здоровью	п. Кедровый	10	7
17.	БГ-12-025	Галерея талантов	Железногорск	8	7
18.	ДС-12-057	Вальс начинается. Дайте, сударыня, руку!	Ачинский	8	8
19.	1244-002	Создание фитозон психологического комфорта для детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья	Железногорск	7	7

20.	1231-080	Площадка совместного семейного творчества "Горница-искусница, горница - кудесница"	Пировский р-н	10	9
21.	1261-094	Вахта памяти	Зеленогорск	8	8
22.	АН-12-017	Астафьев в памяти живой	Канский	8	7
23.	1241-092	Новая высота	Зеленогорск	8	7

24.	1241-078	Летнее игровое многоборье в Дзержинском	Дзержинский р-н	9	9
25.	БГ-12-064	Лето не для скуки	Краснотуранский	8	8
26.	1211-015	Познавай, путешествуя	Минусинский р-н	9	8
27.	1211-028	Плечом к плечу	Минусинск	9	7

28.	ПА-12-019	Площадь Памяти	Дзержинский район	8	8
29.	1211-012	Рука в руке	Шушенский р-н	8	7
30.	1212-012	Кто, если не я!	Красноярск	10	9



*Красноярская региональная общественная организация
«Агентство общественных инициатив»*

31.	1211-096	Городской Семейный Клуб	Красноярск	8	8
32.	1261-107	Точно в Цель	Ермаковский р-н	5	10
33.	1231-069	Семейкин остров	Красноярск	9	7



*Красноярская региональная общественная организация
«Агентство общественных инициатив»*

Приложение В. Мониторинг СМИ проектов программы «Социальное партнерство во имя развития» профинансированных в 2012 году.

№ п\п	Территория	Название СМИ	Сайт	Ссылка	Название и автор статьи	Проект
1.	Абанский р-н	Красное знамя	http://www.abannet.ru/news abannet.ru/main?page=17&module=xid&func=viewpub.. 18 - Администрация Абанского Района www.abannet.ru/main?page=17 http://www.mediakrsk.ru/	23 - Администрация Абанского Района abannet.ru/main?page=22&module=xid&func=viewpub.. Социальная защита населения - Администрация Абанского ... Красное знамя (Абан) №19 от 11.05.2012	Социальное партнерство во имя развития среда, 4 Апрель, 2012 СОЗДАЙ СВОЙ ФОНД, СОЗДАЙ СВОЙ ПРОЕКТ! О. ВИТАЛЬЕВА	Чтобы старость была в радость
2.	Абанский р-н, с. Березовка	Красное знамя	abannet.ru/main?page=17&module=xid&func=viewpub..	Социальная защита населения - Администрация Абанского ... 18 - Администрация Абанского Района www.abannet.ru/main?page=17	Приветствуем вас на сайте Абанского муниципального района. ... подержжупроект МБУК «Березовская ЦКС» - «Общество и мы - ЕДИНЫ!» (120000 ...	Общество и мы - ЕДИНЫ!
3.	Ачинский, г. Ачинск	Причулымский вестник	http://pv-press.ru/index.php/component/k2/item/1125-vals-nachinaetsa-daite-sudarina-ruku.html	АВТОР СВЕТЛАНА ШУШЕНАЧЕВА02 НОЯБРЯ 2012		Вальс начинается. Дайте, сударыня, руку!
4.	Ачинский, г. Ачинск	Причулымский вестник			нет	Твори добро
5.	Ачинский, г. Ачинск	Причулымский вестник			нет	Сотрудничество - путь к успеху
6.	Балахтинский	Сельская новь	http://www.sn.balahta.ru/		нет	Астафьевский клуб
7.	Балахтинский	Сельская новь	http://www.sn.balahta.ru/	Источник: газета "Сельская новь",		Доброе

	нский ,с. Грузенк о	новь		№42, 19.10.2012		сердце
8.	Балахти нский р- н	Сельская новь	http://www.sn.balahta.ru/ , http://балахтинскийрайон.рф/?skip=50		нет	Кликни власть
9.	Балахти нский р- н с. Грузенк о	Сельская новь	http://www.sn.balahta.ru/	Балахтинский район - Администрация Балахтинского района stc.58.68.188.95.dsl.krasnet.ru/index .php?category=xlpeoksyptic.,		Мы за здоровый образ жизни!
10.	Балахти нский р- н, балахта	Сельская новь	http://www.sn.balahta.ru/		нет	Передвижна я выставка- презентация прикладного творчества «Смотри на меня как на равного»
11.	Балахти нский р- н,д.Тала я	Сельская новь	http://www.sn.balahta.ru/		нет	Три богатыря
12.	Балахти нский, с. Кожаны	Сельская новь	http://www.sn.balahta.ru/		нет	Село мое родное - времен связующая нить
13.	Бирилюс ский		http://www.birilussy.ru/static/OSZN.html			Ты в мире не один
14.	Бирилюс ский р-н				нет	Шаг навстречу
15.	Бирилюс ский р-н, С. Полевое				нет	Память в сердце каждого из нас

16.	Боготольский район	(Земля Боготольская)	http://www.zemlyabogotol.ru		нет	Споёмте, друзья
17.	Боготольский район, с.Большая Косуль	(Земля Боготольская)	http://www.zemlyabogotol.ru		нет	День рождения в подарок
18.	Боготольский р-н	(Земля Боготольская)	http://www.zemlyabogotol.ru http://www.zemlyabogotol.ru/novosti-rayona/u-svyatogo-istochnika/	Опубликовал editor on 10/24/12 • В рубрике В нашем районе		Глоток воды из чистого источника
19.	Боготольский р-н	(Земля Боготольская)	http://www.zemlyabogotol.ru http://www.zemlyabogotol.ru/novosti-goroda/uchrezhdeniya-kulturyi-gotovyatsya-k-novomu-tvorcheskomu-sezonu/	Опубликовал editor on 9/19/12 • В рубрике Город и горожане,Новости	Учреждения культуры готовятся к новому творческому сезону	Авангард
20.	Боготольский, г. Боготол	(Земля Боготольская)	http://www.zemlyabogotol.ru http://www.zemlyabogotol.ru/novosti-goroda/klub-kroha-priglashaet/	Опубликовал editor on 8/01/12 • В рубрике Город и горожане	КЛУБ «КРОХА +» ПРИГЛАШАЕТ...	КРОХА +
21.	Боготольский, с. Александровка	(Земля Боготольская)	http://www.zemlyabogotol.ru http://www.zemlyabogotol.ru/novosti-rayona/prazdnik-detstva-v-aleksandrovke/	Опубликовал editor on 6/13/12 • В рубрике В нашем районе	ПРАЗДНИК ДЕТСТВА В АЛЕКСАНДРОВКЕ	Я расту вместе с книжкой
22.	Боготольский, с. Вагино	(Земля Боготольская)	http://www.zemlyabogotol.ru http://www.zemlyabogotol.ru/novosti-rayona/smyishlenyish-zhdet-vas-v-gosti/	публиковал editor on 8/01/12 • В рубрике В нашем районе	«СМЫШЛЕНЬШ» ЖДЕТ ВАС В ГОСТИ	Смышлёныш
23.	Боготольский, с.Вагино	(Земля Боготольская)	http://www.zemlyabogotol.ru http://www.zemlyabogotol.ru/novosti-rayona/proekt-domostroy-v-deystvii/	Опубликовал editor on 8/22/12 • В рубрике В нашем районе	Проект «Домострой» в действии	Домострой
24.	Боготольский, с. МБОУ Большекосульска	Земля Боготольская)	http://www.zemlyabogotol.ru/novosti-rayona/sibiryachok-zdorovyachok/	Опубликовал editor on 6/20/12 • В рубрике В нашем районе	«СИБИРЯЧОК-ЗДОРОВЯЧОК»	Сибирячек-Здоровячек

25.	я СОШ Богучанский район, Красноярский	Ангарская правда (Богучаны)	http://www.angarskayapravda.ru/	Нет публикаций		АйТи-БУМ
26.	Богучанский район, п. Невонка	Ангарская правда (Богучаны)	http://www.angarskayapravda.ru/ http://www.angarskayapravda.ru/index.php/2010-12-14-05-00-57/1298-khraniteli-pamyati http://www.angarskayapravda.ru/index.php/2010-10-28-15-57-55/1106-ekho-dnya-poedy	Создано 21.09.2012 03:17 Опубликовано 21.09.2012 03:17 Создано 04.06.2012 05:07 Опубликовано 04.06.2012 05:07	Хранители памяти Эхо Дня Победы	Мы память бережно храним
27.	Богучанский р-н	Ангарская правда (Богучаны)	http://www.angarskayapravda.ru/ www.angarskayapravda.ru/index.php/2010-10-28-14-44-27/1062-sozdaem-memorial-ne-smolknet-slava-ne-pomerknut	Создано 12.05.2012 08:36 Опубликовано 12.05.2012 08:36	Создаем мемориал "Не смолкнет слава, не померкнет подвиг" -	Не смолкнет слава, не померкнет подвиг
28.	Богучанский р-н, г. Красноярск	Ангарская правда (Богучаны)	http://www.angarskayapravda.ru/ http://www.angarskayapravda.ru/index.php/2010-12-09-07-56-05/1417-dobrogo-zdorovya	Создано 30.11.2012 07:23 Опубликовано 30.11.2012 07:23	Доброго здоровья	Дорогою добра
29.	Богучанский р-н, п. Гремучий	Ангарская правда (Богучаны)	http://www.angarskayapravda.ru/ http://www.angarskayapravda.ru/index.php/2010-12-14-05-00-57/1297-nas-priglasili-v-krasnoyarsk http://www.angarskayapravda.ru/index.php/2010-12-14-05-00-57/1191-sport-i-trud-ryadom-idut	Создано 21.09.2012 03:13 Опубликовано 21.09.2012 03:13 Создано 20.07.2012 07:55 Опубликовано 20.07.2012 07:55	Нас пригласили в Красноярск! Спорт и труд рядом идут	Мы за здоровый образ жизни
30.	Большеулуйский п. Большой Улуй	Вести	Многопрофильный Молодежный Центр "Импульс" vk.com/club35450712 24 июня 2012 – Видео отчёт "Детский городок". 16 Nov at ... Description: Многопрофильный Молодежный Центр "Импульс" Большеулуйского Района ..			Детский городок

31.	Большеулуйский р-н	Вести	http://www.newslab.ru/news/384813	2 июня 2011 14:16 Общество , В Красноярском крае	В Большеулуйском районе состоялся благотворительный марафон «Солнечный круг»	Благотворительный марафон "Солнечный круг"
32.	Большеулуйский р-н, Большой Улуй	Вести	[DOC] Большеулуйский районный Совет депутатов - Законодательное ... www.sobranie.info/files/342222243281912-02.doc			С компьютером на ТЫ!
33.	Г. Бородин о			Нет публикации		Лазанька
34.	г. Енисейск посм. В контакте	Енисейская правда	http://www.enadm.ru vk.com/club21599956	Равный-Равному Россия (У-PEER Russia) 10 дней АКТИВИЗМА		Енисейские Кулибины
35.	г. Красноярск		http://www.myk1.ru/project.html	Газета «Наш край», №33	Дорогого стоит. Н. Козлова	Мы-вместе!(сотрудничество с Минусинским детским домом для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)
36.	Дзержинский район, с.Нижний Танай		http://usolka.ru/publ/ljudi/spisok_3/4-1-0-15	Дзержинское землячество	Материалы	Площадь Памяти
37.	Дзержин		http://dzerzhinskoe.ru/2011-03-26-09-08-10/1624-	Летнее игровое многоборье в		Летнее

	ский р-н		2012-07-16-01-45-25	Дзержинском 16.07.12 09:41 Добавил(а) А. ОБУХОВ		игровое многоборье в Дзержинско м
38.	Дивногорск		http://divedu.ru/index.php/universitet-tretego-voznasta http://divedu.ru/index.php/universitet-tretego-voznasta/742-informatsiya-o-proekte-quniversitet-tretego-voznastaq http://div-portal.ru/novosti/gazeta-ogni-eniseja/Ne-hotyat-otstavat.html http://div-portal.ru/novosti/gazeta-ogni-eniseja/Kompyuternyj-likbez.html http://www.divnogorsk-oe.ru/shstat.php?ids=1427 http://divnogorsk-oe.ru/shstat.php?ids=1372	<p>Сюжет о проекте</p> <p>Информация о проекте "Университет третьего возраста" Категория: Университет третьего возраста Опубликовано 17.04.2012 12:48 Не хотят отставать</p> <p>Компьютерный ликбез Не хотят отставать 27.04.2012</p> <p>Компьютерный ликбез 13.04.2012</p> <p>Дивногорские пенсионеры вновь получают возможность бесплатно овладеть компьютерной грамотностью!</p>	<p>Категория: Университет третьего возраста Опубликовано 06.10.2012 22:02 Фотоотчёт Категория: Университет третьего возраста Опубликовано 12.09.2012 2</p> <p>Первые мероприятия проекта</p> <p>Категория: Университет третьего возраста Опубликовано 18.05.2012 09:58 3 мая 2012 – Администратор</p> <p>19 апреля 2012 – Администратор</p>	Университет третьего возраста Светлана ШИДЛОВС КАЯ
39.	Емельяновский р-н, с. Еловое		http://www.emelyanovskievesi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3465:2012-11-10-06-42-13&catid=65:2010-07-08-12	О, СПОРТ! ТЫ МИР!	Автор: Administrator 10.11.2012 13:36	Зелёная миля
40.	Емельяновский		http://www.emelyanovskievesi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2929:2012-05-06-10-	СОХРАНИТЬ ДЛЯ ИСТОРИИ	Автор: Administrator 06.05.2012 17:34	И помнит мир

	р-н, с. Дроки но		36-10&catid=44:2009-09-04-1 http://www.24smi.com/info/view/9022?region=79	Патриотизм как составная часть духовно- нравственного воспитания личности		спасенный автор: Шампурова Людмила Владимиров на
41.	Енисейс к	Енисейская правда	http://www.enadm.ru www.ucoz.epk.ru http://epk.ucoz.ru/news/s_proektom_na_sever/2012-02-16-425	С проектом - на север	Главная » 2012 » Февраль » 16 » С проектом - на север	Национальн ая жемчужина - русский язык
42.	Енисейс кий р-н, Енисейс к	Енисейская правда	http://www.enadm.ru http://www.eniseysk.com/about/info/news/2771/?sphrase_id=941889	Енисейск, дарящий вдохновение	М.А.Сидорова, Руководитель проекта «Енисейск, дарящий вдохновение.»	Енисейск, дарящий вдохновење
43.	Енисейс кий р-н, Поселок Подтесо во	Енисейская правда	http://www.enadm.ru			Клуб "Надежда"
44.	Енисейс кий р-н, поселок Усть- Кемь	Енисейская правда	http://www.enadm.ru http://www.enadm.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=431%3Anews170712&catid=34%3Anews&Itemid=1 http://www.eniseisk.ru/news/571/841/891.html www.eniseisk.ru/news/571/841/891.html http://www.krasrab.net/wordpress/post/4995 einform.tv/ В Красноярском крае отметили праздник “Енисейская уха ... www.krasrab.net/wordpress/post/49953 23 июл 2012 – Метки Енисейск, Енисейская уха, праздник, рыболовство ... работа музейной	Да здравствует День Енисейской ухи! Праздник «Енисейской ухи!» получился значительным, хорошо организованным и стал своеобразным открытием для жителей и гостей Енисейского района. В Красноярском крае отметили	17.07.2012 11:53 26 июля 2012 26 июл 2012 – Ещё один грантовый проект, выигранный и реализованный организаторами праздника - музейная комната «Избушка рыбака». Енисей-Информ ТВ » Страница 111	Избушка рыбака

Красноярская региональная общественная организация
«Агентство общественных инициатив»

			<p>комнаты «Избушка рыбака» с занимательными ...</p> <p>НА БЕРЕГУ ЕНИСЕЯ ПРИГОТОВИЛИ БОЛЕЕ 30 ВИДОВ УХИ ... www.mediakrsk.ru/publications/16/2012/08/01/2607.html</p> <p>1 авг 2012 – ... Енисейского района в реестре краевых социокультурных проектов. ... Вокруг ухи сложилось столько традиций, воспоминаний рыбаков, так велико ... музейной комнаты «Избушка рыбака» с занимательными экспозициями по ... Наряду с жителями Енисейского района свои подворья ...</p> <p>На берегу Енисея откроется «Избушка рыбака» PISCARI.RU piscari.ru/2012/07/.../na-beregu-eniseya-otkroetsya-izbushka-rybaka/</p> <p>На берегу Енисея откроется «Избушка рыбака». 05.07.2012 Автор: admin. В посёлке Усть-Кемь Енисейского района 21 июля, в день праздника ... для музея у местных и приезжих рыбаков», — говорят организаторы проекта.</p> <p>Описание водоемов piscari.ru/</p> <p>18 июл 2012 – На берегу Енисея откроется «Избушка рыбака». 05.07.2012 Автор: admin. В посёлке Усть-Кемь Енисейского района 21 июля, в день ... для музея у местных и приезжих рыбаков», — говорят организаторы проекта.</p> <p>Новости Красноярского края от НИА (media.russia.news - Subscribe subscribe.ru/archive/media.russia.news.../201207/23132445.html</p> <p>23 июл 2012 – День рыбака на Таймыре отметили массовыми гуляньями ... В Енисейском районе в третий раз отметили праздник «Енисейская уха» ... Internazionale S.p.A.» на выполнение проекта по</p>	<p>праздник «Енисейская уха»</p> <p>23 Июль 2012</p> <p>30 мар 2012 – В Енисейском районе прошел очередной конкурс «Лидер образования». Участие в нем ... В рамках этого же проекта в селе Усть-Кемь в местном доме культуры появится музей под названием «Избушка рыбака»</p>		
--	--	--	--	--	--	--

			существенному снижению выбросов работа музейной комнаты "Избушка рыбака" с занимательными ...			
45.	Енисейский р-н, село Верхнепашино	Енисейская правда	http://www.enadm.ru			Енисейский календарь
46.	Ермаковский	Нива				ВETERАН.РФ
47.	Ермаковский р-н	Нива	http://www.ergaki-park.ru/news/371/394.html http://www.dvpion.ru/kurs/ecodom.asp http://www.ergaki-park.ru/news/371/426.html http://www.ergaki-park.ru/news/371/395.html http://www.ergaki-park.ru/news/371/406.html http://www.shkola-tanzebey.narod.ru/leto.htm http://doopt.ru/?id=688	<p>Главная страница \ Новости \ ПОЛОЖЕНИЕ о краевом социальном проекте Экологическая школа «Мир заповедной природы»</p> <p>ПОЛОЖЕНИЕ о краевом социальном проекте Экологическая школа «Мир заповедной природы»</p> <p>Главная страница \ Новости \ Осенний модуль экологической школы «Мир заповедной природы»</p> <p>Осенний модуль экологической школы «Мир заповедной природы»</p> <p>Главная страница \ Новости \ О Т Ч Е Т об итогах проведения первого модуля экологической школы «Мир заповедной природы»</p> <p>О Т Ч Е Т об итогах проведения первого модуля экологической школы «Мир заповедной природы»</p>		Экологическая школа - Мир заповедной природы

				<p>новости лета Краевая Интенсивная Школа «Мир заповедной природы. Жемчужины Сибири» как компонент непрерывного экологического образования в Красноярском крае</p> <p>А.В. Чугаев, Е.С. Шестакова Красноярский краевой Дворец пионеров и школьников, г. Красноярск, e-mail: achugaev@mail.ru Сибирский федеральный университет, Красноярск, e-mail: shestakov@yandex.ru</p>		
48.	Ермаков ский р-н, п. Большая Речка		http://sohranenie-tradicij.ru/zodchestvo/zodchestvo/kras-zodchestvo	<p>О нас Сохраним традиции sohranenie-tradicij.ru/about.html Зодчество ... (наш сайт создан в рамках грантового проекта «Сохраним традиции зодчих Красноярья»). МООВ Ермаковского района, её председателю Матониной Вере Романовне — поддержка и помощь в реализации проекта.</p>		Сохраним традиции зодчества Красноярья
49.	Ермаков ский р-н, с. Нижний Суэтук	Нива		нет		Точно в Цель
50.	Железно горск	«Свежее телевидение – Железногорс к»	http://www.tv.k26.ru	нет		Мелодии здоровья

51.	Железногорск	«Свежее телевидение – Железногорск»	http://www.tv.k26.ru/	нет		Мелодия здоровья
52.	Железногорск	«Свежее телевидение – Железногорск»	http://www.tv.k26.ru http://www.admk26.ru/mods/news/show/?nid=5651	16.04.2012 В Железногорске откроется творческая студия «Клип-Клёп».		Творческая студия "Клип-Клёп"
53.	Железногорск	«Свежее телевидение – Железногорск»	http://www.tv.k26.ru	нет		Создание фитозон психологического комфорта для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья
54.	ЗАТО г. Железногорск	«Свежее телевидение – Железногорск»	http://www.tv.k26.ru	Город и горожане» № 75 от 20.09.12 «Позитив» от 26.09.12		Галерея талантов
55.	Зеленогорск	Голос времени	http://www.gazeta-gv.narod.ru Mbou-Dod-Tsdod Vityaz vk.com/id183055001 МБОУ ДОД ЦДОД "Витязь" Зеленогорск, Строителей ул., 12 А. 9 posts. Mbou- Dod-Tsdod ... городского проекта НОВАЯ ВЫСОТА http://www.zeladmin.ru/novosti/3407.html http://zelenogorsk24.ru/news/newszg/uchastniki-regionalnogo-festivalja-tehnicheskogo-tvorchestva-novoe-vremja-sobirayut-robotov-transporti	Социальное партнерство во имя развития-2012 Участники регионального фестиваля технического творчества «Новое время» собирают роботов-транспортировщиков ОЯТ		Новая высота

56.	Зеленогорск	Голос времени	http://www.gazeta-gv.narod.ru http://zelenogorsk24.ru/news/newszg/vospitaniki-centra-vitjaz-prinimayut-uchastie-vo-vserossiiskoi-vahte-pamjati.html http://zelenogorsk24.ru/news/newszg/u-stely-pobedy-zazhen-ogon-slavy-i-otkryta-vahta-pamjati.html В Зеленогорске открылась Вахта памяти	Воспитанники центра «Витязь» принимают участие во Всероссийской Вахте Памяти 5 мая 2012 У Стелы Победы зажжен Огонь Славы и открыта Вахта Памяти 4 мая 2012		Вахта памяти
57.	Иланский	Иланские вести	газета иланский вести, группа в контакте иланский молодежный центр. http://vk.com/molod_central	передовая статья новости культуры		Дети индиго
58.	Иланский район, п. Новониколаевка	Иланские вести	газета иланский вести, , вести из новониколаевки	передовая статья		Память в наших сердцах
59.	Иланский р-н	Иланские вести			нет	Мастерская творчества
60.	Иланский р-н	Иланские вести	газета иланский вести, http://www.ilansky.ru/index.php			Рейс особого назначения
61.	Иланский р-н	Иланские вести	http://www.ilansk-adm.ru/news/3 газета иланский вести, группа в контакте иланский молодежный центр. http://vk.com/molod_central			История, рассказанная блюдцем
62.	Иланский р-н, Южно-Александровский	Иланские вести	http://www.ilansk-adm.ru/news/3 газета иланский вести	передовая статья новости культуры		Счастлив тот, кто счастлив дома

	сельсовет					
63.	Иланский, д. Черниговка	Иланские вести			нет	Домишко из книжки
64.	Ирбейский р-н	Ирбейская правда	http://ddtirbey.ucoz.ru/news/festival_irbejskaja_zemlja/2012-10-25-103 http://ddtirbey.ucoz.ru/load/konkursy/polozhenie_o_festivale_konkurse_quot_irbejskaja_zemlja_quot/19-1-0-49 http://ddtirbey.ucoz.ru/load/konkursy/festival_nacionallykh_kultur_irbejskaja_zemlja/19-1-0-55	<p>Фестиваль "Ирбейская земля"</p> <p>положение о фестивале Фестиваль "Ирбейская земля"</p> <p>Фестиваль национальных культур «Ирбейская Земля»</p>		Территория дружбы
65.	Казаченский	Новая жизнь		нет		Студия - салон "Объектив"
66.	Казаченский	Новая жизнь	http://kazrcdt.ucoz.ru/index/obrazovatelnyj_modul_2012/0-13	<p>2012 года в рамках грантовой программы Красноярского края</p> <p>«Социальное партнерство во имя развития»</p> <p>№ 1213-017 «Выездной образовательный модуль на территории Казачинского района».</p>		«Мир без конфронтации»
67.	Канск	Канские ведомости	http://kanssk.bezformata.ru/listnews/pamyat-proshlih-let/8264341/ http://www.kvgazeta.ru/latest-news/3903-2012-12-06-13-19-21.html http://www.asdg.ru/sections/gkh/novosti.php?ELEMENT_ID=59835&SECTION_ID=	<p>Память прошлых лет</p> <p>Память прошлых лет 06 Дек. 2012</p> <p>Канск. Четыре социальных проекта получают финансирование в рамках краевой программы</p>	06.12.2012 17:38	Боевая история военной формы

				«Социальное партнерство во имя развития» Версия для печати 02.03.2012		
68.	Канск	Канские ведомости	http://zapad24.ru/news/kansk/8160-v-centre-kanska-poyavilas-alleya-pamyati.html http://krasnoyarsk.er.ru/news/2012/5/29/deputat-posadil-derevyu-na-allee-pamyati/ http://news.rambler.ru/14018154/	В центре Канска появилась «Аллея Памяти» 29 мая 2012, 10:43 Депутат посадил деревья на Аллее памяти В Канске появилась Аллея Памяти KrasPlus.ru 21 мая, 11:59		Аллея памяти – аллея связи поколений
69.	Канский район	Канские ведомости	http://ctt-kansk.ru/index/proekty/0-19 http://www.asdg.ru/sections/gkh/novosti.php?ELEMENT_ID=59835&SECTION_ID=	Социальный проект "Сибирские корабли" 02.03.2012 Канск. Четыре социальных проекта получают финансирование в рамках краевой программы «Социальное партнерство во имя развития»		Сибирские корабли
70.	Канский район, г. Канск	Канские ведомости	http://www.krasrab.com/archive/2012/10/16/08/view_article http://kkbt.ru/index.php/kultpokhod http://kkbt.ru/index.php/kultpokhod/na-perekrestke-chelovecheskikh-sudeb http://kkbt.ru/ www.5kanal.info/index.php/component/content/article/8-novosti/1929-aktsiya-bibliotechnogo-tehnikuma http://www.t-volna.com/component/content/article/412-----1----r.html http://www.ingash-admin.ru/ http://cbsryb7.ru/page/4/ http://www.enisey.tv/tv/15_minut_v_kulturnom_prostranstve/air/19839/index.php?month=12&year=2012&bxajaxid= =	ОТКРЫТИЕ ВЛАДИМИРА ЗАЗУБРИНА Работники краевого библиотечного техникума (Канск), используя экспонаты своего музея, знакомят жителей сибирской глубинки с жизнью и творчеством знаменитого писателя Владимира Яковлевича Зазубрина (1896-1938). Культпоход «Сибирское открытие Владимира Зазубрина» Канск – Тасеево. Культпоход	Иван БЕЛЯКОВ.	Культпоход - Сибирское открытие Владимира Зазубрина

				<p>Библиотечного техникума На перекрестке человеческих судеб!</p> <p>По итогам Интернет-конференции подготовлен альманах «Творческое наследие Владимира Зазубрина глазами молодых сибиряков».</p> <p>Акция библиотечного техникума</p> <p>Категория: Новости Опубликовано 12.10.2012 11:35 Автор: Служба новостей</p> <p>05.03.2012 13:07</p> <p>В этом году на конкурс поступило более одной тысячи заявок из различных территорий Красноярского края. Канск подал 29 заявок, из них экспертной комиссией было одобрено четыре проекта на общую сумму 411 тысяч 660 рублей.</p> <p>8 октября 2012г. в Центральной библиотеке имени</p>	<p>Виктория Олеговна Карпец, Тамара Владимировна Ананьева. Виктория Карпец, преподаватель красноярского краевого библиотечного техникума, руководитель проекта «Культпоход»</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				Н.С.Устиновича побывали с просветительской миссией гости из Красноярского краевого библиотечного техникума. В центральной районной библиотеке прошел «Культпоход «Сибирское открытие Владимира Зазубрина» Автор: admin2 от 24-09-2012, 12:38 "Культпоход" - так называется акция, организованная в Год российской истории студентами и педагогами Краевого библиотечного техникума на востоке края.		
71.	Канский район, г. Канск	Канские ведомости	http://ctt-kansk.ru/index/proekty/0-19 http://www.asdg.ru/sections/gkh/novosti.php?ELEMENT_ID=59835&SECTION_ID=	Социальный проект "Изобретая детство" 02.03.2012 Канск. Четыре социальных проекта получают финансирование в рамках краевой программы «Социальное партнерство во имя развития»		ИЗОБРЕТАЯ ДЕТСТВО
72.	Канский р-н, с.Верх-Амонаш	Канские ведомости			нет	Экологическая экспедиция
73.	Канский , Рудяное	Канские ведомости			нет	Астафьев в памяти живой
74.	Каратузский	Знамя труда	Все новости - Краевая грантовая программа www.kras-grant.ru/news/ В Каратузском районе в рамках реализации проекта «Волшебный ларец» проведен	Рассчитать свои шаги к цели поможет проект		Волшебный ларец

			тематический вечер «Всеу начало отчий дом».			
75.	Кежемский р-н, Кодинск	Советское Приангарье	http://sp-gazeta.ru/socialnoe_samochustvie/raionnye-budni-89/	«Сибирское здоровье»		Сибирское здоровье
76.	Козульский, р.п. Козулька	Авангард	http://kozulka-grad.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1512:2012-10-05-04-04-50&catid=92:2011-09-12-12-28-49&Itemid=621	Поэтическая встреча 05.10.12 03:59		Слово предоставляется детям
77.	Красноярский, с. Беллык	Эхо Турана	СЕМЬЮ СПЛОТИТЬ СУМЕЕТ МУДРОСТЬ КНИГ». Эхо Турана. exoturana.ru/sections/events/lologr.html Проект по организации библиотеки - салона «Почитай-ка», стартовавший в мае, получил ... 2010 Общественно-политическая газета «Эхо Турана» ... ОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ. Эхо Турана. exoturana.ru/news/strokaa.html ... среды для интеллектуального развития детей и их родителей будет создана библиотека - салон «Почитай-ка». Бюджет проекта - 70 тысяч рублей; ...			Почитай - ка
78.	Красноярский, с. Каротуз	Эхо Турана	НАМ НЕ СТРАШЕН КРЕАТИВ, ИЛИ ЧТО ТАКОЕ ... - Эхо Турана exoturana.ru/sections/masterclass/namarpoutaa.html Беллыкская СБФ (В.П. Русалева; Г.М.Овсянникова) получит финансирование из краевого бюджета для реализации проекта «Лето не для скуки!» НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ. Эхо Турана. exoturana.ru/news/strokaa.html Бюджет проекта - 70 тысяч рублей;; Кортузская			Лето не для скуки

*Красноярская региональная общественная организация
«Агентство общественных инициатив»*

			сельская библиотека получила ... двух социальных проектов «Под Росток» и «Лето не для скуки».			
79.	Красноярск		http://newslab.ru/news/187859	В Ленинском районе города появится «Семейный клуб выходного дня»		Городской Семейный Клуб
80.	Красноярск		http://krasko-3.jimdo.com/наши-достижения/талантливые-дети/	Талантливые дети		Особая мода (нестандартная помощь – людям с нестандартными фигурами)
81.	Красноярск		http://krasroller-school.ru/news/prodolzhaet_svoju_rabotu_besplatnaja_roller_shkola/2012-10-08-81 http://krasroller-school.ru/news/besplatnaja_roller_shkola/2012-04-11-50 http://krasroller-school.ru/forum/9-57-1#447 http://relax.ngs24.ru/object/24357/225/	Продолжает свою работу БЕСПЛАТНАЯ РОЛЛЕР ШКОЛА БЕСПЛАТНАЯ РОЛЛЕР ШКОЛА Красноярская роллер школа		Бесплатная Роллер-школа
82.	Красноярск		http://kraisveta.com/open-world/polozhenie-o-festivale-rozhdennyie-ot-solntsa.html http://krskplus.ru/culture/news/461873 http://www.znaem-mozhem.ru/node/2552 http://novosib-vesti.ru/health/1-health/22872-2012-	ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕСТИВАЛЕ "РОЖДЕННЫЕ ОТ СОЛНЦА" В Красноярске прошёл театральный фестиваль «Рождённые от солнца»		Рождённые от солнца

Красноярская региональная общественная организация
«Агентство общественных инициатив»

			<p>03-28-04-06-06.html</p> <p>http://news.rambler.ru/13337802/</p>	<p>Фестиваль самодеятельных театров «Рожденные от солнца» В Красноярске завершился фестиваль Рожденные от солнца</p> <p>В Красноярске завершился фестиваль самодеятельных театров «Рожденные от солнца» TopNews2428 марта, 08:38</p>		
83.	Красноярск		<p>vk.com/club31584079</p>	<p>Студия фитнеса "Энергия жизни" г.Красноярск, тел. 89080177559 23 апр 2012 – Студия фитнеса "Энергия жизни" совместно с "Институтом тактики и безопасности" объявляет набор в группы!!! Все, кто хочет ...</p>		Энергия жизни
84.	Красноярск		<p>http://sibkarate.ru/news/obzory/850-v-krasnoyarske-zavershilsya-chempionat-goroda.html</p>	<p>В Красноярске завершился Чемпионат города Новости » Обзоры (Автор: admin)</p>		Школа волонтеров
85.	Красноярск				нет	Клуб ветеранов войн «Плечом к плечу»
86.	Красноярск				нет	Мастерская добрых дел
87.	Красноярск				нет	Социальная адаптация женщин по их освобождению из мест

						лишения свободы.	
88.	Красноярск					нет	Правовое просвещение мигрантов (организация спецкурса, издание брошюры «Азбука мигранта»)
89.	Красноярск		http://kras-kids.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=21 http://www.invatalant.ru/	<p>праздник 15 сентября "веселое путешествие"</p> <p>С 11 по 19 августа семьи, занимающиеся в Красноярском центре лечебной педагогики, специалисты, волонтеры выехали за город и организовали интегративный летний лагерь «Семейкин остров».</p> <p>С компьютером на ТЫ «Тропой трудоустройства». (проект стартовал 10 января 2012года)</p> <p>Клуб "За гранью"</p>		Семейкин остров	
90.	Красноярск		http://krasobr.admkrsk.ru/doc.asp?id=1075	Команда проекта "Город, в котором я живу"		Город, в котором я живу	
91.	Красноярск					нет	Если только захотеть...
92.	Красноярск		http://vk.com/ff_krsk	«Формула будущего» 2012			Формула

	рск		http://www.formula-future.ru/ http://www.24roil.com/formula-budushego-2012-krasnoyarsk/ http://www.gornovosti.ru/tema/stadion/po-formule-budushchego24438.htm	Красноярск Итоги По формуле будущего		будущего
93.	Красноярск		http://www.krstur.ru/	НОВОСТИ		Школа безопасности и туризма
94.	Красноярск			нет		Наследники Столыпинской реформы в Сибири
95.	Красноярск				нет	Полярная авиация в Приенисейском крае
96.	Красноярск		http://vk.com/rescue_in_the_caves_2012	группа в контакте вся информация по проекту		Общественный спасательный отряд
97.	Красноярск				нет	Наша природа-богатство народа
98.	Красноярск		ww.alta-mira.ru/ergaki_lager/ ww.prodayslona.ru > ... > В России и странах СНГ rgaki-travel.ucoz.ru/index/camp_2010_ergaki...of...sayan/0-2	<i>Ергаки-жемчужина Саян летний лагерь "ергаки - жемчужина саян" - Красноярский край</i> <i>Ергаки - Жемчужина Саян</i>		Ергаки - жемчужина Саян
99.	Красноярск					Спортивная жизнь общества инвалидов

Красноярская региональная общественная организация
«Агентство общественных инициатив»

100.	Красноярск		http://www.24rus.ru/more.php?UID=84129	23.05.2012 15:13 В Красноярске открылась выставка «Синдром добра»		Социальный калейдоскоп
101.	Красноярск				нет	Создание социального предприятия по оказанию адресной помощи одиноким пожилым людям - "Агентства добрых дел"
102.	Красноярск		http://vk.com/event37795297	страничка в контакте Проект "Не оставайся в стороне!"		Не оставайся в стороне!
103.	Красноярск		www.krasmama.ru/news/2744.html www.tvorigora.ru/news/041012 www.tvorigora.ru/news/141012 http://www.tvorigora.ru/news/161012 www.press-line.ru/.../proekt-azbuka-sovremennosti-pomozhet-roditel . .. krasnoyarsk.bezformata.ru/word/azbuka...filosofiya-semi/2028346 veronkalife.blogspot.com/p/blog-page.html ci-kras.ru/multiplikaciya-i-programmirovanie/sobytie/134	<i>Азбука современности. Философия семьи</i> Семейный проект «Азбука современности. Философия семьи» Семейный проект «Азбука современности. Философия семьи» <i>Проект «Азбука современности» поможет родителям найти ...</i> <i>Азбука современности. Философия семьи - Главное ...</i> <i>азбука современности. Философия семьи - ВерОнькины ПОБЕДЫ</i> СКАЗКА «СЕМЕЙНЫЙ ПРОЕКТ «АЗБУКА		Азбука современности. Философия семьи.

**Красноярская региональная общественная организация
«Агентство общественных инициатив»**

				СОВРЕМЕННОСТИ ...		
104.	Красноярск				нет	спортивный клуб "Колизей"
105.	Красноярск		ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=494 www.dosaaf24region.ru/novosti/252----1-r--- -	<u>В Красноярске пройдет открытие «Школы пилотов»</u> <u>Авиационно-спортивный клуб «Летная гвардия» держит курс на ...</u>		Летная гвардия
106.	Красноярск				нет	Молодежная служба социальных работников
107.	Красноярск		24rus.ru/more.php?UID=86581	<u>Бирюсе» встретились лидеры молодежных движений со всего</u>		Клуб дебатов Красноярского Края
108.	Красноярск				нет	podorozhnik.com
109.	Красноярск		http://pr-rosta.info/news/			Развитие практики публичной отчетности общественных организаций Красноярского края
110.	Красноярск		http://www.boguo.ru/rb-topic.php?t=2	"День Плюшкина" Дата проведения: 17 августа 2011	Подведены итоги трёх экологических конкурсов «Зелёного кошелька» для районов и городов	Ресурсосберегающая экологическая

			http://mc-"День Плюшкина" Дата проведения: 17 августа 2011 rodak26.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=183	года	Красноярского края	программа Зелёный кошелёк
111.	Красноярск		www.newslab.ru > Афиша > Представления press.ngs24.ru/event/231277/ http://vk.com/club10026390	Городской уличный театр «Отечество – это...» / Афиша ... Городской уличный театр «Отечество – это...» - Красноярск - НГС Уличный театр в Красноярске/2012: "Отечество - э		Городской уличный театр "Отечество - это..."
112.	Красноярск				нет	Сказочный вернисаж
113.	Красноярск				нет	Ветеран. Семья. Общество
114.	Красноярск		sibsocio.ru/video.html?task=videodirectlink&id=13 www.redyarsk.ru/articles/?sid=129&PHPSESSID. ..	Детский адаптивный конный туризм Адаптивный спорт - Публикации - REDYARSK.RU - Спорт ...		Детский адаптивный конный туризм
115.	Красноярск				нет	Кто, если не я!
116.	Красноярск		krasnoyarsk.bezformata.ru/word/pomogaya-drugim-ti.../2496309/	Помогая другим, ты помогаешь себе - Красноярск - БезФормата.Ру		Помогая другим, ты помогаешь

Красноярская региональная общественная организация
«Агентство общественных инициатив»

			www.24rus.ru/more.php?UID=83911 www.krasrab.net/wordpress/post/45232	<p><u>Общественная организация «Вместе против рака» и Краевой ...</u></p> <p><u>В Красноярске набирают волонтеров в проект против рака ...</u></p>		себе!
117.	Красноярск		krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/mamam-aktciyu.../ www.krsk.aif.ru/society/news/72077 www.krskstate.ru/kdns www.krskstate.ru/society	<p><u>Красноярск Общественное движение "Право на счастье ...</u></p> <p><u>Красноярских детей и их родителей пригласили в «Мастерскую ...</u></p> <p><u>Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав</u> <u>Развитие гражданского общества</u></p>		Право на счастье
118.	Красноярск		http://kraschern.ru/654.html kraschern.ru/613.html kraschern.ru/660.html www.kraschern.ru/	<p>О реализации проекта «У Чернобыльской черты»</p> <p><u>ККО ОИ Союз «Чернобыль» г.Красноярска Краевой Союз ...</u> <u>У Чернобыльской черты - Союз «Чернобыль</u> <u>ККО ОИ Союз «Чернобыль» г.Красноярска Союз «Чернобыль ...</u></p>		У Чернобыльской черты
119.	Красноярск		www.kkkm.ru/guests/events/id-6/ www.kkkm.ru/guests/events/id-14/ krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/obzor...krasnoyarskom.../794501...	<p><u>Культурно образовательный маршрут "Между прошлым и ...</u> <u>Передвижной музей - Красноярский краевой краеведческий музей</u></p>		Между прошлым и будущим Культурно-образователь

Красноярская региональная общественная организация
«Агентство общественных инициатив»

			https://souzmuseum.wordpress.com/год-российской-истории/событ	Красноярск <u>Пульс территории: обзор событий в Красноярском ...</u> <u>События Года российской истории « Блог Союза музеев России</u>		ный маршрут передвижного краеведческого музея, посвященный Году Российской истории.
120.	Красноярск		www.idrenome.ru/magazine.php?id=2012-05/gizn.2	Чтобы ребенок был успешным - RENAME - ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ..		Территория технического творчества подростков – Лаборатория стендового моделизма
121.	Красноярск				нет	Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях и предотвращению несчастных случаев
122.	Красноярск		www.newslab.ru > <u>Афиша</u> > <u>Выставки</u> krskplus.ru/culture/news/492771 krasnoyarsk.rfn.ru/rnews.html?id=4890593 <u>15 минут культурного пространства</u> www.er-tv.ru/tv/15_minut_v_kulturnom_prostranstve/air/? www.acmb.ru > <u>Россия</u> > <u>РФ.Сибирь</u> > <u>Красноярский край</u>	Проспект Мира глазами художников / Афиша Красноярские художники нарисуют исторические здания города .. <u>Красноярский рабочий</u> Юные художники увековечат проспект Мира <u>Красноярская ГТРК / Исторический</u>		Проспект Мира глазами художников

				<u>центр Красноярск «по-новому»</u> <u>покажут ...</u>		
123.	Красноярск				нет	Тепло добрых сердец
124.	Красноярск		gornovosti.ru/tema/starshee.../my-ryadom-my-pomnim29199.htm gornovosti.ru/tema/starshee.../my-pomnim-my-ryadom30173.htm city-news.kts.ru/tema/starshee.../my-ryadom-my-pomnim29199.htm	<u>Мы рядом - мы помним - Городские новости».</u> <u>Мы помним - мы рядом - Городские новости».</u> <u>Мы рядом - мы помним - ГородскиеНовости.РФ</u>		Мы рядом, мы помним!
125.	Красноярск				нет	Язык и слово - сила народа
126.	Красноярск				нет	Мой учебный маршрут -2
127.	Красноярск,				нет	Осень
128.	Красноярск, г. Канск				нет	Семья и библиотечные ресурсы
129.	Красноярск, Зеленогорск				нет	GREENEXT RIM – зеленогорская планета экстрима
130.	Красноярск, Канск, Ачинск, Минусинск		radiovesti.ru/programs/soloviev/25 edyarsk.ru/articles/detail.php?id=4056	<u>Полный контакт — «Вести FM»</u> <u>Полный контакт - Восточные единороства - Публикации ..</u>		Полный контакт

	нск, Красноярск					
131.	Красноярск, Красноярский край		http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/konkurse-moj-skazochnij-kraj/8049052/	<i>Красноярск Приглашаем принять участие в краевом конкурсе</i>		Спортивный край -это я и моя семья
132.	Красноярск, г.		www.centerverba.ru/i/verba-victim.ppt http://centerverba.ru/	[PPT] Кризисный центр «Верба» www.centerverba.ru/i/verba-victim.ppt Формат файлов: Microsoft Powerpoint - Быстрый просмотр Проект профилактики агрессивного и виктимного поведения подростков в ... НКО и «закрытых» образовательных учреждений по профилактике ...] Кризисный центр «Верба»		Профилактика агрессивного и виктимного поведения подростков в закрытых учреждениях
133.	Красноярск, с. Сухобузимское	Сельская жизнь	http://www.mediakrsk.ru/publications/37/2012/09/16/2745.html [DOC] Сухобузимский районный Совет депутатов - Законодательное ... www.sobranie.info/files/2096223407280912-07.doc	ВЕСЕЛЫЙ ХОРОВОД НА КАЗАЧЬЕЙ ЗАСТАВЕ		Казакам и Женсовету по праву создать детскую казачью заставу
134.	Курагинский р-н, Брагино				нет	Здоровое село
135.	Курагинский р-н, с.Кочерг		www.nikava.ru/news/read/kur_museum.html	<i>Курагинский районный краеведческий музей</i>		Музей Горница

136.	ино Курагинский, Кордово		http://school14-kordovo.narod.ru/p61aa1.html	Архив новостей 2011-12 учебного года (II полугодие)		Тропой Астафьева
137.	Курагинский, Кошурниково		http://pu79-kosh.ucoz.ru/index/proekty/0-32	В.П. Астафьев – великое явление в русском искусстве		В.П. Астафьев - великое явление в русском искусстве
138.	Лесосибирск	Заря Енисея	http://www.sobranie.info/newsinfo.php?UID=38767 http://zaren.su/archives/954 http://leslicey.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=257:-1-r&catid=1:2011-03-26-05-20-19&Itemid=56 http://mylesosibirsk.ru/novosti/glavnoe-8212-konkretnye-dela.html	проекты ради конкретных дел Главное — конкретные дела Творческая мастерская «Нас объединяет небо» Главное — конкретные дела		Нас объединяет небо
139.	Манский р-н		http://manaadm.ru/?page_id=10363 http://www.aoikr.ru/index.php/news1/411-molodezhnyj-forum-manskogo-rajona	Молодежный форум Манского района		С компьютером на ты
140.	Манский р-н, с.Шалинское		http://manaadm.ru/?p=21220 http://www.mediakrsk.ru/publications/24/2012/06/28/2318.html http://www.aoikr.ru/index.php/news1/411-molodezhnyj-forum-manskogo-rajona http://mananews.ru/?p=1195	Компьютерный “ликбез” для старшего поколения продолжает свою работу Нарва – территория инициативной молодёжи		Ликбез XXI века

				ЛИКБЕЗ 21 ВЕК»		
141.	Манский р-н, село Нарва		http://manaadm.ru/?page_id=348&page=2 http://www.aoikr.ru/index.php/news1/411-molodezhnyj-forum-manskogo-rajona	Красноярского края “Социальное партнерство во имя развития Проект “Островок радости” Государственная грантовая программа ”		Моя родная Нарва
142.	Манский , п. Нарва					Бухта радости
143.	Манский , с. Нижняя Есауловка		http://manaadm.ru/?p=21274 http://www.aoikr.ru/index.php/news1/411-molodezhnyj-forum-manskogo-rajona	От идей – к воплощению!		Аптека для души
144.	Минусинск	Власть труда			нет	Кто, если не МЫ?
145.	Минусинский р-н	Власть труда			нет	Познавай, путешествуя
146.	Минусинский р-н, село Городок	Власть труда			нет	Музей воспитывает юных
147.	Минусинский р-н, село	Власть труда			нет	Сохранная грамота

148.	Городок Минусинский, Минусинск	Власть труда	vtruda.ru/?mode=article&id=2565	<u>Вера ПОЛЕЖАЕВА: "Хочу, чтобы все ... - Власть труда"</u>		Связанные одной сетью
149.	Минусинский, Минусинск	Власть труда	molodkrsk.ru/areas_work/artparade/nov.../nfanalitika2012.doc	Проект «ЧТОБЫ ПОМНИЛИ» МИНУСИНСКИЙ РАЙОН. 5. Проект «ВЫМПЕЛ – ПРОФИ ... Проект «ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ» МИНУСИНСК. 4. Проект «Д		Плечом к плечу
150.	Минусинский, с. Восточное	Власть труда	http://vtruda.ru/?mode=article&id=2872 http://znamenka1.minusa-edu.ru/saytmuzei/pomnili.html	18 ноя 2012 – Молодежная команда <i>Минусинского района</i> приняла участие в зональном этапе краевого молодежного проекта «Новый фарватер». ... С проектом « <i>Чтобы помнили</i> » в этой номинации выступил ученик 10 класса ... чтобы помнили		Чтобы помнили
151.	Назарово				нет	Добрых рук творенье
152.	Назарово				нет	Говори правильно
153.	Назарово		http://www.nazarovo-online.ru/news/2012/09/24/	В августе началась реализация <i>проектов "Надо жить"</i> ,		Надо жить!
154.	Назарово,		http://zapad24.ru/news/nazarovo/11478-v-nazarovo-otkrylsya-klub-avtorskoy-pesni.html http://www.nazarovo-online.ru/news/2012/09/24/	В Назарово презентовали проект "С песней по жизни" В Назарово открывается профессиональная вокальная студия		С песней по жизни!
155.	Назарово				нет	Комплексна

	ский р-н, Красная Сопка					я спортивная площадка "Шаг навстречу себе"
156.	Нзаровс кий				нет	Как живешь, ветеран?
157.	Нижнеи нгашски й р-н, п.г.т. Нижний Ингаш	Победа	http://www.ingash-admin.ru/	Администрация Нижнеингашского района официальный сайт		Человек пис атель. Земляк.
158.	Нижнеи нгашски й, п. Канифол ьный	Победа	http://www.ingash-admin.ru/	Администрация Нижнеингашского района официальный сайт		Дружба
159.	Новосел овский р-н	Грани		нет		Здравствуйт е, часом братан и сестреница
160.	Норильс к	«Заполярный вестник»		нет		Передвижна я экспозиция музея «Растим патриотов России».
161.	Норильс к	«Заполярный вестник»	http://gazetazp.ru/search http://norilsk-	Проект Участковый от слова участие"		Проект «Участковы й – от слова «участие»
162.	Норильс к	«Заполярный вестник»			нет	Родные истоки
163.	Норильс к	«Заполярный вестник»			нет	Программа работы с проблемным

						и социальным и группами, а именно алко – и/или наркозависимыми с целью их адаптации и реабилитации, вовлечения в сферу творческой, спортивной и социальной активности «Третичная профилактика»
164.	Норильск,	«Заполярный вестник»	http://polarperspective.ru/category/novosti/ http://forum.allnorilsk.ru/index.php?threads/13081/ http://fotoclub-taimyr.ru/2012/05/ceremoniya-nagrazhdeniya-i-otkrytie-vystavki-pobeditelej http://fotoclub-taimyr.ru/2012/09/otkrytyj-brifing-polyarnaya-perspektiva-itogi-i-razvitie http://fotoclub-taimyr.livejournal.com/24976.html http://fotoclub-taimyr.livejournal.com/23698.html	<p>«Global Arctic Awards-2012» Первый открытый фотоконкурс "Полярная перспектива" Церемония награждения и открытие выставки победителей III фотоконкурса "Полярная перспектива".</p> <p>Открытый брифинг “Полярная перспектива итоги и развитие”</p> <p>Объявлены победители третьего открытого фотоконкурса “Полярная перспектива” Стартовал приём заявок на</p>		<p>III открытый фотоконкурс "Полярная перспектива"</p>

Красноярская региональная общественная организация
«Агентство общественных инициатив»

			http://www.photographer.ru/events/contests/5391.htm #.UMYBoqc7pBE	участие в фотоконкурсе "Полярная перспектива" Полярная перспектива		
165.	Норильск, Кайерканы	«Заполярный вестник»	http://gazetazp.ru/2012/125/3/	Позади крутой поворот		Экстремальные виды спорта "Экстремальные путешествия"
166.	Норильск, Галнах	«Заполярный вестник»	http://www.gazetazp.ru/2012/94/6/	На личном примере		Школа вежливости
167.	п. Кедровый	«Десяточка»	http://kraskedr.ru/keдр/index.php?pag	Газета «Десяточка», №2, 3, 4, 5, 5,7,		Рука помощи
168.	п. Кедровый	«Десяточка»	http://kraskedr.ru/keдр/index.php?pag	Газета «Десяточка», №2, 3, 4, 5, 6, 7		Тропинка к здоровью
169.	п. Кедровый	«Десяточка»	http://kraskedr.ru/keдр/index.php?pag	Газета «Десяточка», №2, 3-7		Наш дом - Кедровый
170.	Партизанский р-н, Вершинское-Рыбное	Вместе с вами			нет	Аллея ветеранов
171.	Пировский р-н	Заря	http://cr-domostroy.ru/news/ http://cr-domostroy.ru/ www.myshared.ru/theme/semeynaya-prezentatsiya/2/	Проект «Горница» окончен, но продолжается Фестиваль совместного семейного творчества Презентация: ГРАНТОВАЯ		Площадка совместного семейного творчества "Горница-искусница, горница - кудесница"

Красноярская региональная общественная организация
«Агентство общественных инициатив»

				ПРОГРАММА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ» Создание площадки совместного семейного творчества «Горница – искусниц		
172.	Подтесовский, Подтесово		http://psoh46.ru/index.php/publicnyj-otchjotnyj-doklad	Публичный отчетный доклад		Читайте Астафьева вместе с нами
173.	Рыбинский р-н, п. Урал Рыбинского района Красноярского края		http://cbsryb7.ru/page/6/ http://cbsryb7.ru/2012/08/ http://cbsryb7.ru/meropriyatij/13-zdorove-obraz-zhizni.html	В Урапской библиотеке–филиале №21 прошла презентация книжной выставки «Умелые руки не знают скуки» В Урапской библиотеке–филиале №21 прошла презентация книжной выставки «Умелые руки не знают скуки» Автор: admin2 от 21-08-2012, 16:36 Здоровье – образ жизни		Доброта сердец
174.	Рыбинский р-н, с.Большое Ключи		http://www.press-line.ru/novosti/2012/07/pul-s-territoriy-180712.html http://www.gaz-gv24.narod.ru/apx/29/29-8.htm http://xn-----5cdbacaddfdqua9amhcxri1ciefkjbdd7akii5a4c0wmf.xn--p1ai/news/3	мы одна семья Победа МКОУ "Большеключинская ООШ №4"		Мы одна семья

			http://bbkk4.narod.ru/	МКОУ Большеключинская ООШ №4		
175.	Рыбинский, г. Заозерный		http://rybray.ru/2012/07/17/uvazhaemye-zaozernovcy-i-gosti-nashego-goroda.html http://admzaoz.ru/page/10/	Уважаемые Заозерновцы и гости нашего города! презентация гранта		Как здорово разными быть и дружно в стране одной жить!
176.	Рыбинский, г. Заозерный		http://cbsryb7.ru/rayonnaya-biblioteka.html http://kmmc.ru/forum.asp?id_parent=1686&page2=1&page=4	ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА <u>Захарова Даша, Саянский район.</u> , 20 января 2012 г. 12:54:08		Чистое слово
177.	Саянский р-н, с. Вознесенька	ПРИСАЯНЬЕ - общественно-политическая газета Саянского района	http://prisayanie.ru/?module=news&action=view&id=5769 http://prisayanie.ru/?module=articles&action=view&id=6014	27.04.2012 ВЧЕРА И СЕГОДНЯ ИСТОРИЯ СЕЛА «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГОСТИНЫЕ» С 1 апреля вознесенские школьники приступили к разработке проекта «Национальные гостиные».		Национальные гостиные
178.	Саянский р-н, с. Унер	ПРИСАЯНЬЕ - общественно-политическая газета Саянского района	http://prisayanie.ru/?module=articles&action=view&id=6349&rubric=45	Реализация проекта « Я, 7-Я и моя семья» продолжается		Я, 7-Я и моя семья
179.	Сухобузимский, Миндерла	Сельская жизнь	minderla-ssh.suhobuzimo.ru/ http://minderla-ssh.suhobuzimo.ru/node/320	<u>Миндерлинская средняя общеобразовательная школа ...</u> Путешествие в Овсянку		Сквозь время и годы
180.	Сухобузимский,	Сельская жизнь	http://minderla-ssh.suhobuzimo.ru/frontpage?page=2	19.03.2012 <u>Электронному музею</u>		По праву памяти

	п. Борск			<u>БЫТЬ</u>		
181.	Сухобуз имский, с. Высотин о	Сельская жизнь				Живи,родни к!
182.	Сухобуз имский, Шила	Сельская жизнь				Душа Сибири
183.	Таймырс кий Долгано - Ненецки й муницип альный р-н, г. Дудинка		http://www.ttelegraf.ru/index.php?newsline_read=19963 http://gazetazp.ru/2012/155/7/ http://gazetazp.ru/2012/155/7/ http://dudinka-dk.org/news/gorodskoj_dom_kultury_prinjal_uchastie_v_grantovoj_programme_krasnojarskogo_kraja/2012-03-22-62	<p>Дудинские проекты "Кустук" и "Бараксан" получили краевые гранты 20 Марта 2012, 15:11 Коко Шанель долганского народа Костюмированное шоу космического масштаба прошло в небольшом зале Северного отделения Норильского колледжа искусств на Комсомольской, 10.</p> <p>Главная » 2012 » Март » 22 » Города</p>		Бараксан
184.	Таймырс кий Долгано - Ненецки й муницип альный		http://www.gorod-dudinka.ru/afisha/meropriyatiya/details/10/32	<p>Презентация выставки «Многонациональное созвездие Таймыра» в рамках реализации грантового проекта «Мы разные и мы дружим»</p>		Мы разные, и мы дружим

	р-н, Город Дудинка					
185.	Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный р-н., г. Дудинка			нет		Экстрим - это жизнь
186.	Тасеевский р-н	Сельский труженик	http://adm.taseevo.ru/news/itogi_kraevogo_konkursa_socialnykh_proektov/2012-03-16-120 http://adm.taseevo.ru/news/v_taseevskom_rajone_na_meste_odnogo_iz_srazhenij_grazhdanskoj_vojny_obnaruzheny_ostanki_cheloveka/2012- http://www.tasmolcentr.ru/news/turistsko_kraevedcheskij_klub_poisk/2012-05-02-30	ИТОГИ КРАЕВОГО КОНКУРСА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Туристско-краеведческий клуб "ПОИСК" Тасеевского района идёт по следу истории		Поиск
187.	Туруханский район, п. Туруханск	Маяк Севера		нет		Помоги ближнему
188.	Тюхтетский р-н, село Красинка	Голос Тюхтега	is.park.ru/print_doc.jsp?urn pobeda.krdo.ru/?main=aktiv	<u>Нам есть, чем гордиться, и есть, что беречь (Версия для печати)</u> <u>Активные участники акции «Обелиск - Мы победили!»</u>		Аллея памяти "Три поколения"
189.	Ужурский	Сибирь	www.sib-hleb.ru/index.php?limitstart=210...1...	Сибирский хлебороб		Вечная

	й район, п.Златоруновск	ский хлебопоб				память героям
190.	Ужурский р-н, д. Березовый Лог	Сибирский хлебопоб	http://www.uzhur-city.ru/site/index.php?rowstart=30 http://www.acmb.ru/novosti-russia/siberia/krasnoyarskij-kraj/obelisk-i-dve-memorialnyx-doski-s-imenami-62-voinov-poyavilis-v-centre-uzhurskoj-derevni/ www.rsuzhur.ru/index.php?limitstart=90 www.krskstate.ru > Пресс-центр > Новости	<p>светлой памяти верны...</p> <p>Обелиск и две мемориальных доски с именами 62 воинов появились в центре ужурской деревни</p> <p>Ужурский район - главная В городах и районах - Администрация Красноярского края</p>		Не спеши Преклонись у их бессмертных ног
191.	Ужурский, п. Приреченск	Сибирский хлебопоб	http://sib-hleb.ru	нет		Милосердие
192.	Шарыпово			нет		От творчества - к профессии!
193.	Шарыповский район, г. Шарыпово		http://vk.com/urban_sport_fest http://vk.com/album-38942701_160608588 http://shans.tv/ton-ot-30-iyulya	<p>фотоотчет о фестивале</p> <p>репортаж о фестивале</p>		Молодежный спектр
194.	Шушенский р-н	Ленинская искра	http://xn--3-9sb6ajarn6b.xn--p1ai/	<p>Автор: Ольга Владимировна Чален</p> <p>10.12.2012 03:17</p>		Этнонациональный союз
195.	Шушенский р-н,	Ленинская искра	http://www.shushka.ru/	нет		Наш двор
196.	Шушенск	Ленин	http://www.shushka.ru/	Троица в шушенском		Рука в руке

	кий р-н, п Шушенс кое	ская искра	http://www.shush.ru/index.php http://www.24rus.ru/more.php?UID=84355 http://krasnoyarsk.gs/novosti-krasnoyarska/10469-v-istoriko-etnograficheskom-muzee-zapovednike-shushenskoe-sostoitsya-narodnoe-gulyanie-troica-v-derevne.html http://www.19rus.info/news/80128.html http://krskplus.ru/culture/news/490900 http://krasnoyarsk.gs/novosti-krasnoyarska/10469-v-istoriko-etnograficheskom-muzee-zapovednike-shushenskoe-sostoitsya-narodnoe-gulyanie-troica-v-derevne.html http://forums.drom.ru/hakasiya/t1151795322.html http://www.krasrab.net/wordpress/post/46782 http://www.krasrab.net/wordpress/post/46782	<p>Разгуляться жителям Хакасии можно в Шушенском Праздник Троицы в Шушенском отметят широкими гуляниями</p> <p>Более 10 тысяч человек стали гостями праздника в шушенском</p> <p>Музей-заповедник "Шушенское" - народное гуляние "Троица в деревне"</p>		
197.	Шушенский р-н, с. Казанцево	Ленинская искра	http://kazancevo-school.narod.ru/news.htm www.festival.mggu-sh.ru/modules/get-file.php?id=8202&source ..	5.04.2012 КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ фестиваль школьных проектов		В гостях у Грамотеев
198.	Шушенский р-н, Шушенское	Ленинская искра	http://www.shushka.ru/	нет		Ирбис
199.	Шушенс	Ленин	http://www.shushka.ru/	нет		Любознайка

	кий, п. Иlicheво	ская искра				Летняя библиоплощ адка
200.	Эвенкий ский муницип альный район, п.г.т. Тура		http://www.evenkya.ru/news/memoryproekt.html http://www.evenkya.ru/news/blagkladb.html www.evenkya.ru/news/formoltur.html	<p>В Туре пройдет Форум молодежи. Эвенкийский муниципальный ... 28 ноя 2012 – Столица: поселок Тура ... В Туре пройдет Форум молодежи. С 1 по 3 ... Это будут проекты «Молодая мама», «Студенческий причал», «Цветы для цветов жизни» и «Пусть память вечную хранят и наших внуков внуки». ... край , Эвенкийский муниципальный район, п.г.т. Тура, ул. Советская, 2.</p> <p>«Пусть память вечную хранят и наших внуков внуки»</p> <p>В Туре благоустраивают территорию кладбища</p>		Пусть память вечную хранят
