



**Отчет о проведении мониторинга реализации проектов,
получивших финансирование в рамках краевой
грантовой программы «Социальное партнерство во имя
развития» в 2016 г.**

ООО «Решение»

Красноярск 2016

Оглавление

Введение.....	3
Анализ соответствия расходования средств (в том числе собственных средств) на реализацию проекта	5
Анализ соблюдения графика выполнения работ (мероприятий).....	9
Анализ достижения основных (существенных) результатов реализации проекта	11
Соответствие результатов вложенным средствам.....	11
Востребованность результатов целевой группой	12
Анализ дополнительных (незапланированных) результатов проекта.....	16
Экспертный анализ проектов показал, что практически половина организаторов зафиксировали получение незапланированных результатов, превосходящих их ожидания.	16
Анализ размещения информации в СМИ (включая электронные СМИ)	18
Анализ обстоятельств, повлиявших на некачественную реализацию проекта.....	21
Рекомендации по улучшению Программы	25
Приложение 1.....	27
Приложение 2.....	32
Приложение 3.....	34
Приложение 4.....	55

Введение

Конечной целью деятельности государства является достижение высокого уровня благосостояния общества и создание условий для его дальнейшего развития, а социальная политика имеет самое непосредственное отношение к решению этой задачи. Краевая государственная грантовая программа «Социальное партнерство во имя развития» направлена на выявление и поддержку на конкурсной основе социальных инициатив и проектов некоммерческих организаций, направленных на улучшение качества жизни населения в Красноярском крае.

Данный отчет подготовлен на основании информации, полученной в результате мониторинга реализации проектов, получивших финансирование в рамках краевой грантовой программы «Социальное партнерство во имя развития» (далее – Программа) в 2016 году.

В 2016 году на конкурс было подано 570 заявок, победителями стали 134 проекта. Мониторинг их реализации проводился путем анализа отчетной информации, представленной на сайте www.kras-grant.ru, и информации полученной по итогам очного мониторинга проектов и мониторинга СМИ. Посредством сайта были проанализированы 134 проекта (100%), в очном мониторинге участвовал 41 проект (30%). Мониторинг СМИ проводился по ключевым словам, связанным с Программой и конкретными проектами.

Проведение мониторинга сайта включало в себя проверку своевременности и полноты выполнения работ согласно организационному плану проекта, наблюдение за ходом проекта, проверку своевременности и полноты заполнения грантополучателем отчета в личном кабинете, проверку соотношения заявленных и полученных результатов проекта. По результатам мониторинга сайта был составлен рейтинг реализации проектов, где отдельно оценены завершенные и находящиеся в процессе реализации проекты. Результаты мониторинга сайта представлены в Приложении 1 к данному отчету.

Мониторингу на местах было подвергнуто 30% проектов (в соответствии с техническим заданием) – 41 проект в более чем 20 населенных пунктах Красноярского края. Мониторинг реализации проектов на местах включал в себя выезд в территорию реализации проекта, выборочную или полную проверку документов о ходе мероприятия и соответствие его реализации плану, обозначенному в договоре, проверку фактически выполненных работ, проверку бухгалтерской отчетности, интервью и анкетирование основных участников проекта (организаторы, партнеры, целевые группы – проанализировано более 200 анкет). В мониторинге приняли участие 7 экспертов. Список проектов, участвовавших в мониторинге на местах, и их оценка представлены в Приложении 2.

В мониторинге СМИ участвовали печатные, электронные и телевизионные СМИ г.Красноярска и Красноярского края. Было выявлено более 200 публикаций более чем в 80 СМИ Красноярского края. Итоговая таблица, содержащая все публикации, представлена в Приложении 3.

На основе всех этапов мониторинга был сформирован данный аналитический отчет. Цель этого анализа информации – определение фактических результатов

реализуемых проектов, их соотношение с заявленными целями, а также выявление отклонений от сроков и целей реализации, исследование причин, влияющих на достижение результатов проектов. Также итогом анализа информации, полученной путем мониторинга грантовых проектов, реализованных в рамках Программы, станет шорт-лист успешно реализованных проектов (не менее 25 штук), рекомендованных к тиражированию – Приложение 4.

Анализ соответствия расходования средств (в том числе собственных средств) на реализацию проекта

Одним из основных критериев оценки каждого проекта является бюджет – его соответствие заявленному плану мероприятий, предполагаемым результатам. Умение проектной команды составить сбалансированный бюджет и отработать проект с максимальным соответствием первоначальному плану – это безусловный признак опыта и мастерства.

Согласно результатам анкетирования организаторов проектов изменения в реализации проектов относительно начальных планов претерпели 57% проектов (рис. 1) , но только у 25% проектов эти изменения были финансового плана (рис. 2):

Рис. 1

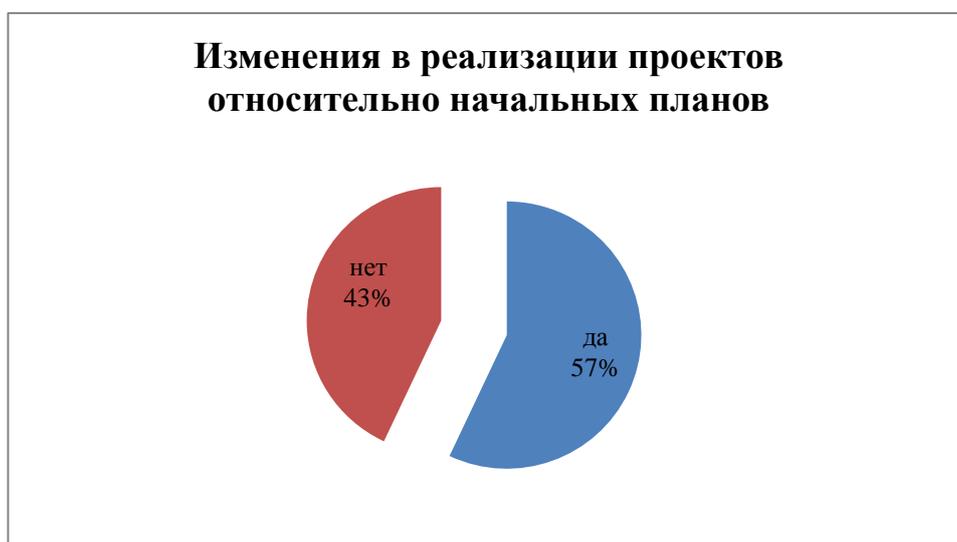


Рис. 2



Основная причина этих изменений, исходя из экспертных отчетов, изменение сроков финансирования проекта, что повлекло за собой изменение графика реализации мероприятий, частичную смену их формата – адаптацию под новые сроки, время года и

т.д. Например, проект «Инклюзивный центр Добро» - из-за задержки финансирования определенная часть мероприятий была проведена за счет средств грантополучателя, средств партнеров, что затрудняет итоговое соответствие бюджету и подготовку финансового отчета. В меньшей степени причина изменений – это перераспределения средств между статьями бюджета (в большинстве случаев это задокументировано официальными письмами), что вызвано либо изменением стоимости позиции (как в большую, так и в меньшую сторону), либо открывшимися при реализации проекта дополнительными обстоятельствами. Например, проект «Психиатрия: наказание или помощь?» - методический буклет был настолько востребован детскими психологами, что было принято решение о выпуске дополнительного тиража.

Большинство проектных команд в ходе реализации проекта дополнительно работают с партнерами и стараются привлечь в проект изначально незапланированные ресурсы, в том числе и финансовые.

Рис. 3




На первом месте расположены оборудование, сувенирная и наградная продукция, а на втором – финансы, что является достаточно высоким показателем и свидетельствует о вовлеченности партнеров в проект. А также о том, что проектные команды не останавливаются на достигнутом и стараются развивать проект в момент его реализации.

Продолжая тему работы с партнерами, что безусловно тесно связано с расходованием средств, так как в части случаев партнеры обеспечивают собственный вклад организации в проект, необходимо отметить вовлеченность партнеров в проект – рис.4 (анализ анкет целевых групп) и эффективность использования партнерского вклада в проект, по мнению самих партнеров рис.5 (анализ партнерских анкет).

Рис. 4




Рис. 5

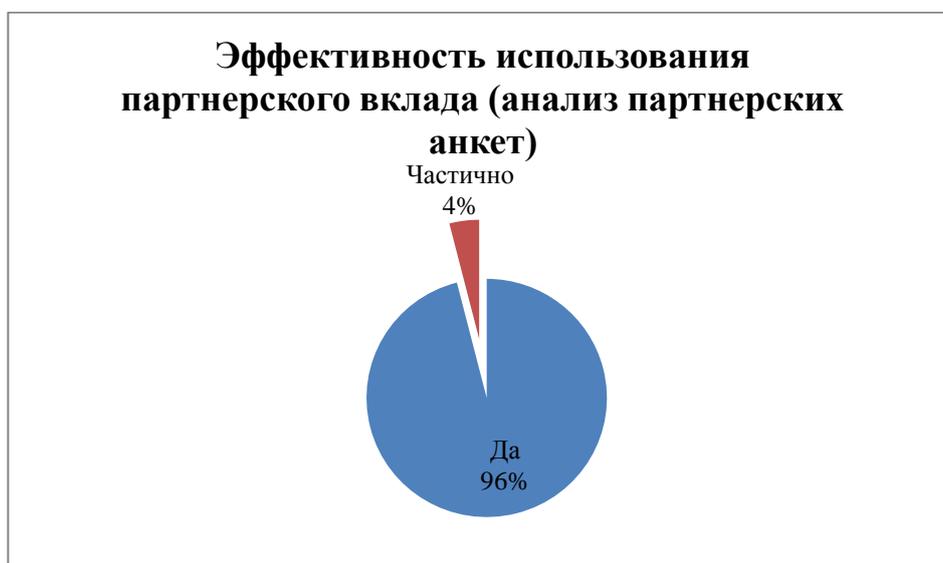

Анализ анкет целевых групп показал, что большинство благополучателей знают партнеров проекта, что говорит об их реальном включении в работу, а не только номинальном предоставлении средств. Именно это, на наш взгляд, определяет высокую оценку партнерами эффективности использования их ресурсов - анализ анкет партнеров показал, что 96% организаций считает сотрудничество эффективным. Это очень высокий показатель, и можно сделать вывод, что проекты имеют перспективу дальнейшего развития за счет использования партнерских ресурсов (что подтверждают и экспертные отчеты).

Однако при этом можно отметить, что только 84% организаторов оценили выполнение партнерских обязательств максимально, а 16% считают, что партнеры выполнили обязательства лишь частично (Рис. 6). Частично с этим связаны изменения графика реализации проектов.

Рис. 6

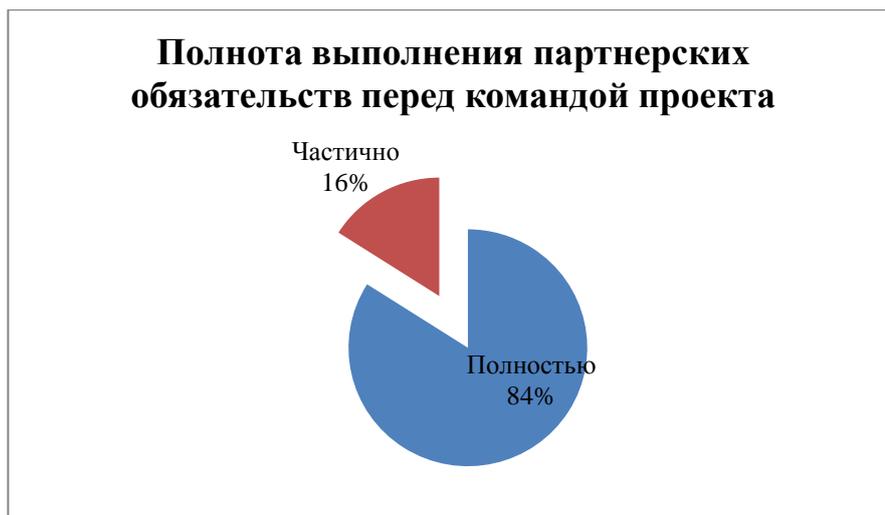

Таким образом, можно сделать вывод, что в 2016 году большая часть проектов была изначально оптимально спланирована и реализована. Проектные команды работали над привлечением дополнительных средств, что обуславливает качественную и полноценную реализацию проектов, расширяет их границы, улучшает результаты.


Анализ соблюдения графика выполнения работ (мероприятий)

Не менее важным при анализе эффективности реализации проекта является его соответствие графику реализации – проведение полного перечня мероприятий в обозначенные сроки.

Соответствие плана проекта и его реализации оценивалось не только с помощью экспертного мониторинга на местах, но и посредством анализа проектных отчетов на сайте www.kras-grant.ru.

Результаты экспертной оценки дают следующую картину (рис.7): 34% проектов претерпели изменения графика в ходе реализации.

Рис. 7

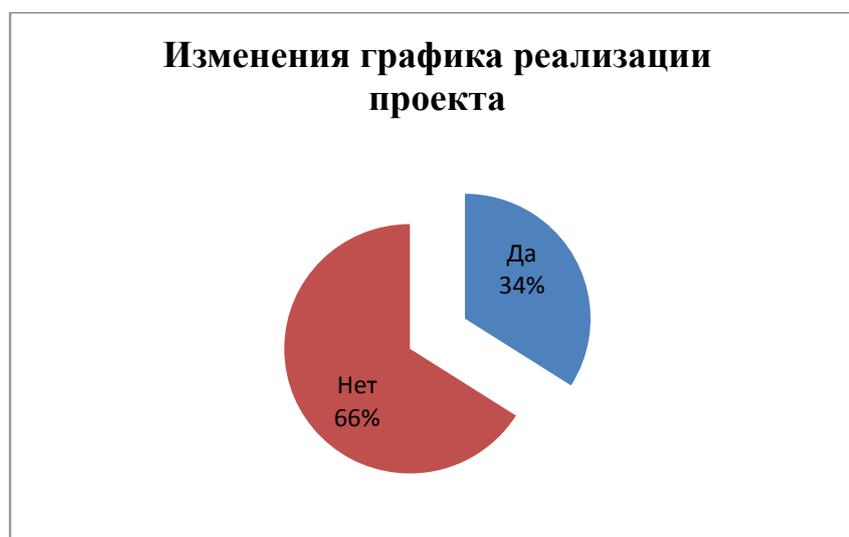

Опираясь на результаты анкетирования можно сделать вывод, что основная причина изменения графика, также как и бюджета, это задержка финансирования.

Также несколько респондентов отметили сложность работы с партнерами (нарушение изначальных обязательств, затяжные согласования). Например, проект «Сад мечты» - согласования с партнерами, представляющими площадку для ландшафтного дизайна затянулись, был упущен вегетативный период высадки растений, что стало причиной изменения графика реализации проекта.

Некоторые респонденты отметили, что причиной изменений стало совпадение с датами других важных мероприятий. Но в этом случае, изменения в сроках были незначительными. Например, проект «Фишинг юниор». Дата одного из сплавов совпала с датой Гражданского форума, в котором команда проекта принимала активное участие.

Анализ проектных отчетов на сайте Программы www.kras-grant.ru проводился по следующим критериям:

- Наличие организационного плана проекта (от 0 до 2 баллов)
- Наличие отчета (от 0 до 2 баллов)
- Качество отчета (от 0 до 3 баллов)

- Качество проведенных мероприятий (от 0 до 3 баллов).

По результатам этого анализа был составлен рейтинг проектов (завершенные и текущие проекты), где были выделены 3 группы проектов:

1. Проекты, полностью достигнувшие заявленных целей и результатов (8-10 баллов) – 77% проектов. Это проекты, у которых могли быть частичные отклонения в графике, которые не отразились на качестве мероприятий и не повлияли на реализацию проектов в целом.

2. Проекты, частично достигнувшие результатов (5-7 баллов) – 13% проектов. Это проекты, которые были реализованы лишь частично и не достигли заявленных показателей ни количественно, ни качественно.

3. Проекты с проблемной реализацией (0-4 балла) – 10% проектов. Это проекты, которые не были реализованы, либо реализованы в очень малой степени.

Стоит отметить, что при экспертном мониторинге была выявлена ситуация, когда некачественный отчет на сайте или его отсутствие вовсе не означает провал реализации проекта. Например, проект «Памп-трек» довольно скудно представлен на сайте Программы и получил оценку 6 баллов по результатам мониторинга сайта. Но экспертный мониторинг Пашенных Т.М. показал, что проект реализован очень качественно, запланированные результаты не только достигнуты, но и значительно превышены. Проект был рекомендован экспертом к тиражированию, а неполноценный отчет на сайте объяснен сильной занятостью проектной команды.

Также «слабость» отчетов обусловлена недостаточной компьютерной подготовкой некоторых команд. Эта ситуация чаще всего встречается в отдаленных районах, малых селах, где проектные команды используют для подачи заявки общественные организации, которые не состоят в руководстве проекта и не готовы его полностью сопровождать, а сама проектная команда не обладает навыками, необходимыми для свободной работы в сети интернет.

При мониторинге отчетности на сайте также выявлена ситуация, когда команды до последнего (а именно до самого завершения проекта) тянут с размещением отчетности на сайте, ссылаясь на личные обстоятельства, занятость и т.д. При общении с этими грантополучателями эксперты дистанционного мониторинга сделали вывод, что отчетам на сайте не придается большая значимость в глазах грантополучателей. А основную отчетную функцию они возлагают на бумажные финансовые и аналитические отчеты, которые сдаются непосредственно кураторам Программы.


Анализ достижения основных (существенных) результатов реализации проекта

Соответствие результатов вложенным средствам

Достижение заявленных результатов – это еще один критерий успешности реализации проектов. В ходе экспертного мониторинга экспертам предлагалось оценить, насколько результаты проекта соответствуют его бюджету и возможна ли была оптимизация средств в рамках каждого конкретного проекта.

Анализ отчетов экспертов показал следующую ситуацию (рис. 8)

Рис. 8

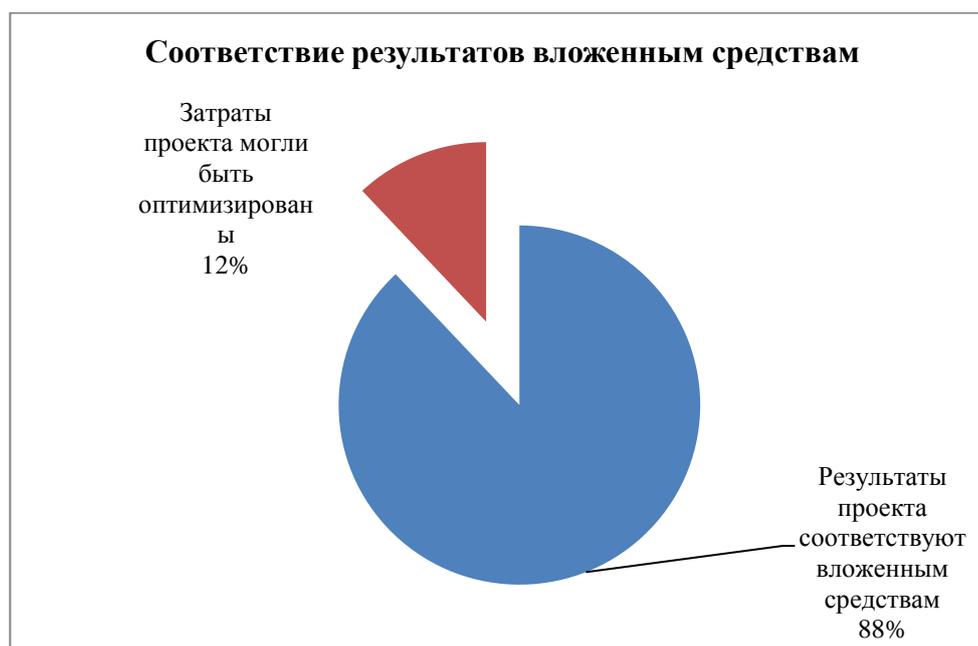

В целом можно сказать, что расходы по проектам спланированы сбалансировано с результатами. Часть проектов, которым была рекомендована оптимизация затрат, являются проблемными проектами в принципе. Например, проект «Казачья застава» - экспертный мониторинг установил, что при реализации проекта были грубые нарушения графика и концепции мероприятий, часть мероприятий в принципе не была проведена, а основной целью реализации проекта, судя по итогам, стало приобретение грантополучателем туристического оборудования. Проект «Организация спортплощадки ГТО в г.Дудинка» также мог быть существенно оптимизирован по мнению эксперта и имеет значительные проблемы с реализацией – грантополучатель сделал строительство площадки ГТО главной целью, при этом не обращая значительного внимания на реализацию запланированных мероприятий. Кроме того, место строительства площадки ставит под вопрос ее целесообразность, так как это заброшенная окраина города.

Однако некоторые проекты «перестарались» при составлении сметы проекта и позиции из нее остались невостребованными. Например, проект «Мой русский язык». На момент экспертного мониторинга проект был полностью выполнен, но покупка компьютера, заложенного в смету, все еще не состоялась. Из чего можно сделать вывод,

что компьютер не потребовался при реализации проекта и смета могла быть оптимизирована.

Также важным показателем оправданного вложения средств является актуальность и результативность проекта собственно для грантополучателя. На диаграмме на рисунке 9 представлены данные о выгоде грантополучателей от реализации проектов:

Рис. 9



Как видно из диаграммы, 82% грантополучателей отметили как результат улучшение материальной базы, что свидетельствует об усилении позиции организации, ее развитии. Как правило, приобретенное оборудование используется в самостоятельном продолжении проектов, их дальнейшем функционировании и развитии. Это особо актуально для малых грантов, на которые претендуют, в основном, отдаленные и малые села – это оборудование сельских библиотек и школ, создание в них развивающих и игровых зон, которые на многие годы становятся культурной и рекреационной площадкой для жителей.

Также не менее важно для грантополучателей привлечение новых партнеров и увеличение собственной известности – это позволяет им использовать дополнительные ресурсы, выходить на новый уровень и реализовывать более масштабные проекты.

Также важно привлечение внимание власти и административных структур к решаемой проблеме. Например, проект «Инклюзивная молекула». Именно активная реализация гранта и работа грантополучателя помогла не только создать ресурсные классы для детей с РАС в обычных школах, но и добиться выделения дополнительных ставок для тьюторов, сопровождающих обучение этих детей.

Востребованность результатов целевой группой

Востребованность проекта целевой аудиторией определялась экспертами через анкетирование исполнителей проекта, его целевых групп и партнеров. На рисунках 10 и 11 представлены результаты анкетирования исполнителей проекта и целевой аудитории.

Им предлагалось ответить на один и тот же вопрос – какую пользу целевые группы получили от реализации проекта:

Рис. 10



Рис. 11



На рисунках видно, что организаторы считают приоритетной пользой для целевых групп социализацию, приобретение новых навыков, новые знакомства и информационную поддержку (1,2 и 3 места соответственно), в то время как целевые группы выделили приобретение новых навыков и знакомств и личностный рост. Социализация лишь на 4 месте. Но, не смотря на расхождение результатов в оценке полезности проектов, можно

сделать однозначный вывод о социальном характере получаемых благ – все они направлены на поддержку людей, решение их проблем и формирование социальных услуг. И все проекты востребованы целевой аудиторией – в анкетах каждый участник проекта, как правило, отмечал несколько «благ», полученных им в результате проекта.

На рисунке 12 представлено процентное соотношение основных благополучателей проектов 2016 года.


Рис. 12



По позиции партнеров в 2016 году зафиксированы рекордные показатели – 98% партнеров считают, что реализованные проекты были полезны целевой аудитории! Это также свидетельствует о том, что в будущем взаимодействие партнеров и команды проекта позволит выводить его на новый уровень и реализовывать независимо от грантовой поддержки.

Если же судить о достижениях результатов проектов в принципе, то анализ анкет экспертов говорит о следующих результатах:

Рис.13

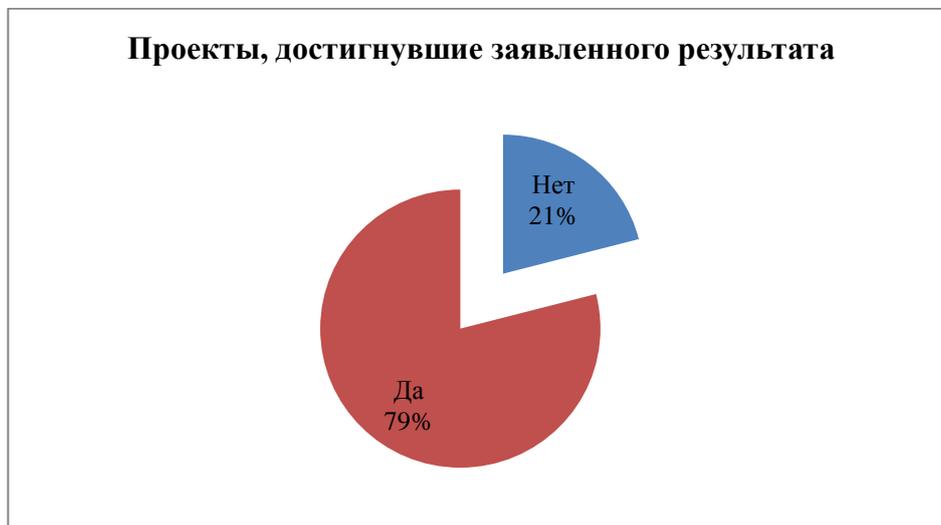


По мнению эксперта, 79% проектов достигли запланированных результатов. В результате оценки результативности проектов был сформирован рейтинг успешности реализации проектов, где проранжированы все проекты, подвергнутые очному мониторингу (Приложение 4).

Стоит отметить, что в 21% входят с частичным достижением результатов – это проекты с отсроченным финансированием. Полностью нереализованными экспертами были признаны проекты «Казачья застава» (Ильин В.В.) и «Надежда» (Пашенных Т.М.). Организаторы проекта «Надежда» изначально отказались от очного мониторинга и встречи с экспертом, позже попытались предоставить документацию дистанционно, но так и не смогли сформировать отчет о реализации проекта.

Анализ дополнительных (незапланированных) результатов проекта


Экспертный анализ проектов показал, что практически половина организаторов зафиксировали получение незапланированных результатов, превосходящих их ожидания.

Рис. 14

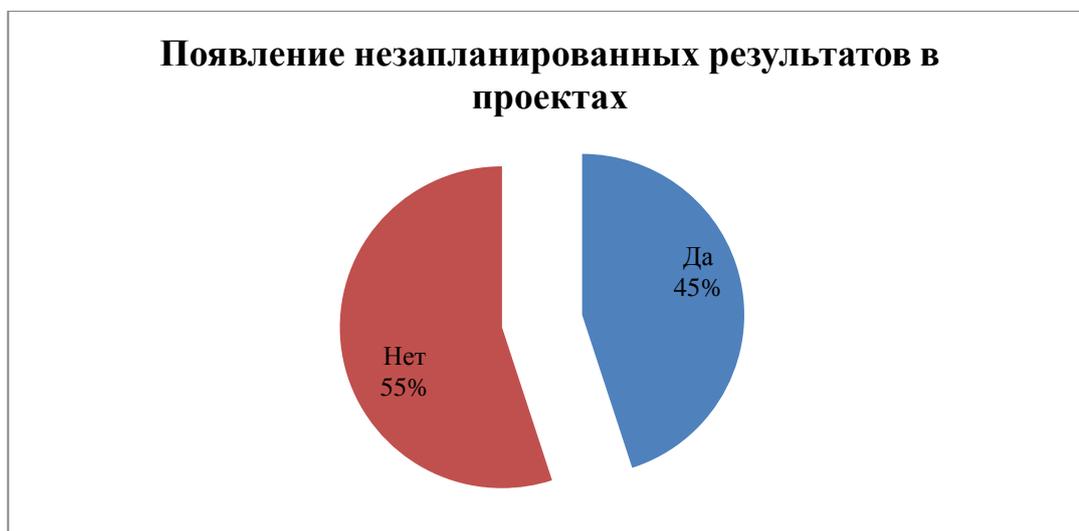

Безусловно, эти изменения носили положительный характер. Характер распределения дополнительных результатов представлен на рисунке 15.

Рис. 15

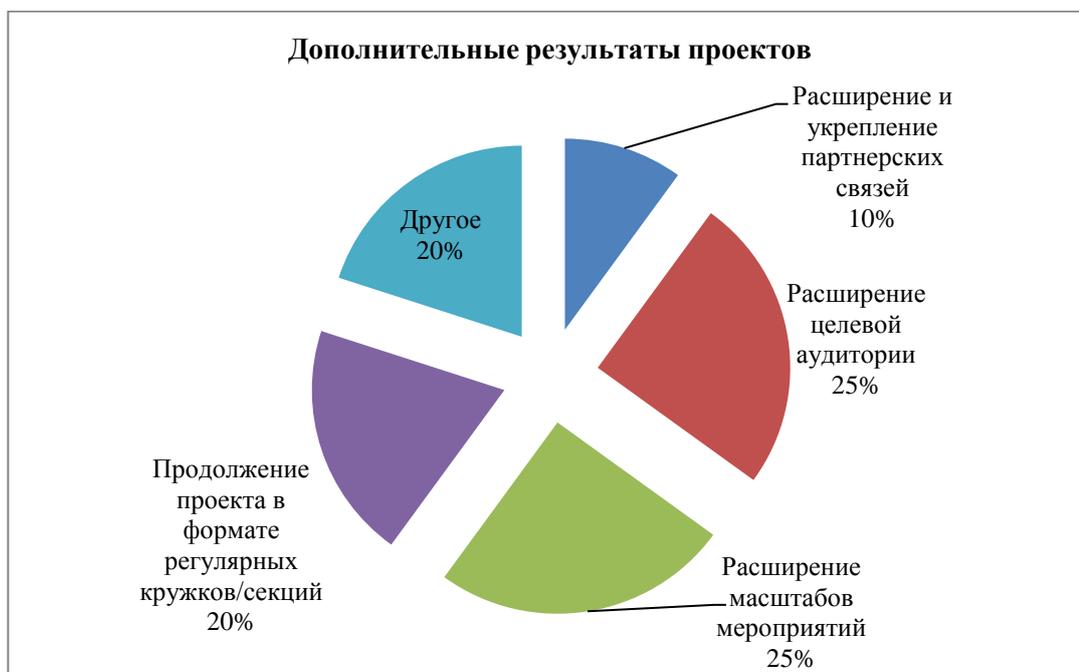

В большинстве случаев дополнительные результаты были связаны с расширением масштабов проекта – увеличение целевой аудитории, проведение дополнительных

мероприятий, организация своих мероприятий в рамках общегородских, что существенно увеличивало охват аудитории. Например, проект «Одна команда – одна мечта». В рамках его реализации была сформирована сборная Красноярского края по адаптивному конному спорту, которая триумфально выступила на межрегиональных соревнованиях СФО и заняла несколько призовых мест. Участникам проекта было принято решение организовать дополнительное мероприятие – вечер благодарности тренерам, на котором каждый спортсмен творческим образом говорил «спасибо» своему руководителю.

По части проектов незапланированными результатами стало их продолжение в постоянном формате. Например, итогом осуществления проекта «Путешествие к истокам» стало театральная группа и фольклорная группа «Петрушка», которые продолжили свое функционирование на базе моторской сельской библиотеки после завершения проекта.

Результаты части проектов были признаны в рамках тематических конкурсов. Например, пластилиновый мультфильм, выполненный в проекте «Васюткина мастерская» стал лауреатом нескольких конкурсов и медиафестивалей.

Часть организаторов отметила в качестве дополнительных результатов укрепление существующих партнерских отношений организации и появление новых партнеров. Эти результаты можно рассматривать как косвенно влияющие на целевую группу, так как укрепление партнерских связей позволит качественнее и масштабнее реализовывать продолжение проектов.

В целом можно сделать вывод, что организаторы проектов работают на перспективу, не останавливаются на достигнутых результатах. Однако, что касается целевой аудитории и других количественных показателей, нельзя однозначно заявить, что подобные результаты не запланированы, так как при написании заявки большинство организаторов страхует и указывает показатели по нижней планке.

Анализ размещения информации в СМИ (включая электронные СМИ)


Экспертный анализ информирования целевых групп о проекте показал, что всего лишь 9% респондентов узнали о проекте через СМИ (рисунок 16). Большинство же участников проекта получили приглашение от организаций, связанных с профилем проекта (библиотеки, социальные и кризисные центры, учебные заведения и т.д.) и от знакомых.

Рис.16



Однако это не говорит о том, что организаторы проекта не ведут работу со средствами массовой информации. В результате мониторинга СМИ по ключевым словам Программы и проектов за 2016 год было выявлено 217 публикаций в СМИ Красноярска и Красноярского края. В этих публикациях отражены реализация и результаты проектов Программы (в статистику не включены сайты муниципальных образований, Программы, социальные сети и видеохостинги, так как они не являются официально зарегистрированными СМИ). На рисунке 17 представлено распределение публикаций по печатным, радио, телевизионным и электронным СМИ.

Рис. 17

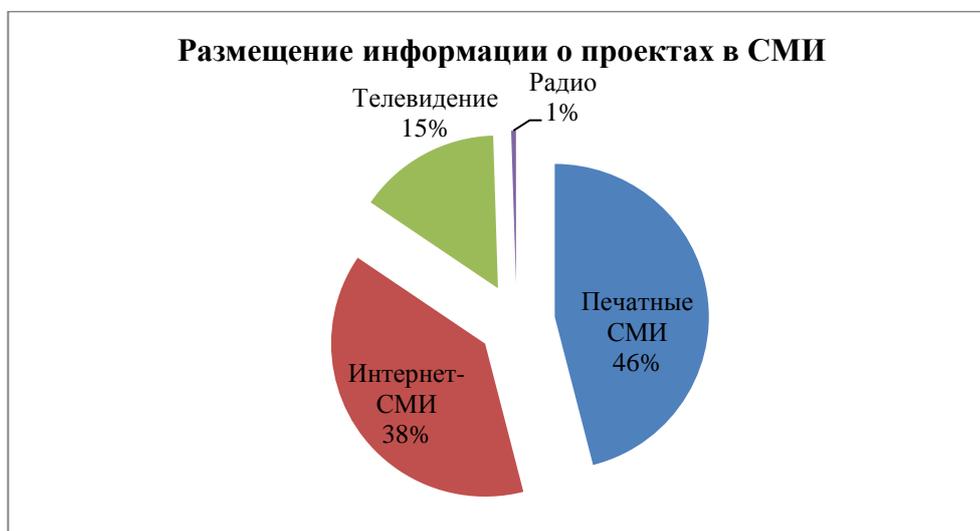

Сами же организаторы используют несколько каналов, для размещения информации о своих проектах. На рисунке 18 отражены результаты экспертного анализа анкет руководителей проектов.

Рис. 18



Самый популярный канал распространения информации – интернет. И это не только электронные СМИ. Это сайты муниципальных образований, сайты организаций заявителей, партнеров, социальные сети (преимущественно Вконтакте и Одноклассники). Организаторы стараются отражать ключевые этапы своих мероприятий в пресс-релизах и постах в социальных сетях. Социальные сети особенно востребованы в проектах для молодежи и школьников, так как дают возможность оперативно получать обратную связь и распространять информацию.

57% респондентов тесно сотрудничают с печатными СМИ. Краевые и городские издания, СМИ муниципальных образований охотно размещают информацию о социальных проектах. 39% организаторов привлекают краевое и местное телевидение к освещению своих проектов, 7% радио.

Отдельно хочется отметить Боготольский район – слаженная работа проектных команд, их кураторов и СМИ находит отражение в газетах «Боготол24» и «Земля боготольская». Абсолютно обратная ситуация в Иланском районе – муниципальная газета, по словам проектных организаций, практически не идет на сотрудничество на партнерской основе.

На втором месте у организаторов стоит адресная работа с аудиторией, что подтверждается и ответами аудитории – большинство участников в проект пригласили профильные организации и организаторы. На третьем – административный ресурс. Особенно популярен этот метод в малых населенных пунктах.

В целом, анализируя распространение информации о проекте, можно сказать, что СМИ занимают ведущую роль в этом процессе. Это можно оценить и по проектным заявкам команд – большинство прописывают работу со СМИ. Однако эксперты столкнулись с тем, что у проектных организаций нет четкого представления о том, что СМИ являются только официально зарегистрированные ресурсы, к которым не относятся социальные сети и сайты муниципальных образований. Поэтому при анализе достигнутых результатов организаторам было рекомендовано разделять эти понятия.

Анализ обстоятельств, повлиявших на некачественную реализацию проекта

Экспертный мониторинг проектов позволил не только полноценно оценить реализацию проектов, но и выявить причины, которые повлияли на некачественное выполнение грантополучателями своих обязательств. Причины, выделенные экспертами, относятся не только к проблемным проектам, но и к трудностям, возникшим у организаторов в целом, что повлекло снижение баллов за реализацию проекта.

1. Недостаточная проработка проекта. Этот пункт включает в себя и недостаточный анализ рисков, например, невозможность преодолеть закрытость целевой группы в проекте «Психиатрия: наказание или помощь?», несбалансированно спланированный бюджет, например, неиспользованные позиции в смете проекта «Здесь родины моей начало», «раздутый» график мероприятий, например, проект «Строительство спортплощадки ГТО в г.Дудинка», где организаторы посчитали самоцелью именно строительство площадки, а проведению запланированных мероприятий не уделили должного внимания и т.д.

2. Отсутствие организованной команды. В проектной команде нет четкого разделения ролей, отсутствует субординация, вследствие чего страдает и реализация проекта – мероприятия проходят с нарушением срока, отчетность и бухгалтерия разрознены и неинформативны. Например, проект Инклюзивный центр Добро, где, несмотря на успешную реализацию проекта, отсутствует полноценная бухгалтерская отчетность и отчетность по мероприятиям, часть изменений не согласована с грантодателем и т.д. В части проектов руководитель старается взять на себя максимальное количество ролей, являясь при этом и руководителем организации. Результатом тотальной занятости становится нарушение сроков заключения договора, сроков финансирования и проблема с реализацией проекта. Например, проект «Великая страна - великий и могучий русский язык», где на момент мониторинга (27.11.16) даже не был заключен договор, так как руководитель проектной группы по совместительству директор школы и занята на основной работе.

3. Отсутствие четких отношений с партнерами. Реализация части проектов напрямую зависит от партнерских организаций. В случае, когда эти отношения никак не фиксированы документально (нет договора о сотрудничестве, писем поддержки, гарантийных писем), может возникнуть проблема с использованием партнерского ресурса. Например, проект «Надежда», когда партнер продал здание, отремонтированное на грантовые средства, полностью сорвав тем самым реализацию проекта.

4. Несвоевременное финансирование. Задержка получения грантовых средств часто является преградой для полноценной реализации проекта – меняются сроки мероприятий, перекраивается бюджет, усложняется итоговая отчетность по проекту. Например, проект «Орловские лица войны», который был практически полностью выполнен на собственные средства грантополучателя, но часть работ (реконструкция могил ветеранов ВОВ) была перенесена на весну.

5. Форс-мажор. Стечение обстоятельств, которые влекут за собой отсутствие финансирования и нарушение реализации проекта. Например, смерть руководителя

организации-заявителя в проекте «кувшин с трещинкой» и невозможность заключить договор.

6. Несовпадение грантополучателя и реальных исполнителей проекта. Это проблема актуальна для небольших грантовых проектов, проектов с периферии. Сельские библиотеки, организации ветеранов и т.д. не имеют права участвовать в грантовом конкурсе и подбирают себе организацию-партнера, которая выступает заявителем. При этом заявитель не заинтересован в реализации проекта и у исполнителя возникают проблемы при заключении договора, перечислении средств, предоставлении финансового отчета. Например, блокировка счета организации-заявителя проекта «Здесь родины моей начало».

7. Умышленное нарушение графика проекта. Срыв проектной командой реализации проекта без объяснения причин. Например, проект «Казачья застава». Из полного списка мероприятий частично выполнено только одно, по остальным мероприятиям работа не велась, отчеты отсутствуют. Бухгалтерская информация не предоставлена, движение по счету не соответствует датам запланированных мероприятий. Комментарий эксперта Ильина В.В.: *«Судя по всему, основной целью авторов проекта было укрепление материально технической базы организации за счет грантовых средств, а именно, приобретение туристического снаряжения и оборудования».*

8. Слабая проектная подготовка исполнителей проекта. Этот пункт относится, по большей части, к малым селам и отдаленным населенным пунктам, жители которых не имеют свободного доступа к проектным семинарам, в интернет и т.д. У них, как правило, возникают сложности при работе с сайтом, сложности с размещением и оформлением отчетности, подготовкой и подписанием документов.

9. Сложности во взаимодействии с координаторами проектов от органов МСУ. Невозможность оперативного получения методической поддержки и консультаций ведет к нарушению графику отчетности, сложностям при заключении договоров, дополнительных соглашениях.

Несмотря на наличие этих обстоятельств, большая часть проектов признана экспертами успешно реализованной. Оценка проектов в балах представлена в Приложении 2.

Отдельно эксперты выделяли наиболее качественные, инновационные проекты, которые необходимо тиражировать и развивать. Эти проекты будут включены в реестр лучших проектов по итогам 2016 года.

Проект «Памп-трек» г. Зеленогорск (Красноярская общественная организация поддержки молодежных инициатив «Сила Притяжения»). *Отлично!!! Герои!!! Выполнить такой объём работ- просто невероятные парни! Подобные проекты заслуживают всяческой поддержки, т.к. они не только позволяют ребятам организовать свой досуг, но и прививают интерес и любовь к труду, развивают навыки работы в команде, выявляют лидерские качества. И повышают ответственность за свои слова и заявленные планы.*

Проект «Фишинг юниор» (местная молодежная общественная организация свободного творчества Манского района «Манский меридиан»). *Прекрасный проект выполнен замечательной командой энтузиастов специалистов муниципального*

бюджетного учреждения дополнительного образования «Районный дом детского творчества Манского района». Заявитель проекта ММОО свободного творчества Манского района «Манский меридиан». Содружество позитивное. Потенциал очень большой! Подобные проекты заслуживают всяческой поддержки, особенно в сельской местности. Для команды и волонтеров: повышают ответственность за свои слова и заявленные планы, развивают инициативу и позволяют реализовать собственные творческие способности.

Эстафета милосердия (Красноярская городская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов). Проект реализован на все 100% - от стоящей идеи до грамотного воплощения. Он актуален не только для существующих целевых групп, но и на перспективу – для потомков, для будущих медиков, так как, к сожалению, ветеранов военной медицины ВОВ с каждым днем все меньше, все меньше тех, кто работал под их началом и нес в систему идею милосердия и взаимопомощи. В наши дни, когда отношение к отрасли медицины становится все более противоречивым, важно развивать связь с истоками.

Здравствуй, Норильчонок! (Местная общественная организация «Центр милосердия города Норильска»). В ходе проекта выяснилось, что у большинства участниц- молодых мам роды прошли с меньшей степенью тревожности. Есть случаи отказа от прерывания беременности, такие пациентки наблюдались и поддерживались особенно. Участницами проекта также стали молодые женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации, решившие одни воспитывать ребенка. В личной беседе молодая мама (сама сирота) рассказала, что поддержка организаторов проекта помогла ей сделать правильный выбор, и в результате ее молодой человек признал свое отцовство. У матери и ребенка появилась надежда на приобретение семейного счастья.

Молодой мастер (Некоммерческое партнерство «Красноярский исследовательский центр»). В современных реалиях проект остро актуален – профориентация школьников не всегда учитывает потребности рынка труда именно в Красноярском крае. А подобные проекты одновременно решают несколько задач – решение социальных проблем незащищенных слоев населения (малоимущие, ветераны, пенсионеры) и грамотная работа со школьниками, помощь в выборе специальности, профессиональные пробы и профессиональная практика для студентов учреждений СПО.

Мое Отчество: информационный центр по туризму (Территориальная профсоюзная организация г. Железногорска). Проект реализован даже в большей мере, чем планировалось! Разработаны и подготовлены интерактивные познавательные и развивающие игры для виртуальных и игровых путешествий по России (Моё Отечество-чудеса России). Супер-интересная (!) форма «печа-куча»: технология кратких публичных выступлений. Для лучших презентаций были организованы публичные выступления (6 минут). Результаты игры оформлены в красочные альбомы. Игра настолько понравилась, что в школах города продолжается до настоящего времени, хотя проект окончен ещё в июне. Игру в настоящее время проводят волонтеры. Т.е. технология очень удачная и успешная и заслуживает тиражирования.

Также эксперты и организаторы проекта выделяли социальные услуги, которые формировались в процессе реализации проекта.

Рис. 19



Рисунок 19 наглядно демонстрирует, что большинство проектов направлены на работу с социально незащищенными группами населения, их адаптацию и социализацию. Очень важно продолжать работу с этими группами, создавать благоприятные условия для реализации социальных проектов и развивать общественные инициативы на местах.

Рекомендации по улучшению Программы

Список рекомендаций составлен на основе пожеланий проектных команд, выясненных в ходе экспертного мониторинга, и мониторинга посредством сайта (при общении с заявителями, испытывающими проблемы).

1. Проведение обучающего семинара при заключении договора, на котором будут освещены вопросы подготовки и оформления отчетности, так как практика показывает что договор, подписанный при получении гранта, не читается и, соответственно, не выполняется (сроки, формат отчетов и т.д.).

2. Усиление текущего контроля и методической помощи со стороны Агентства молодежной политики и программ общественного развития. Общение с грантополучателями выявило острый недостаток координации со стороны Агентства. Это сказалось на оформлении отчетной документации и на реализации проектов в целом (проекты с 0 результатом).

3. Посещение сотрудниками Агентства молодежной политики и программ общественного развития значимых мероприятий проектов, так как это позволит сформировать представление о реализации проекта, а для проектных команд поднимет статус их мероприятий, привлечет дополнительное внимание СМИ.

4. Усиление информационной поддержки проектов. Почти каждый проект содержит такой показатель эффективности как публикации в СМИ, однако, по причине отсутствия в структуре проектной команды специалистов в сфере PR и связям со СМИ, данное направление реализуется не в полном объеме. Как следствие, охват проекта становится ниже, информация о деятельности НКО не получает широкого освещения.

5. Акцентирование внимания грантополучателей, на размещение информации в СМИ, печатных материалов (брошюры, листовки) с пометкой о Программе.

6. Проведение дополнительных проектных семинаров в отдаленных районах Красноярского края. Обучать команды проектной грамотности (оформление заявок, предоставление отчетности), обучение формированию команды проекта, распределению ролей, так как многие команды демонстрируют низкий уровень организационной культуры.

7. Проведение установочных семинаров по работе с сайтом www.kras-grant.ru – работа в личном кабинете, техническое и содержательное оформление отчетов). Возможно организация таких семинаров по записи, так как проблемы возникают преимущественно в отдаленных населенных пунктах и у людей старшего возраста.

8. Сделать особые условия для малых сел (с населением до тысячи человек) и разрешить участвовать в конкурсе проектов краевой грантовой программы сельским библиотекам, домам культуры и школам. Им не всегда легко находить организацию-заявителя проекта.

9. Рекомендовать руководителям учреждений не выступать руководителями проектов в тех случаях, когда перед ними стоят сложные задачи, связанные с жизнеобеспечением работы учреждения.

10. Создание на территориях Фонда местных сообществ, который бы обеспечил качественное сопровождение проектной социально ценной деятельности (например, в Балахтинском районе).

11. У экспертов вызывают сомнения качество и результат проектов, в которых грантополучателем является АНО, а исполнителем Учреждение, где руководителем и того и другого является один человек. Есть плюсы в части взаимовыручки, и все же - целевое использование финансов сомнительно.

12. Изменение сроков мониторинга. Само понятие мониторинг подразумевает постоянное наблюдение за какими-либо процессами для оценки их состояния и прогнозов развития. Для большей его эффективности следует проводить экспертизу не в ноябре-декабре, а в течение года. Фронтальная экспертиза проекта в конце его реализации не позволяет указать проектным командам на риск допущения ошибок, а так же пресечь риск неэффективного расходования бюджетных средств. При организации мониторинга следует планировать обязательное участие эксперта в стартовом мероприятии проекта (чаще всего это обучение проектной команды или организационные семинары) и посещение наиболее массового и финансовоемкого события проекта. Для продолжительных проектов целесообразно устраивать промежуточный аудит проекта.

Приложение 1

Результаты мониторинга проектов посредством сайта www.kras-grant.ru.

Завершенные проекты						
Название	Пункт 1	Пункт 2	Пункт 3	Пункт 4	Итого	Завершен да/нет
Успешные проекты с полным достижением результатов						
Васюткина мастерская	2	2	3	3	10	да
Встреча через 20 лет	2	2	3	3	10	да
Второе дыхание	2	2	3	3	10	да
Дежурный дедушка	2	2	3	3	10	да
Делай добро - добром вернется	2	2	3	3	10	да
Дети одного солнца	2	2	3	3	10	да
Добровольческий отряд "Мы против сквернословия"	2	2	3	3	10	да
Дорогие мои старики	2	2	3	3	10	да
Зеленый патруль	2	2	3	3	10	да
Знайки	2	2	3	3	10	да
Игра на равных	2	2	3	3	10	да
Клево	2	2	3	3	10	да
Красноярск раскинул улицы	2	2	3	3	10	да
Красноярский вклад в победу над фашизмом в ВОВ	2	2	3	3	10	да
Литературный театр "Малышок"	2	2	3	3	10	да
Мобильная библиотека под зонтиком «Чудо»: читаем, удивляемся, делаем открытия	2	2	3	3	10	да
Моё отечество:информационный центр по туризму	2	2	3	3	10	да
Навечно в памяти потомков	2	2	3	3	10	да
Наследие	2	2	3	3	10	да
Фестиваль популярной науки Нулевое сентября 2016	2	2	3	3	10	да
Фишинг юниор	2	2	3	3	10	да
Формула будущего 2016	2	2	3	3	10	да
Хочешь быть здоровым - будь им!	2	2	3	3	10	да
Читай-беседка	2	2	3	3	10	да
Читаймер	2	2	3	3	10	да
Откроем сердце для добра	2	2	3	3	10	да
Памяти огненных лет	2	2	3	3	10	да
Старость в радость	2	2	3	3	10	да
Семейный очаг	2	2	3	3	10	да
Радуга семейных талантов	2	2	3	3	10	да
Распахни свое сердце	2	2	3	3	10	да

Рассказы, игрушка, и быль, и небыль	2	2	3	3	10	да
Робототехника - можешь и ТЫ	2	2	3	3	10	да
Арт-среда	2	2	3	3	10	да
По следам астафьевских героев	2	2	3	3	10	да
Бессмертный батальон земли Балахтинской	2	2	3	3	10	да
Библиокафе "Ассорти"	2	2	3	3	10	да
Библиолужайка	2	2	3	3	10	да
Игротека в библиотеку	2	2	2	3	9	да
Истоки	2	2	2	3	9	да
История родной деревни	2	2	2	3	9	да
Памятью в прошлое	1	2	3	3	9	да
По Астафьевским местам	1	2	3	3	9	да
По Астафьевским местам	1	2	3	3	9	да
Клад неисчерпаемый	2	2	2	3	9	да
Большая стирка	2	2	2	3	9	да
Хобби-школа	2	2	2	3	9	да
Секция автоспорта в Ачинском детском доме	2	2	2	3	9	да
Сибирские легенды	2	2	2	3	9	да
Сибирский путеводитель	2	2	2	3	9	да
Слово о писателе	2	2	2	3	9	да
Спортивное мужское братство	2	2	2	3	9	да
Школа медицинского добровольчества	2	2	2	3	9	да
Ваш доблестный труд - это мощь нашей России	2	2	2	3	9	да
От норм ГТО - к олимпийским медалям	1	2	3	3	9	да
Предпочитаем Астафьева	2	2	2	3	9	да
Путешествие к истокам	2	2	2	3	9	да
Родник-начало родины	2	2	2	3	9	да
Вдохновение	2	2	2	3	9	да
Вместе весело шагать	2	2	2	3	9	да
Возвращенное детство	2	2	2	3	9	да
В городе моем моя судьба	1	2	3	2	8	да
Реабилитация через туризм	2	2	2	2	8	да
Умная гридинская игрушка	1	2	2	3	8	да
Здесь родины моей начало	2	2	2	2	8	да
Моя улица	1	2	3	2	8	да
Когда душа поет	2	1	3	2	8	да
Позитив	1	2	3	2	8	да
Нужны друг другу	1	2	2	3	8	да
Осторожно! Дети	2	2	2	2	8	да

Проекты с частичным достижением результатов						
Город мастеров	2	2	1	2	7	да
Писатель с берегов Енисея	1	2	1	3	7	да
Казачья семья - пример для тебя!	2	1	2	2	7	да
Орловские лица войны	1	1	2	2	6	да
Лингвистическое анти-кафе	1	1	2	2	6	да
Русский сарафан	1	1	2	2	6	да
Теплый дом	1	1	2	2	6	да
Памп-трек	1	1	2	2	6	да
Краевой интеграционный детско-юношеский фестиваль искусств «Подсолнухи»	1	2	1	2	6	да
Помним-значит живем	2	2	1	1	6	да
Я - защитник Отечества!	1	1	1	2	5	да
Памяти достойны	2	1	1	1	5	да
Казачья трудовая застава	1	1	1	2	5	да
Проекты с проблемной реализацией						
Солнце в ладошках	1	1	1	1	4	да
Краевой спортивно-туристический фестиваль для ветеранов с ограниченными возможностями "Компас"	1	1	1	1	4	да
Надежда	1	1	1	0	3	да
А будущее просто шло своей дорогой	1	1	1	0	3	да

Незавершенные проекты						
Название	Пункт 1	Пункт 2	Пункт 3	Пункт 4	Итого	Завершен да/нет
Успешные проекты с полным достижением результатов						
Арт-пространство "Детский дом"	2	2	3	3	10	нет
Ювента	2	2	3	3	10	нет
Мозаика традиций	2	2	3	3	10	нет
В объективе	2	2	3	3	10	нет
Спортивный праздник	2	2	3	3	10	нет
Тепло родного очага	2	2	3	3	10	нет
Веселая окраина	2	2	3	3	10	нет
Общественная охрана пещер	2	2	3	3	10	нет
Первый шаг	2	2	3	3	10	нет
Полезная продленка	2	2	3	3	10	нет
Шаг навстречу	2	2	3	3	10	нет
Эстафета милосердия	2	2	2	3	9	нет
Помоги пойти учиться	1	2	3	3	9	нет
Праздник кружева СЕТУ-SETO PITS	1	2	3	3	9	нет
Социальная реабилитация лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	2	2	2	3	9	нет
Одна команда-одна мечта	1	2	2	3	9	нет
Делаем сами - своими руками	1	2	3	3	9	нет
Арт-чердак	2	2	2	3	9	нет
Добрые встречи	2	2	2	3	9	нет
Жизнь в движении	2	2	2	3	9	нет
Как прекрасен этот мир	2	2	2	3	9	нет
Литературный клуб "Молодость души"	2	1	3	3	9	нет
Мой особый Бенджамен	2	2	2	3	9	нет
Мой русский язык	2	2	2	2	8	нет
Устройство спортивной площадки ГТО в Дудинке	2	2	2	2	8	нет
Мой любимый герой у Астафьева	1	2	2	3	8	нет
Ласковая грива	2	2	2	2	8	нет
И не Боги горшки обжигают	2	1	3	2	8	нет
Мастерская точечной росписи "Гиркил"	1	1	3	3	8	нет
Мы вместе	1	2	2	3	8	нет
Наследники	2	2	2	2	8	нет
Общение без границ	2	2	1	3	8	нет
Игры нашего двора	1	2	3	2	8	нет
Инклюзивная молекула	1	2	2	3	8	нет
Проекты с частичным достижением результатов						
Олений квест	1	2	1	3	7	нет
Психиатрия: наказание или помощь?	2	2	1	2	7	нет

Молодой мастер: скорая трудовая помощь	2	1	2	2	7	нет
Сад мечты	1	1	2	2	6	нет
Великая страна-великий и могучий русский язык	2	1	1	1	5	нет
Проекты с проблемной реализацией						
Здравствуй, Норильчонок!	1	1	1	0	3	нет
Инклюзивный центр Добро на Копылова	1	1	1	0	3	нет
Дети Таймыра	2	0	0	0	2	нет
Кукольный театр «Эвэдыт нингакар»	2	0	0	0	2	нет
Речь, реченька, река	1	0	0	0	1	нет
Трогательные чтения	1	0	0	0	1	нет
Контроль чрезвычайности	0	0	0	0	0	нет
Кувшин с трещинкой	0	0	0	0	0	нет

Приложение 2

Результаты экспертного мониторинга проектов

Проект	Эксперт	Оценка
Моё Отечество	Пашенных	14 баллов
Шаг навстречу	Пашенных	14 баллов
Дети одного солнца	Пашенных	14 баллов
Реабилитация через туризм	Шадрина	14 баллов
Фишинг Юниор	Пашенных	14 баллов
Умная гридинская игрушка	Давоян	14 баллов
Литературный клуб Молодость души	Давоян	14 баллов
Нужны друг другу	Шадрина	14 баллов
Васюткина мастерская	Шадрина	14 баллов
Мозаика традиций	Шадрина	14 баллов
Путешествие к истокам	Шадрина	14 баллов
Добрые встречи	Пашенных	14 баллов
По следам Астафьевских героев	Ильин	14 баллов
Здравствуй, Норильчонок	Невелева	14 баллов
Клад неисчерпаемый	Пашенных	14 баллов
А будущее просто шло своей дорогой	Пашенных	14 баллов
Мой любимый герой у Астафьева	Ильин	14 баллов
Общественная охрана пещер	Давоян	14 баллов
Наследники	Ильин	14 баллов
Подсолнухи	Ильин	14 баллов
Одна команда-одна мечта	Шадрина	14 баллов
Инклюзивная молекула	Шадрина	14 баллов
Молодой мастер	Давоян	14 баллов
Эстафета милосердия	Шадрина	14 баллов
Полезная продленка	Давоян	13 баллов
Город мастеров	Невелева	13 баллов
Дежурный дедушка	Шадрина	13 баллов
Памп-трек	Пашенных	13 баллов
Расскази, игрушка, и быль, и небыль	Ильин	13 баллов
Психиатрия: наказание или помощь	Шадрина	12 баллов

Инклюзивный центр Добро на Копылова	Ильин	12 баллов
Секция автоспорта в ачинском детском доме	Марфин	12 баллов
Сад мечты	Давоян	12 баллов
Мой русский язык	Ильин	12 баллов
Дети Таймыра	Невелева	10 баллов
Здесь родины моей начало	Марфин	9 баллов
Устройство спортивной площадки ГТО	Невелева	6 баллов
Казачья трудовая застава	Ильин	4 балла
Кувшин с трещинкой	Пашенных	1 балл
Орловские лица войны	Пашенных	2 балла
Великая страна-великий и могучий русский язык	Пашенных	0 баллов
Надежда	Пашенных	отказались от мониторинга
Контроль чрезвычайности	Ильин	отказались от мониторинга

Приложение 3

Таблица мониторинга СМИ

Территория	Название СМИ	Заголовок	Дата	Ссылка	Проект
Красноярский край	Газета "Наш Красноярский край"	нет	03.06.2016		"Осторожно!Дети"
Красноярск	Газета "Шанс"	Собирайся детвора-на праздник пора!	нет	нет	"Осторожно!Дети"
Красноярск	Газета "Городские новости", газета "Шанс", газета "Телесемь"	Макетная реклама	нет	нет	"Осторожно!Дети"
Красноярск	Интернет-газета Newslab, информационное агентство "Сибновости", интернет-портал "Красмама"	Баннерная реклама	нет	нет	"Осторожно!Дети"
Балахтинский район	Газета "Сельская новь"	Наследники победы	01.07.2016	-	Бессмертный батальон земли Балахтинской
Рыбинский р-н	Газета "Голос времени"	Библиокафе "Ассорти"	26.02.2016	-	Библиокафе "Ассорти"
Боготольский район	Газета "Боготол24"	История одного лета	07.09.2016	-	Библиолужайка
Боготольский район	Газета "Боготол24"	Читатель, с днем рождения!	03.08.2016	-	Библиолужайка
Боготольский район	Газета "Земля боготольская"	Край в объективе	-	-	В объективе
Краснотуранский район	Газета "Эхо Турана"	Васютка, конь и дядя Кузя	-	http://exoturana.ru/sections/events/vasutka_kon_i_diadia_kyzia.html	Васюткина мастерская
Краснотуранский район	Газета "Эхо Турана"	Уважаемые ребята, а также их родители!	-	http://exoturana.ru/sections/events/bibliodelejans.html	Васюткина мастерская

Краснотуранский район	Газета "Эхо Турана"	Закулисье	-	http://exoturana.ru/sections/molodejnia_format/kylytyra/zakylisie.html	Васюткина мастерская
Красноярск	8 канал	В Красноярске чествовали ветеранов труда	13.05.2016	https://www.youtube.com/watch?v=fchZy12FtPQ	Ваш доблестный труд - это мощь нашей России
Красноярск	Газета "Городские новости"	О людях труда	07.04.2016	http://gornovosti.ru/tema/starsh-ee-pokolenie/o-lyudyakh-truda82244.htm	Ваш доблестный труд - это мощь нашей России
Красноярск	Газета "Городские новости"	Слушать - наслаждение	16.06.2016	http://gornovosti.ru/tema/starsh-ee-pokolenie/slushat-naslazhdeniye84078.htm	Ваш доблестный труд - это мощь нашей России
Ужурский район	Газета "Сибирский хлебороб"	Вдохновение по-малоимышки	14.01.2016	http://gnkk.ru/upload/iblock/962/9629eae427260154807b28fb844e667a.pdf	Вдохновение
Ужурский район	Газета "Сибирский хлебороб"	Время, когда сердце поет		-	Вдохновение
Минусинский район	Газета "Власть труда"	Вместе весело шагать	25.10.2016	http://vtruda.ru/obshchestvo/sp-ort-i-zdorove/vmeste-veselo-shagat-25-10-2016	Вместе весело шагать
Боготольский район	Газета "Боготол24"	Вспоминая Астафьева	23.03.2016	-	Встреча через 20 лет
Боготольский район	Газета "Земля боготольская"	Встреча через годы и расстояния	14.01.2016	-	Встреча через 20 лет
Боготольский район	Газета "Земля боготольская"	Уважаемые боготольцы!	17.03.2016	-	Встреча через 20 лет
Боготольский район	Газета "Земля боготольская"	Читаем Астафьева	28.04.2016	-	Встреча через 20 лет
Боготольский район	Газета "Боготол24"	Встречи победного мая	18.05.2016	-	Встреча через 20 лет
Боготольский район	Газета "Боготол24"	Кино-день открытых дверей	25.05.2016	-	Встреча через 20 лет

Боготольский район	Газета "Боготол24"	Поклонникам десятой музыки	-	-	Встреча через 20 лет
Боготольский район	Газета "Боготол24"	Подведены итоги конкурса	17.08.2016	-	Встреча через 20 лет
Бородинский район	Газета "Голос Времени"	Наш проект	05.02.2016	-	Второе дыхание
Красноярск	Телеканал "Прима"	Технопарк для детей появится в Красноярске	25.04.2016	http://www.prima-tv.ru/news/society/42117-tehnopark-dlya-detej-poyavitsya-v-krasnoyarske/	Дежурный дедушка
Красноярск	Телеканал "Прима"	5 новостей за минуту	12.05.2016	http://www.prima-tv.ru/news/5news/42252-29-maya-v-krasnoyarske-projdet-pervyj-gorodskoj-veloparad/	Дежурный дедушка
Красноярск	Телеканал "Прима"	Дядя Женя бесплатно учит желающих пользоваться молотком	09.06.2016	http://www.prima-tv.ru/news/society/42474-dyadya-zhenya-besplatno-uchit-zhelayushhikh-polzovatsya-molotkom/	Дежурный дедушка
Красноярск	Интернет-портал "Город Прима"	В Красноярске появился дежурный дедушка	27.04.2016	http://gorodprima.ru/2016/04/27/v-krasnoyarske-poyavitsya-dezhurnyj-dedushka/	Дежурный дедушка
Красноярск	Телеканал "Афонтово"	Включение. Мастерская (Утренний кофе)	04.05.2016	https://www.youtube.com/watch?v=7SOqWXdXldE	Дежурный дедушка
Красноярский край	Телеканал "Енисей"	Умелые новости. Дядя Женя мастерит с детьми	24.05.2016	https://www.enisey.tv/utro-na-enisee/umelye-novosti/post-1072/	Дежурный дедушка
Красноярский край	Газета "Наш Красноярский край"	Растим инженеров	23.05.2016	http://gnkk.ru/articles/rastim-inzhenerov.html	Дежурный дедушка
Красноярск	Радиостанция "Красноярск FM"	Афиша «Завтрак чемпионов». Приглашение	13.05.2016	-	Дежурный дедушка
Красноярск	Интернет-портал НГС24	Мастерская Дяди Жени	18.03.2016	http://afisha.ngs24.ru/event/965	Дежурный дедушка

				813/8/	
Красноярск	Интернет-газета Newslab	Мастерская Дяди Жени	18.03.2016	http://newslab.ru/photo/707311	Дежурный дедушка
Красноярск	Интернет-газета Newslab	Юных красноярцев научат мастерить поделки из дерева	08.06.2016	http://newslab.ru/news/720463	Дежурный дедушка
Красноярск	Интернет-портал Выбериай	Выходные в мастерской у дяди Жени	июн.16	http://krasnoyarsk.vibirai.ru/afisha/deti/vyhodnye_v_masterskoy_u_dyadi_jeni-2012361	Дежурный дедушка
Красноярск	Газета "Городские новости"	Красноярские школьники обеспечили жильём грызунов парка флоры и фауны «Роев ручей»	26.10.2016	http://gornovosti.ru/glavnoe/krasnoyarskiye-shkolniki-obespechili-zhilyem-gryzunov-parka-flory-i-fauny-royev-ruchey87486.htm	Дежурный дедушка
Красноярск	Независимое информационное агентство	Красноярские школьники обеспечили жильём грызунов парка флоры и фауны «Роев ручей»	26.10.2016	http://24rus.ru/more.php?UID=138093	Дежурный дедушка
Красноярск	Сибирское агентство новостей	Юные красноярцы сделали домики для питомцев «Роева ручья»	26.10.2016	http://krsk.sibnovosti.ru/society/339904-yunye-krasnoyartsy-sdelali-domiki-dlya-pitomtsev-roeva-ruchya	Дежурный дедушка
Красноярск	Сибирское агентство новостей	В Красноярске открывается новый корпус мастерской «Твори-гора»	29.08.2016	http://krsk.sibnovosti.ru/society/336208-v-krasnoyarske-otkryvaetsya-novyy-korpus-masterskoy-tvori-gora	Дежурный дедушка
Манский район	Манская жизнь	Будет Клево (анонсы). Приглашаем....	-	-	Дети одного солнца
Абанский район	Красное знамя	Грантовые программы края	17.05.2016	http://moyaokruga.ru/krasnoeznamia/Articles.aspx?articleId=66077	Добрые встречи
Боготольский район	Газета "Боготол24"	Спортивный праздник	24.08.2016	-	Дорогие мои старики
Боготольский район	Газета "Земля боготольская"	Дорогие мои старики	20.10.2016	-	Дорогие мои старики
Норильск	Газета "Заполярная	Колыбельные для мам	24.05.2016		Здравствуй,

	правда"				Норильчонок!
Норильск	Газета "Заполярная правда"	Ангелина Сыроежкина	06.10.2016	http://gazetazp.ru/2016/160/6/	Здравствуй, Норильчонок!
Боготольский район	Газета "Земля боготольская"	Зеленый патруль	-	-	Зеленый патруль
Боготольский район	Газета "Земля боготольская"	Проекты будут реализованы	31.03.2016	http://gnkk.ru/upload/iblock/6a2/6a2615032aa245d856b88d56eb01b525.pdf	Зеленый патруль
Боготольский район	Газета "Земля боготольская"	Зеленый патруль вышел на уборку леса	-	-	Зеленый патруль
Боготольский район	Газета "Боготол24"	В гостях у "Знаек"	-	-	Знайки
Боготольский район	Газета "Земля боготольская"	В школу вместе с Мэри Поппинс	-	-	Знайки
Боготольский район	Газета "Земля боготольская"	Мы вместе, нам весело	-	-	Знайки
Боготольский район	Газета "Земля боготольская"	В центре внимания - дворовые игры	-	-	Игры нашего двора
Красноярский край	Газета "Аргументы и факты"	Единственная женщина-атаман в России: «Могу и нагайкой пригрозить...»	20.07.2016	http://www.krsk.aif.ru/society/e-dinstvennaya_zhenshchina-ataman_v_rossii_mogu_i_nagaykoy_prigrozit	Казачья семья - пример для тебя!
Дзержинский район	Газета "Дзержинец"	Встреча с детьми войны	04.11.2016	-	Как прекрасен этот мир...
Дзержинский район	Дзержинское ТВ	Телеуроки	-	http://www.dzerzhinskoe.ru/tv	Как прекрасен этот мир...
Манский район	Газета "Манская жизнь"	Это было клево!	07.07.2016	-	Клево
Манский район	Газета "Манская жизнь"	Манский улов. Анонс	07.07.2016	-	Клево
Манский район	Газета "Манская жизнь"	Манский улов	11.08.2016	-	Клево
Манский район	Газета "Манская жизнь"	Проекты для детей и взрослых	-	-	Клево

Красноярск	Газета "Городские новости"	Фонтаны, памятники и наследие купцов	19.05.2016	http://gornovosti.ru/tema/starsh-ee-pokolenie/fontany-pamyatniki-i-naslediye-kuptsov83322.htm	Красноярск раскинул улицы
Красноярск	Газета "Городские новости"	Детство, опаленное войной	28.04.2016	http://gornovosti.ru/tema/starsh-ee-pokolenie/detstvo-opalennoye-voynoy82874.htm	Красноярск раскинул улицы
Красноярск	Газета "Городские новости"	Выросли скалы из лавы	22.04.2016	-	Красноярск раскинул улицы
Красноярск	Газета "Городские новости"	Хорошо знакомое ... новое	20.05.2016	-	Красноярск раскинул улицы
Красноярск	8 канал	Красноярск раскинул улицы	15.06.2016	https://www.youtube.com/watch?v=G9JUKjF9rzg	Красноярск раскинул улицы
Красноярск	Интернет-газета Newslab	Фоторепортаж: Жаркая битва за Ржев	03.07.2016	http://newslab.ru/photo/722764	Красноярский вклад в победу над фашизмом в ВОВ
Боготольский район	Газета "Боготол24"	"Молодость души" совета ветеранов	06.07.2016	-	Литературный клуб "Молодость души"
Боготольский район	Газета "Боготол24"	И мудрость осени душе откроет жизнь	05.10.2016	-	Литературный клуб "Молодость души"
Боготольский район	Газета "Боготол24"	Наш Литературный ...	02.11.2016	-	Литературный клуб "Молодость души"
Красноярск	Газета Красноярский рабочий	Боготол богат талантами	30.11.2016	http://www.krasrab.com/archive/2016/11/30/44/view_article	Литературный клуб "Молодость души"
Боготольский район	Газета "Земля боготольская"	Их делами славен наш город	14.07.2016	-	Литературный клуб "Молодость души"
Боготольский район	Газета "Боготольский курьер"	Жизнь, как на есть	29.09.2016	-	Литературный клуб "Молодость души"
Боготольский район	Газета "Земля боготольская"	Открытие "Молодости души"	17.03.2016	-	Литературный клуб "Молодость души"

Балахтинский район	Газета "Сельская новь"	Расскажем без секрета, что читали этим элетом	23.09.2016		Литературный театр "Малышок"
Каснотуранский район	Газета "Эхо Турана"	Тубинское лето под книжным зонтиком	07.10.2016		Мобильнаябиблиотека под зонтиком "Чудо":читаем,дивляемся делаем открытия
Железногорск	Городской сайт Железногорска	В Железногорске подведены итоги конкурса социально значимых проектов	28.03.2016	http://www.gig26.ru/news/obschestvo/?nid=8696	Мое Отечество:информационный центр по туризму
Красноярск	ИА 1-line	В Железногорске на социально значимые проекты выделили полмиллиона	30.03.2016	http://1line.info/society/item/54393-proekti	Мое Отечество:информационный центр по туризму
Красноярский край	Красноярский краевой медиа-портал "Столица 24"	Проект железногорской библиотеки получил грантовую поддержку	26.02.2016	http://stolitca24.ru/news/proekt-zheleznogorskoy-biblioteki-poluchil-grantovuyu-podderzhku/	Мое Отечество:информационный центр по туризму
Назаровский район	Назарово онлайн	Мы против сквернословия	16.04.2016	http://www.nazarovo-online.ru/articles/20336-my-protiv-skvernosloviya.html	Мы против сквернословия
Балахтинский район	Газета "Сельская новь"	Преклоник колена у обелиска	16.09.2016		Навечно в памяти потомков
Шушенский район	Телеканал "Южные горизонты"	Молодежный квест	21.06.2016	https://cloud.mail.ru/public/5aA4/M7U9ceZwE	Нужны друг другу
Шушенский район	"4-й канал Шушенское"	Молодежный квест	21.06.2016	https://cloud.mail.ru/public/5aA4/M7U9ceZwE	Нужны друг другу
Шушенский район	Телеканал "Южные горизонты"	Посещение знаковых мест Шушенского и Сизой	28.10.2016	https://cloud.mail.ru/public/Bo44/w5dLeYoCe	Нужны друг другу

Шушенский район	"4-й канал Шушенское"	Посещение знаковых мест Шушенского и Сизой	28.10.2016	https://cloud.mail.ru/public/Bo44/w5dLeYoCe	Нужны друг другу
Шушенский район	Телеканал "Южные горизонты"	Проект "Нужны друг другу" Итоги	06.12.2016	https://cloud.mail.ru/public/2MPy/zPhbkGVgL	Нужны друг другу
Шушенский район	"4-й канал Шушенское"	Проект "Нужны друг другу" Итоги	06.12.2016	https://cloud.mail.ru/public/2MPy/zPhbkGVgL	Нужны друг другу
Красноярск	prmira.ru ("Перспектива Мира")	Афиша	24.11.2016	https://prmira.ru/guide/afisha-krasnoyarska-14-samyh-yarkih-sobytij-vyhodnyh/	Общественная охрана пещер
Шушенский район	Телеканал "Южные горизонты"	Фестиваль "Казачий всполох"	22.07.2016	https://cloud.mail.ru/public/5aA4/M7U9ceZwE	Памяти достойны
Красноярск	Интернет-газета Newslab	В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией представители Ассоциации развития реабилитационных центров Красноярского края расскажут о статистике наркоупотребления в регионе, оптимизации работы негосударственных реабилитационных центров, пропаганде здорового образа жизни и снижению социальной напряженности в обществе.	23.06.2016	нет	Первый шаг
Красноярский край	Интернет-портал "Столица 24"	Спасенье "утопающих"	23.06.2016	нет	Первый шаг
Красноярск	Газета "Красноярский рабочий"	Частичка добра в Дом ветерана	16.05.2016	http://www.krasrab.com/archive/2016/06/16/43/view_article	Первый шаг
Дзержинский район	Газета "Дзержинец"	Открыт памятник герою России Наумову	26.08.2016		Помним-значит живем
Иланский район	Газета "Иланские вести"	Не только чтение ...	27.07.2016	http://ilanskievosti.ru/news/1144	Предпочитаем

				93/	Астафьева
Рыбинский район	Газета "Голос Времени"	Радуга семейных талантов засияла в Рыбном	12.02.2016	-	Радуга семейных талантов
Пировский район	Газета "Заря"	Спят усталые игрушки	04.03.2016	-	Расскажи, игрушка, и быль, и небыль
Пировский район	Телестудия "Новый век"	Расскажи, игрушка, и быль, и небыль	26.02.2016	-	Расскажи, игрушка, и быль, и небыль
Пировский район	Газета "Заря"	Фотоотчет с награждения победителей конкурса "Расскажи, игрушка, и быль, и небыль"	22.06.2016	http://zaria.com.ru/photoalbum/3836/	Расскажи, игрушка, и быль, и небыль
Пировский район	Газета "Заря"	Награждение участников конкурса "Расскажи игрушка быль и небыль"	01.07.2016	-	Расскажи, игрушка, и быль, и небыль
Пировский район	Газета "Заря"	Посвящается друзьям детства	22.04.2016	-	Расскажи, игрушка, и быль, и небыль
Пировский район	Телестудия "Новый век"	Фестиваль "Пировский Левша"	08.04.2016	-	Расскажи, игрушка, и быль, и небыль
Пировский район	Телестудия "Новый век"	Фестиваль "Пировская народная игрушка"	24.06.2016	-	Расскажи, игрушка, и быль, и небыль
Пировский район	Газета "Заря"	Расскажи, игрушка	-	-	Расскажи, игрушка, и быль, и небыль
Балахтинский район	Газета "Сельская новь"	Такой хороший "Робокоша"	18.11.2016	http://moyaokruga.ru/selnov/Articles.aspx?articleId=84007	Робототехника: можешь и Ты!
Балахтинский район	Газета "Сельская новь"	Робототехника: можешь и Ты!	25.03.2016	http://gnkk.ru/upload/iblock/4d0/4d0e3f4cd9691a14e1d9b9ccb43143ae.pdf	Робототехника: можешь и Ты!
Балахтинский район	Балахтинский телеканал "7 дней"	Фестиваль "Робокоша"	05.11.2016	https://vk.com/balahta_tv?w=wall-88206518_233	Робототехника: можешь и Ты!
Балахтинский район	Газета "Сельская новь"	Успешное проектирование	26.02.2016	http://gnkk.ru/upload/iblock/de1/de158c7d36b6e89996975171cfbf5033.pdf	Родник-начало Родины

Красноярск	Интернет-газета Newslab	Русский сарафан	-	http://newslab.ru/afisha/concerts/29805	Русский сарафан
Красноярск	ИА "Без формата"	В Красноярске состоялся краевой историко-патриотический конкурс "Русский сарафан"	07.06.2016	http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/kraevoj-istoriko-patrioticheskij-konkurs/47448858/	Русский сарафан
Красноярский край	Газета "Наш Красноярский край"	В Ачинском детском доме прошел чемпионат по фигурному вождению спортивных автомобилей	26.09.2016	http://gnkk.ru/news/in-achinsk-children-s-house-passed-the-championship-on-figure-driving-sports-cars.html?sphrase_id=63456	Секция автоспорта в ачинском детском доме
Саянский район	Газета "Присяянье"	Реализация проекта	15.11.2016	http://moyaokruga.ru/prisayanye/Articles.aspx?articleId=84347#	Семейный очаг
Красноярский край	Краевой медиа-портал "Столица24"	В Железногорске впервые пройдет этнический фестиваль музыки и ремесел	05.07.2016	http://stolitca24.ru/news/v-zheleznogorske-vpervee-proydet-etnicheskij-festival-muzyki-i-remesel/	Сибирские легенды
Железногорск	Городской сайт Железногорска	в Железногорске выбрали лучших косарей	07.07.2016	http://www.gig26.ru/news/obschestvo/?nid=9306	Сибирские легенды
Железногорск	Городской сайт Железногорска	Парк Железногорска - победитель смотра-конкурса «Хрустальное колесо»	03.10.2016	http://www.gig26.ru/news/kultura/?nid=9749	Сибирские легенды
Железногорск	Городской сайт Железногорска	В железногорском парке пройдет этнический фестиваль	05.07.2016	http://www.gig26.ru/news/kultura/?nid=9294	Сибирские легенды
Красноярский край	Газета "Наш Красноярский край"	В Железногорске впервые пройдет этнический фестиваль музыки и ремесел	05.07.2016	http://gnkk.ru/news/as-the-first-ethnic-festival-of-music-and-crafts.html	Сибирские легенды
Железногорск	Независимое информационное агентство Железногорск	В Железногорске состоится этнический фестиваль «Сибирские легенды»	04.07.2016	http://www.zato26.org/news/6205	Сибирские легенды

Красноярск	Независимое информационное агентство	Железногорский парк провел лучшее культурно-досуговое мероприятие года	04.10.2016	http://24rus.ru/more.php?UID=137469	Сибирские легенды
Железногорск	ТВ Время местное	Сибирские легенды	04.07.2016	https://www.youtube.com/watch?v=dVe1RPZ-v-k	Сибирские легенды
Железногорск	Свежее телевидение	Сибирские легенды	07.07.2016	http://tv.k26.ru/index.php?newsid=11767	Сибирские легенды
Красноярский край	Культура 24	В Железногорске пройдет этнический фестиваль «Сибирские легенды»	05.07.2016	http://xn--24-6kc3bf4angc2g.xn--p1ai/news/5768/	Сибирские легенды
Красноярский край	Радио России 94,5 FM	Репортаж о проекте	24.04.2016	-	Социальная реабилитация лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Красноярск	ТВ Центр Красноярск	Территория закона	29.07.2016	https://vk.com/video-40004956_456239022	Социальная реабилитация лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Боготольский район	Газета "Земля боготольская"	Близкий человек онлайн	авг.16	-	Старость в радость
Боготольский район	Газета "Боготол24"	В рамках реализации проекта....	28.09.2016	-	Старость в радость
Канский район	ИА "Без формата"	Тепло костра	23.07.2016	http://kansk.bezformata.ru/listnews/teplo-kostra/35696226/	Тепло родного очага
Канский район	Газета "Канские ведомости"	Тепло костра	23.07.2016	http://www.kvgazeta.ru/latest-news/7129-2015-07-23-09-12-28.html	Тепло родного очага
Назаровский район	Газета "Советское Причулымье"	Народные традиции: это нам интересно	-	-	Умная гридинская игрушка
Назаровский	Газета "Советское	Умные и добрые игрушки	-	-	Умная гридинская

район	Причудлымье"				игрушка
Назаровский район	Газета "Советское Причудлымье"	Когда игрушек - целый музей!	-	-	Умная гридинская игрушка
Назаровский район	Газета "Советское Причудлымье"	Моя мама-шорник!	-	-	Умная гридинская игрушка
Назаровский район	Газета "Точное время"	Мастер-класс в музее "Сибирская игрушка"	-	-	Умная гридинская игрушка
Красноярский край	ГТРК Красноярск	Музей игрушки	29.07.2016	http://krasnoyarsk.rfn.ru/rnews.html?id=42248	Умная гридинская игрушка
Таймыр	Газета "Таймыр"	Путевка в жизнь	21.10.2016	http://www.taimyr24.ru/gazeta/	Устройство спортивной площадки ГТО в г.Дудинка
Таймыр	Газета "Таймыр"	В Дудинке появится площадка ГТО	20.10.2016	http://www.taimyr24.ru/gazeta/	Устройство спортивной площадки ГТО в г.Дудинка
Красноярск	Газета "Городские новости"	Через две недели в Красноярске начнёт работу Всероссийский фестиваль науки НАУКА 0+	16.08.2016	http://www.gornovosti.ru/glavnoe/cherez-dve-nedeli-v-krasnoyarske-nachnet-rabotu-vserossiyskiy-festival-nauki-nauka-085631.htm	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярск	Независимое информационное агентство НИА-Красноярск	В Красноярском крае пройдёт трехмесячный фестиваль науки	09.08.2016	http://www.24rus.ru/more.php?UID=135784	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярск	Информационное агентство "Блокнот.RU"	«Нулевое сентября» впервые наступит в Красноярске	09.08.2016	http://bloknot-krasnoyarsk.ru/news/nulevoe-sentyabrya-vpervye-nastupit-v-krasnoyarske-768839	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"

Красноярск	Информационное агентство "1-Line"	Красноярск станет городом открытий	09.08.2016	http://1line.info/society/nauka-i-tehnologii/item/58146-gorod-otkrytij	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярский край	Газета "Московский Комсомолец"	Осенью в Красноярском крае пройдет трехмесячный фестиваль науки	08.10.2016	-	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярск	Информационное агентство "1-Line"	Юные красноярцы встретят новый учебный год по-научному	16.09.2016	http://1line.info/society/nauka-i-tehnologii/item/58316-nulevoe-sentyabrja	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярск	РИА - "Экспресс"	В Красноярске в третий раз пройдет научный фестиваль «Нулевое сентября»	01.08.2016	http://ria-express.com/v-krasnoyarske-v-tretij-raz-projdet-nauchnyj-festival-nulevoe-sentyabrya/	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярск	7 Канал	В Красноярске проходит космический научный фестиваль	05.09.2016	http://www.trk7.ru/news/55652.html	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярский край	Вести-Красноярск	«Нулевое сентября» в Красноярске	05.09.2016	http://www.vesti-krasnoyarsk.ru/news/nayka/post-1711/	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярский край	КГТРК-Красноярск	В Красноярске прошёл фестиваль науки "Нулевое сентября"	05.09.2016	http://krasnoyarsk.rfn.ru/rnews.html?id=51408	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярск	"Утренний кофе с Афонтово"		01.09.2016	https://vk.com/afontovocoffee?w=wall-100559620_5331	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"

Красноярский край	Енисей-регион	3 сентября в Красноярске стартует фестиваль науки "Нулевое сентября"	02.09.2016	https://www.enisey.tv/news/post-2781/	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярский край	Енисей-регион	Фестиваль науки "Нулевое сентября"	05.09.2016	https://www.enisey.tv/utro_na_enisee/sujeti/post-2120/	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярский край	Енисей-регион	В Красноярске прошел праздник науки для самых маленьких "Нулевое сентября"	05.09.2016	https://www.enisey.tv/utro_na_enisee/sujeti/post-2115/	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярск	ТВК	В Красноярске открылся фестиваль «нулевое сентября»	03.09.2016	http://tvk6.ru/publications/news/20632/	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярск	Красноярск ФМ	интервью	-	https://www.youtube.com/watch?v=Mc7cPBGyMA#t=106	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярск	ИА "Сибновости" (Сибирское агентство новостей)	В Красноярске фестиваль «Нулевое сентября» посетили более 8000 человек	05.09.2016	http://krsk.sibnovosti.ru/society/336689-v-krasnoyarske-festival-nulevoe-sentyabrya-posetili-bolee-8000-chelovek	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярск	Интернет-газета "Ньюслаб"	Гости «Нулевого сентября» в Красноярске смогут пообщаться с космонавтом	30.09.2016	http://newslab.ru/news/728781	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярск	Интернет-газета "Ньюслаб"	Более 8 тысяч красноярцев посетили «Нулевое сентября»	05.09.2016	http://newslab.ru/news/728974	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"

Красноярск	Интернет-газета "Ньюслаб"	Доцент Красноярского института искусств выиграла «Научный бой» на «Нулевом сентября»	06.09.2016	http://newslab.ru/news/729102	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярск	Интернет-газета "Ньюслаб"	Нулевое сентября	01.09.2016	http://newslab.ru/afisha/education/31404	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярск	РИА - "Экспресс"	В Красноярске в третий раз пройдет научный фестиваль «Нулевое сентября»	15.08.2016	http://ria-express.com/v-krasnoyarske-v-tretij-raz-projdet-nauchnyj-festival-nulevoe-sentyabrja/	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярск	Информационное агентство "1-Line"	Юные красноярцы встретят новый учебный год по-научному	15.08.2016	http://1line.info/society/nauka-i-tehnologii/item/58316-nulevoe-sentyabrja	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярский край	Газета "Московский Комсомолец"	«Нулевое сентября» в Красноярске посетили свыше восьми тысяч человек	06.09.2016	http://kras.mk.ru/articles/2016/09/06/nulevoe-sentyabrja-v-krasnoyarske-posetili-svyshe-vosmi-tysyach-chelovek.html	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярск	Информационное агентство "1-Line"	Красноярск станет городом открытий	09.08.2016		Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярск	Redom.ru	Фестиваль науки «Нулевое сентября»	03.09.2016	http://www.redom.ru/gallery/festival-nauki-nulevoe-sentyabrja_14503/	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярск	runews24.ru	Более 8 тысяч красноярцев посетили «Нулевое сентября»	05.09.2016	http://runews24.ru/krasnoyarsk/05/09/2016/7839ad22ec72e712a5bf9686de39c860	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"

Красноярский край	Газета "Комсомольская Правда"	Фестиваль науки «Нулевое сентября» в Красноярске посетили более 8000 человек	05.09.2016	http://www.krsk.kp.ru/online/news/2500929/	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярск	Красноярский городской сайт	На «Нулевом сентября» научат отличать настоящие метеориты от подделок	29.08.2016	http://www.kgs.ru/news/society/Na-Nulevom-sentyabrya-nauchat-otlichat-nastoyaschie-meteorityi-ot-poddelok-89379.html	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярск	Красноярский краевой медиа-портал "Столица 24"	В Красноярске всероссийский фестиваль науки открылся «Нулевым сентября»	04.09.2016	http://stolitca24.ru/news/v-krasnoyarske-vserossiyskiy-festival-nauki-otkrylsya-nulevym-sentyabrya/	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярск	Агентство конфликтных ситуаций "Монависта"	В Красноярске всероссийский фестиваль науки открылся «Нулевым сентября»	04.09.2016	http://krasnoyarsk.monavista.ru/news/1980629/	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярск	Информационное агентство "Блокнот.RU"	В Красноярске стартовал проект «Нулевое сентября»	04.09.2016	http://bloknot-krasnoyarsk.ru/news/v-krasnoyarske-startoval-proekt-nulevoe-sentyabrya-776823	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярск	Все в Красноярске	Гости «Нулевого сентября» в Красноярске смогут пообщаться с космонавтом	-	http://www.2-999-999.ru/gorodskie-novosti/?id=127505	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярск	kudago.com	Научный фестиваль «Нулевое сентября»	03.09.2016	http://kudago.com/krasnoyarsk/event/nauchnyj-festival-nulevoe-sentyabrya/	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярск	prmira.ru ("Перспектива Мира")	Красноярцы смогут увидеть дроида R2-D2 как в «Звездных войнах»	30.08.2016	https://prmira.ru/news/krasnoyarskiy-smogut-uvidet-droida-r2-d2-kak-v-zvezdnyih-vojnah/	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"

					2016"
Красноярский край	Культура 24.рф	Нулевое сентября: динозавры, космонавты и роботы (РЕПОРТАЖ ИЗ СОЦСЕТЕЙ)	05.09.2016	http://xn--24-6kc3bf4angc2g.xn--p1ai/news/6289/	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярск	Knews	Более 8 тысяч красноярцев посетили «Нулевое сентября»	05.09.2016	http://www.knews.su/news/199710	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярск	Независимое информационное агентство	Фестиваль науки НАУКА 0+ открылся «Нулевым сентября»	05.09.2016	http://www.24rus.ru/more.php?UID=136612	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярск	Информационное агентство "1-Line"	«Наша миссия - раскрыть красоту окружающего мира посредством науки»	04.09.2016	http://1line.info/media-news/fotoreportazhi/fotostory/item/59034-nulevoe-sentyabrya	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярск	Новости Mail.ru	Более 8 тысяч красноярцев посетили «Нулевое сентября»	05.09.2016	https://news.mail.ru/society/27003682/	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Красноярский край	Газета "Наш Красноярский край"	Как вырастить алмаз?	26.08.2016	http://gnkk.ru/articles/kak-vyrastit-almaz.html?sphrase_id=61190	Фестиваль популярной науки "Нулевое сентября 2016"
Манский район	Газета "Манская жизнь"	Фишинг юниор	07.07.2016	-	Фишинг юниор
Манский район	Газета "Манская жизнь"	Впечатлений хватит надолго	21.07.2016	-	Фишинг юниор
Красноярск	Газета "Городские новости"	Никита и Владимир Алябьевы: «Дождаться своего часа»	11.07.2016	http://www.gornovosti.ru/tema/stadion/nikita-i-vladimir-alyabyevy-dozhdatsya-svoyego-	Формула будущего 2016

				chasa84775.htm	
Красноярск	ИА "Без формата"	Заккрытие сезона на Абаканской протоке	06.09.2011	http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/zakritie-sezona-na-abakanskoj-protokke/50188836/	Формула будущего 2016
Красноярск	ИА "Без формата"	По формуле будущего	17.06.2016	http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/po-formule-budushhego/47799264/	Формула будущего 2016
Красноярск	ИА "Без формата"	В Красноярске завершилось первенство России по водно-моторному спорту	15.06.2016	http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/pervenstvo-rossii-po-vodno-motornomu/47700625/	Формула будущего 2016
Красноярск	ИА "Без формата"	В Красноярске завершилось первенство России по водно-моторному спорту	15.06.2016	http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/pervenstvo-rossii-po-vodno-motornomu/47700636/	Формула будущего 2016
Красноярский край	Газета "Наш Красноярски край"	По формуле будущего	17.06.2016	http://gnkk.ru/articles/po-formule-budushchego.html	Формула будущего 2016
Красноярск	Сибирское агентство новостей	В Красноярске завершилось первенство России по водно-моторному спорту	15.06.2016	http://krsk.sibnovosti.ru/sport/330343-v-krasnoyarske-zavershilos-pervenstvo-rossii-po-vodno-motornomu-sportu	Формула будущего 2016
Красноярск	Красноярский городской сайт	В Красноярске завершилось первенство России по водно-моторному спорту	15.06.2016	http://www.kgs.ru/news/society/V-Krasnoyarske-zavershilos-pervenstvo-Rossii-po-vodno-motornomu-sportu-86849.html	Формула будущего 2016
Красноярск	ИА "Без формата"	На акватории Абаканской протоки Енисея состоится первенство Красноярска по водно-моторному спорту	20.05.2016	http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/protoki-eniseya-sostoitsya-pervenstvo/46956274/	Формула будущего 2016

Красноярск	ИА "Без формата"	В Красноярске состоится первенство края по водно-моторному спорту	27.05.2016	http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/pervenstvo-kraya-po-vodno-motorному/47107471/	Формула будущего 2016
Красноярск	ИА "Без формата"	В Красноярске прошло первенство города по водно-моторному спорту	24.05.2016	http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/pervenstvo-goroda-po-vodno-motorному/47021998/	Формула будущего 2016
Богучанский район	Газета "Ангарская правда"	На равных	06.05.2016	http://moyaokruga.ru/angarskayapravda/Articles.aspx?articleId=65717	Хобби-школа
Богучанский район	Газета "Ангарская правда"	Лесные прогулки	29.04.2016	http://moyaokruga.ru/angarskayapravda/Articles.aspx?articleId=65235	Хобби-школа
Богучанский район	Газета "Ангарская правда"	Как стать художником	24.06.2016	http://moyaokruga.ru/angarskayapravda/Articles.aspx?articleId=70753	Хобби-школа
Богучанский район	Газета "Ангарская правда"	Волшебные картинки макса	06.05.2016	http://angarka.info/Articles.aspx?articleId=65744	Хобби-школа
Железногорск	Городской сайт Железногорска	В Железногорске реализуется социальный проект «Шаг навстречу»	22.04.2016	http://www.gig26.ru/news/obschestvo/?nid=8876	Шаг навстречу
Железногорск	Городской сайт Железногорска	В Железногорске набирает популярность скандинавская ходьба	29.04.2016	http://www.gig26.ru/news/sport/?nid=8920	Шаг навстречу
Красноярск	Независимое информационное агентство	В Железногорске реализуется социальный проект «Шаг навстречу»	22.04.2016	http://www.24rus.ru/more.php?UID=132591	Шаг навстречу
Красноярск	ИА "Без формата"	В Железногорске реализуется социальный проект «Шаг навстречу»	22.04.2016	http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/zheleznogorske-realizuetsya-sotcialnij/46163590/	Шаг навстречу
Назаровский район	ИА "Без формата"	Назаровские волонтеры «Школы медицинского добровольчества» проведут акцию под названием	27.10.2016	http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/nazarovskie-volontershkoli-meditsinskogo/51733100/	Школа медицинского добровольчества

		«Просто так...»			
Назаровский район	ИА "Без формата"	В Назаровской районной больнице стартовал второй учебный год «Школы медицинского добровольчества»	15.09.2016	http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/nazarovskoj-rajonnoj-bolnitce-startoval/50479150/	Школа медицинского добровольчества
Назаровский район	ИА "Без формата"	«Школа медицинского добровольчества» начала учебный год	15.09.2016	http://nazarovo.bezformata.ru/listnews/meditsinskogo-dobrovolchestva/50479192/	Школа медицинского добровольчества
Назаровский район	ИА "Назарово онлайн"	«Школа медицинского добровольчества» начала учебный год	15.09.2016	http://www.nazarovo-online.ru/news/society/21852-shkola-medicinskogo-dobrovolchestva-nachala-uchebnyy-god.html	Школа медицинского добровольчества
Назаровский район	ИА "Без формата"	В Назарово школьники работают волонтерами в больнице	15.09.2016	http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/shkolniki-rabotayut-volonterami-v-bolnitce/50467090/	Школа медицинского добровольчества
Ачинский район	ИА Запад24	В Назарово школьники работают волонтерами в больнице	15.09.2016	http://zapad24.ru/news/nazarovo/43747-v-nazarovo-shkolniki-rabotayut-volonterami-v-bolnice.html	Школа медицинского добровольчества
Новоселовский район	ИА "Без формата"	Перемен бояться не стоит	10.11.2016	http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/peremen-boyatsya-ne-stoit/52137466/	Школа медицинского добровольчества
Новоселовский район	Газета "Грани"	Перемен бояться не стоит	10.11.2016	http://graninow.ru/news/2016-11-10/4827/	Школа медицинского добровольчества
Красноярск	Интернет-портал Krskplus.ru	Перемен бояться не стоит	10.11.2016	http://krskplus.ru/news/1235400	Школа медицинского добровольчества

Красноярск	ИА "Без формата"	Виктор Толоконский поддержит значимые проекты Молодежного правительства	03.11.2016	http://krasnoyarsk.bezformata.ru/listnews/proekti-molodezhnogo-pravitelstva/51944313/	Школа медицинского добровольчества
Красноярск	8 канал	Эстафета милосердия в военном госпитале ветеранов и инвалидов войн	30.06.2016	https://www.youtube.com/watch?v=jSV7ZkK30Ro	Эстафета милосердия
Красноярский край	ТВ Енисей	Красноярскому госпиталю для ветеранов войн исполняется 70 лет	01.07.2016	https://www.enisey.tv/news/post-2051/	Эстафета милосердия
Красноярск	Газета "Городские новости"	Эстафета милосердия	14.07.2016	http://www.gornovosti.ru/tema/starshee-pokolenie/estafeta-miloserdia84867.htm	Эстафета милосердия
Красноярский край	КГТРК Красноярск	Краевой госпиталь ветеранов отмечает свое 70-летие открытием "Эстафета милосердия"	01.07.2016	http://www.vesti-krasnoyarsk.ru/video/obshestvo/kraevoi_gospital_veteranov_otm_echaet_70-letie_otkritiem_estafeti_miloserdia/	Эстафета милосердия
Шарыповский район	Газета "Твой шанс"	Уроки игры и открытий	02.02.2016	-	Ювента - маленькая планета радости
Красноярск	ИА Мангазея	Праздник дружбы	19.05.2016	https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/1923864-prazdnik-druzhby.html	Ювента - маленькая планета радости
Назаровский район	Назарово онлайн	Назаровцам предлагают помощь в оформлении гранта	22.06.2016	http://www.nazarovo-online.ru/news/society/21103-nazarovcam-predlagayut-pomosch-v-oformlenii-granta.html	
Назаровский район	ИА "Без формата"	Назаровцам предлагают помощь в оформлении гранта	22.06.2016	http://nazarovo.bezformata.ru/listnews/nazarovtcam-predlagayut-pomosh-v-oformlenii/47932808/	

Приложение 4

Шорт-лист успешно реализованных проектов, рекомендуемых к тиражированию

1. В объективе (Местный благотворительный фонд социальной поддержки "Во благо")
2. Васюткина мастерская (Местная молодежная общественная организация поддержки социальных инициатив Краснотуранского района "Перспектива")
3. Дежурный дедушка (Красноярская региональная детско-молодежная общественная организация «Ассоциация любительского видео»)
4. Дети одного солнца (Местная молодежная общественная организация свободного творчества Манского района "Манский меридиан")
5. Добровольческий отряд "Мы против сквернословия" (НП "Агентство поддержки медицинских учреждений")
6. Здравствуй, Норильчонок! (Местная общественная организация "Центр милосердия города Норильска")
7. Инклюзивная молекула (Некоммерческая организация детский благотворительный фонд "Живое дыхание")
8. Мобильная библиотека под зонтиком «Чудо»: читаем, удивляемся, делаем открытия (Местная молодежная общественная организация поддержки социальных инициатив Краснотуранского района "Перспектива")
9. Моё отечество: Информационный центр по туризму (Территориальная профсоюзная организация г. Железногорска)
10. Мозаика традиций: социокультурный образовательный центр (Местная молодежная общественная организация поддержки социальных инициатив Краснотуранского района "Перспектива")
11. Молодой мастер – скорая трудовая помощь (Некоммерческое партнерство «Красноярский исследовательский центр»)
12. Памп-трек (Красноярская общественная организация поддержки молодежных инициатив «Сила притяжения»)
13. Краевой интеграционный детско-юношеский фестиваль искусств «Подсолнухи» (Красноярская местная общественная организация туристический клуб для инвалидов «Край света»)
14. Праздник кружева СЕТУ-СЕТО PITS (МЭНКА)
15. Расскажи, игрушка, и быль, и небыль (Красноярская региональная общественная организация "Развитие культурного наследия")
16. Секция автоспорта в Ачинском детском доме (Местная общественная организация г.Красноярска Детский спортивно-технический клуб "Енисей-2")
17. Сибирские легенды (Красноярская региональная общественная организация "Ассоциация развития гражданского общества")
18. Социальная реабилитация лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (Красноярский региональный орган общественной самодеятельности «Общественный комитет по защите прав человека»)

19. Спортивное мужское братство (Фонд развития Богучанского района «За нами будущее»)
20. Умная гридинская игрушка (Общественная организация "Наше Наследие")
21. Фестиваль популярной науки Нулевое сентября 2016 (Красноярская региональная молодёжная общественная организация «Мир познавательной науки»)
22. Фишинг юниор (местная молодежная общественная организация свободного творчества Манского района "Манский меридиан")
23. Школа медицинского добровольчества Ассоциация "Общий Деловой Интерес (Независимая Ассоциация Дополнительного Образования)"
24. Эстафета милосердия (Красноярская городская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов)
25. Ювента – маленькая планета радости (Местная общественная организация инвалидов "За равные права")
